中国民航大学宁河校区 3 月 8 日工程日报

一、施工概要

1	图书馆	**本日施工内容:**机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；卫生间放线；云顶骨架安装焊接；地下室安防中心防火窗；电梯安装；
		总体完成情况:机电管线安装 94%；幕墙安装完成 89%；防火门安装完成 97%；电梯安装完成 89%;外架拆除完成 75%；幻彩铝板安装 65%；凸窗玻璃安装完成 90%;卫生间放线完成 60%；云顶骨架安装焊接 75%；
2	机场学院教学实验楼	**本日施工内容:**机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；正式电梯包口；卫生间放线；包管道及消火栓
		总体完成情况：机电管线安装 91%；幕墙窗安装完成 100%；幕墙铝板安装完成 100%；内墙一遍腻子完成 100%；玻璃安装完成 95%；开启扇安装 80%；
3	公共教学楼	**本日施工内容：**机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；正式电梯包口；卫生间放线；包管道及消火栓
		总体完成情况：机电管线安装完成 94%；幕墙窗安装完成 100%；外墙保温完成 90%；外墙铝板安装 90%；玻璃安装完成 95%；开启扇安装 80%；正式电梯包口完成 50%;卫生间放线完成 100%;
4	飞行乘务大楼及模拟舱楼	**本日施工内容：**机电安装给排水管道；空调水管道；开启扇安装；中庭墙面样板；二次结构收尾；机电管线保温；窗帘盒安装；围边吊顶施工；腻子施工；首层贴砖
		总体完成情况：机电管线安装完成 94%；开启扇安装 95%；中庭墙面样板完成 65%；围边吊顶安装完成 35%；二次结构收尾完成 30%;首层贴砖完成 80%;
5	体育馆	**本日施工内容：**抹灰甩毛，墙体砌筑；卫生间墙面开槽及水管安装，风机盘管，消防及通风安装、管道保温；屋面主次檩焊接，底板、保温层安装、排水沟闭水；幕墙埋板安装，幕墙、PC 板、张拉网龙骨安装
		整体完成情况：粗装修完成 80%；钢结构完成 99%；机电安装完成 73%;金属屋面 28%，幕墙 18%。
6	师生活动中心	**本日施工内容：**三层、四层卫生间改点位，风机盘管安装，户内线管开槽配管，精装单位户内窗帘盒施工，吊顶丝杆施工
		整体完成情况：主体结构完成 100%；二次结构完成 100%；主楼粗装修完成 100%，精装修完成 5%；机电安装完成 85%。
7	学生食堂	**本日施工内容：**二层龙骨焊接，幕墙龙骨安装，首层后厨区防水施工，采光天窗安装施工
		整体完成情况：学生食堂二次结构完成 100%，粗装修完成 95%，屋面防水完成 100%，外保温完成 25%，机电安装完成 85%。

8	南大门	**本日施工内容：**满堂架搭设，操作架搭设，挂设密目网	
		整体完成情况：基础梁浇筑完成，肥槽回填完成，满堂架垫层浇筑完成。	
9	1#学生宿舍	**本日施工内容：**电线穿设，物料提升机位置二次砌筑，室内墙体顶棚腻子施工，洞口封堵收边，防火门收口，机房层外墙保温粘贴施工，配电间电缆沟防水施做	
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 30%，屋面工程完成 100%；外墙保温完成 80%；机电安装完成 82%；窗户工程完成 85%。	
10	2#学生宿舍	**本日施工内容：**有水房间 2-6 层防水施工，机电调试，外保温施工，管道打压调试，室内二遍腻子施工，外墙腻子施工。	
		整体完成情况：粗装修完成 100%；精装修完成 55%，外墙保温完成 90%；机电安装完成 80%；窗户工程完成 85%。	
11	3#学生宿舍	**本日施工内容：**电线穿设，消防管施工，排烟执行机构开槽及固定安装，地砖铺贴，收口收边，瓷砖上楼，一遍腻子收尾，施工电梯位置首层至四层窗台压顶及构造柱支模	
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 20%；屋面工程完成 100%；机电安装完成 80%；外保温工程完成 30%；窗户工程完成 75%。	
12	4#学生宿舍	**本日施工内容：**电箱安装，电线穿设，淋浴墙体开槽，材料上楼，腻子施工，施工电梯位置二次结构砌筑，外保温施工	
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 30%；电梯工程完成 100%；机电安装完成 78%；外保温工程完成 25%；窗户工程完成 70%。	
13	5#学生宿舍	**本日施工内容：**电箱安装，电线穿设，淋浴墙体封堵，材料上楼，腻子施工，施工电梯位置二次结构砌筑，外保温施工	
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 30%；机电安装完成 78%；窗户工程完成 85%；外保温工程完成 25%。	
14	35Kv 变电站	未施工	
15	垃圾站	未施工	
15	弱电专项施工（江森自控）	一、二标段	**本日施工内容：**现场线缆敷设及敷管作业
			总体完成情况： 1、 公共教学楼末端软管安装完成 100% 2、 公共教学楼时钟布管穿线 95% 3、 飞乘楼末端软管安装完成 100% 4、 飞乘楼敷设楼控通讯线缆 90% 5、 飞乘楼敷设智能照明通讯线 90% 6、 飞乘楼敷设时钟管线线 90% 7、 飞乘楼末端点位穿线 90% 8、 飞乘楼敷设 ONU 电源完成 90%

			9、飞乘楼敷设光缆完成 90% 10、 飞乘楼理线 90% 11、 模拟仓监控线管敷设 100% 12、 图书馆二层 T0 线缆敷设完成 90% 13、 图书馆二层门禁线缆敷设完成 90% 14、 图书馆二层线管敷设完成 50% 15、 图书馆三层开槽弹线完成 100% 16、 图书馆三层墙面敷管完成 95% 17、 图书馆三层水平敷管完成 70% 18、 图书馆一层灯控穿线完成 20% 19、 图书馆一层做管完成 20% 20、 图书馆数据机房门禁线管线缆敷设完成 100% 21、 教学楼、飞乘楼修复被拆管线 22、 实验楼楼控通讯线完成 85% 23、 1#宿舍楼水表线管线缆追位 80% 24、 1#宿舍楼电表线管线缆追位 80% 25、 1#宿舍楼竖井线缆整理 80% 26、 1#宿舍楼水控接线完成 70% 27、 2#宿舍楼水控接线完成 80% 28、 3#宿舍楼主电源线光纤敷设完成 95%,，弱电间线槽未联通，不能到位 29、 3#宿舍舍楼敷设水控线缆完成 90%，末端点位方案未确定。 30、 3#宿舍楼水表线管线缆追位 90% 31、 3#宿舍楼水控接线完成 80% 32、 3#宿舍楼敷设门禁线缆完成 90% 33、 4#宿舍楼主电源线光纤敷设完成 100% 34、 4#宿舍楼竖井线缆整理 100% 35、 4#宿舍楼水表线管线缆追位 90% 36、 4#宿舍楼水控接线 100% 37、 5#宿舍楼主电源线光纤敷设完成 95% ，弱电间线槽未联通，不能到位。 38、 5#宿舍楼竖井线缆整理 100% 39、 5#宿舍楼敷设水控线缆 80% 40、 体育馆一层修复线管 100% 41、 体育馆一层时钟线缆敷设完成 90% 42、 体育馆一层电力监控线缆敷设完成 80% 43、 体育馆一层水表线缆敷设完成 80% 44、 食堂一层配管 90% 45、 食堂一层穿线 90% 46、 活动中心墙面开槽配管 70% 47、 活动中心能耗敷设线管 30%

16	能源专项施工（恒益建安）	能源站	**本日施工内容：**能源站管道、阀门安装；烟囱安装
			整体完成情况：能源站管道、阀门安装 70%；烟囱安装 100%
		中深层地源热井	**本日施工内容：施工完成**
			整体完成情况：
		浅层地源热井	**本日施工内容：**第八系统第二条沟，回程开始连接，第十三系统第一条沟试水平连接完成，试压完成，开始回填，第十四系统第一条沟挖完，开始水平连接，第十五系统第一条沟开挖
			第八系统第二条沟，回程开始连接，第十三系统第一条沟试水平连接完成，试压完成，开始回填 80%，第十四系统第一条沟挖完，开始水平连接，第十五系统第一条沟开挖 50%
17	中铁五局	项目部	**本日施工内容:**施工场地内
			整体完成情况： 场地内材料及裸土苫盖，场地清扫 雨水管道完成总量 92％，污水管道完成总量 97％
18	人员情况	监理总人数 20 人； 八局总人数 604 人，管理人员 92 人，工人 512 人； 三局总人数 865 人，管理人员 94 人，工人 771 人； 中铁五局总人数 27 人，管理人员 14 人，工人 13 人； 江森自控总人数 40 人，管理人员 6 人，工人 34 人； 恒益建安总人数 41 人，管理人员 4 人，工人 37 人；	

二、监理日报

一标段：

1、现场巡视检查图书馆机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；卫生间放线；云顶骨架安装焊接；地下室安防中心防火窗；电梯安装等施工内容，现场施工正常。

2、现场巡视检查机场学院教学实验楼机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；正式电梯包口；卫生间放线；包管道及消火栓等施工内容，现场施工正常。

3、现场巡视检查教学楼机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；正式电梯包口；卫生间放线；包管道及消火栓等施工内容，现场施工正常。

4、现场巡视检查飞行乘务大楼机电安装给排水管道；空调水管道；开启扇安装；中庭墙面样板；机电管线保温；窗帘盒安装；围边吊顶施工；腻子施工；首层贴砖等施工内容，现场施工正常。

二标段：

1. 对体育馆金属屋面施工、主檩条安装、进行巡检。对幕墙架体进行检查。对三层抹灰施工进行巡检。

2. 对师生活动中心裙房屋面龙骨安装进行巡检。对室内开槽进行检查。对外墙保温进行巡检。

3. 对南大门满堂架体搭设进行巡检。

4. 对 5 号宿舍楼外墙保温进行巡检。3 号宿舍楼地砖铺设施工进行巡检。

5. 对能源站管道焊接安装进行巡检。

室外、能源及弱电：

1.能源：能源站管道、阀门安装；烟囱安装；第八系统第二条沟，回程开始连接，第十三系统第一条沟试水平连接完成，试压完成，开始回填 80%，第十四系统第一条沟挖完，开始水平连接，第十五系统第一条沟开挖 50%。

2. 弱电： 现场线缆敷设及敷管作业。

3.室外：场地内材料及裸土苫盖，场地清扫。

标段划分	单体名称	监理人员	监理工作时间、内容及路线	备注
一标段 刘刚 （15162265570）	图书馆	刘刚 （18082566239）	对图书馆施工进行巡视检查	
		张春博 （13027722180）	对图书馆施工进行巡视检查	
		刘浩 （13400385767）	对图书馆施工进行巡视检查	
	教学组团	任海博 （18082566239）	对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查	
		马瑞峰 （15614235758）	对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查。	
	所有单体安装工程	滕洪亮 （13234049175） 张春博 （13027722180）	对现场施工巡视检查	
二标段 林利民 （18640512507）	体育馆	丁建泽 （18845226778） 杨宸 （13364468744） 党泽南 （13630253982）	对现场施工进行巡视检查，钢构件焊接巡检	
	师生活动中心		对现场施工巡视检查	

	4#、5#学生宿舍	吕非凡（17532527058） 马一博（17692498058）	对现场施工巡视检查	
	1#、2#、3#学生宿舍、食堂	乔天航(18547607857) 丁建泽（18845226778） 宋明（15345517113）	对现场施工巡视检查	
	35kv 变电站		对现场施工巡视检查	
	所有单体安装工程	滕洪亮（13234049175） 乔天航(18547607857)	对现场施工巡视检查	
室外	一标段	刘刚（18082566239） 任海博（18082566239） 刘浩（13400385767）	对现场施工巡视检查	

	二标段	滕洪亮 （13234049175） 乔天航 (18547607857) 李会彬 （15512769592） 吕非凡 （17532527058）	对现场施工巡视检查	
弱电	一标段	刘刚 （18082566239）	对现场施工巡视检查	
	二标段	滕洪亮 （13234049175）	对现场施工巡视检查	
能源	二标段	滕洪亮 （13234049175） 乔天航 (18547607857)	对现场施工巡视检查	

四、施工单位日报

一标段施工日报

	中国建筑　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告									表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
项目名称	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：293	2022 年 3 月 8 日					✓				
作业计划编号		天气	非常晴朗☑ 晴朗☐　多云☐　雨☐　雪☐ 霾☐							
施工部位	图书馆 机场学院教学实验楼 公共教学楼 飞行乘务大楼及模拟舱楼	温度	⩽0 度☐　0 度～10 度☑　10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐　⩾30 度☐							
		风力	静风☐　中等☑　大风☐　台风☐							
		湿度	干燥☑　中等☐　湿润 ☐							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建八局	40	40	现场管理、方案编制
天津唐海	0	16	机电安装
北京慧欣	3	48	机电安装
恒福消防	2	18	组团消防
福建聚利	4	110	幕墙安装
鼎天幕墙	2	17	幕墙安装
天宇信达（二构）	2	82	二次结构
天津俊凯	1	41	机电通风
宏坤煜业	1	40	机电通风
堡泰消防	4	36	机电消防
天河伟业	8	75	精装
八局装饰	12	44	精装
虹吸雨水	0	0	机电安装
江森自控	0	0	机电安装
三菱电梯	1	10	电梯安装
天津科顺	1	8	防水
华夏门业	1	4	防火门
昌盛伟业	7	5	图书馆水电保温

	中国建筑　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告		表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
贵州中科	1	15	保温
军盛鑫	1	7	组团水电保温
嘉瑞市政	1	0	人防通风
合计	92	604	
本日新增	7人，体温正常		

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
货用施工升降机	SC200/200	良好	1
叉车	/	良好	1
洒水车	/	良好	1
雾炮车	/	良好	3
挖机	60型	良好	1
吊车	25吨	良好	0
曲臂高空车	/	良好	6
升降车	/	良好	18
蜘蛛车	/	良好	1

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
地砖	600*1200mm	1200 ㎡	✓	✓	

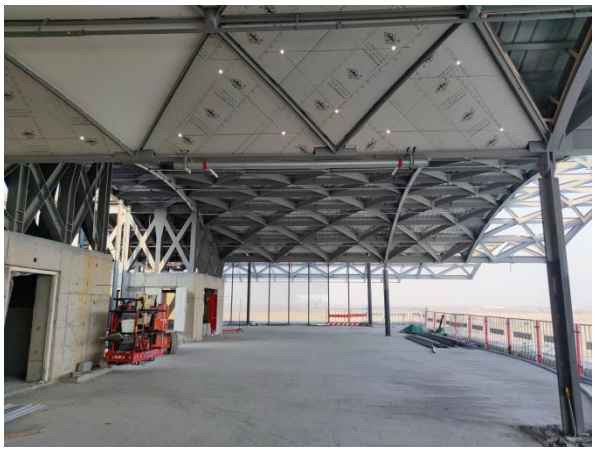
四、来访人员情况

时间	姓名	单位	工作目的	备注

	中国建筑　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告	表格编号	CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
五、进度完成情况	图书馆	本日施工内容:机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；卫生间放线；云顶骨架安装焊接；地下室安防中心防火窗；电梯安装；	
		总体完成情况:机电管线安装 94%;幕墙安装完成 89%;防火门安装完成 97%;电梯安装完成 89%;外架拆除完成 75%；幻彩铝板安装 65%；凸窗玻璃安装完成 90%;卫生间放线完成 60%；云顶骨架安装焊接 75%;	
	机场学院教学实验楼	本日施工内容:机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；正式电梯包口；卫生间放线；包管道及消火栓	
		总体完成情况：机电管线安装 91%;幕墙窗安装完成 100%;幕墙铝板安装完成 100%；内墙一遍腻子完成 100%；玻璃安装完成 95%；开启扇安装 80%;	
	公共教学楼	本日施工内容：机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；正式电梯包口；卫生间放线；包管道及消火栓	
		总体完成情况：机电管线安装完成 94%;幕墙窗安装完成 100%;外墙保温完成 90%；外墙铝板安装 90%；玻璃安装完成 95%；开启扇安装 80%；正式电梯包口完成 50%;卫生间放线完成 100%;	
	飞行乘务大楼及模拟舱楼	本日施工内容：机电安装给排水管道；空调水管道；开启扇安装；中庭墙面样板；二次结构收尾；机电管线保温；窗帘盒安装；围边吊顶施工；腻子施工；首层贴砖	
		总体完成情况：机电管线安装完成 94%；开启扇安装 95%；中庭墙面样板完成 65%;围边吊顶安装完成 35%；二次结构收尾完成 30%;首层贴砖完成 80%;	
六、业主监理指令			
七、安全管理情况	日常三间巡逻检查，裸土苫盖维护，现场排水，安全隐患排查以及整改		
八、技术质量管理	对精装修技术问题协调、幕墙及门窗施工进行全过程质量监管，日常机械监测，危险源辨识等。		
九、过程关键文件			
十、本日重大事项			
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜（3.8）:** 1、图书馆会堂施工图纸及时下发; 2、资金缺口极大直接关系人员复工返岗，机电、幕墙、装修单位因缺口较大人员进场及材料进场均受影响 ； 3、弱电二次开槽封堵认质认价已上报，需要校方等领导尽快确认。由于此项影响后续施工且非我方原因造成，同时后期维修隐患及责任划分需要尽快明确（目前封堵无法做到后期不出现隐患）；现场实际工程量需监理和弱电单位配合现场实测确认。 4、精装铝板深化尽快审核;		

	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告	表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
	5、泛光照明请尽快确认控制价，以便启动招标流程； 6、新风机组前后阀门调整为电动调节阀未定； 7、风机盘管面板调整为联网型稳控面板，增加 485 接线、网线接口，且增加 6*1.5 通讯线需要明确； 8、图书馆精装修位置机电管线调整（三块大变动调整区域）需要上会确认，洽商图纸设计，监理已签字； 9、图书馆四层光面超薄型防火涂料需要重新认质认价。 10、组团玻璃幕墙埋件及部分拆改签证需要尽快确认，烦请尽快回复。 11、灯具招标文件已转指挥部，请各方领导审核确定。 12、认质认价已上报幕墙南北门斗立柱变更、清水混凝土装饰面层、弱电开槽三份，需尽快推进确认。 13、飞行乘务大楼品酒、茶艺、化妆三间教室效果图请抓紧确认。 14、电动开启线路图纸尽快下发 15、图书馆二层展示空间一、二层研讨室及三层研讨室精装施工图纸及时下发	
抄送	1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□； 5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□	

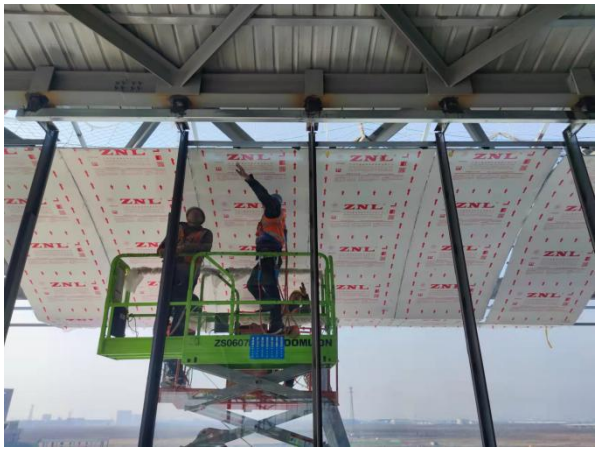
现场作业影像



图书馆云顶样板施工



图书馆外架拆除

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>图书馆凸窗玻璃施工</td><td>乘务楼中厅样板施工</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>图书馆幻彩铝板施工</td><td>模拟仓抹灰施工</td></tr>
<tr><td colspan="2">现场航拍图 2.28</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆</td><td>实验楼</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>公共教学楼</td><td>飞行乘务大楼及模拟仓</td></tr>
</table>

二标段

	中国建筑　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告表		表格编号							
			ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101							
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程二标段									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：002	2022 年 3 月 8 日					✓				
作业计划编号		天气	晴朗☑ 多云☐ 雨☐ 阴☐ 雪☐ 冰冻☐ 雾霾☐							
施工部位	1#-5#宿舍楼；食堂；体育馆；师生活动中心；南大门	温度	⩽0 度 ☐ 0 度～10 度☑ 10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐ ⩾30 度 ☐							
		风力	静风☑ 中等☐ 大风☐ 台风☐							
		湿度	干燥☑ 中等☐ 湿润☐							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	30/14	30/14	方案编制、现场施工管理
三局智能	2/0	2/0	BIM 建模
三局二安	10/4	283/24	宿舍楼穿线、配电箱安装，食堂首层通风管道、风阀、桥架安装,体育馆二次配管，风管、水管、桥架施工
三局一公司钢构	1/0	1/0	体育馆钢结构马道施工
长沙广大	4/0	30/0	图纸深化
兴华鑫宇	3/0	57/6	粗装修收尾、精装修施工
天津津宝福	1/0	47/3	粗装修收尾、精装修施工
北京迈易格	2/0	17/0	主框、玻璃安装、幕墙施工
东方雨虹（保温）	2/0	69/0	外保温施工
广日电梯	1/0	5/0	室内电梯调试、验收
山东川众	3/0	48/0	体育馆屋面施工
建工幕墙	5/0	66/0	幕墙、门窗施工
匠人清水	3/0	14/3	南大门施工
山东启航	1/0	7/0	师生活动中心弧形梁施工
承德一赢	1/0	9/0	栏杆复尺、加工
梁平荣安	1/0	3/0	主体结构收尾
东方雨虹（防水）	1/0	14/0	防水施工
天津汉物业	2/0	10/0	现场物业管理
精诚伟业	3/0	7/2	现场安保管理

	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101

施工人员合计	76/18	719/52	/
健康监测情况	体温正常	体温正常	在场人员总计 719 人，防疫资料齐全

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
物料提升机	SC100/100	良好	3
电梯	室内电梯	良好	6
汽车吊	25t	良好	0
挖掘机	200	良好	0
吊篮	/	良好	97

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
/	/	/	合格	合格	/

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/	/	/	/	/

五、施工完成情况	体育馆	**本日施工内容**：抹灰甩毛，墙体砌筑；卫生间墙面开槽及水管安装，风机盘管，消防及通风安装、管道保温；屋面主次檩焊接，底板、保温层安装、排水沟闭水；幕墙埋板安装，幕墙、PC 板、张拉网龙骨安装
		整体完成情况：粗装修完成 80%；钢结构完成 99%；机电安装完成 73%；金属屋面 28%，幕墙 18%。
	师生活动中心	**本日施工内容**：三层、四层卫生间改点位，风机盘管安装，户内线管开槽配管，精装单位户内窗帘盒施工，吊顶丝杆施工
		整体完成情况：主体结构完成 100%；二次结构完成 100%；主楼粗装修完成 100%，精装修完成 5%；机电安装完成 85％。
	学生食堂	**本日施工内容**：二层龙骨焊接，幕墙龙骨安装，首层后厨区防水施工，采光天窗安装施工
		整体完成情况：学生食堂二次结构完成 100%，粗装修完成 95%，屋面防水完成 100%，外保温完成 25%，机电安装完成 85%。
	南大门	**本日施工内容：**满堂架搭设，操作架搭设，挂设密目网
		整体完成情况：基础梁浇筑完成，肥槽回填完成，满堂架垫层浇筑完成。

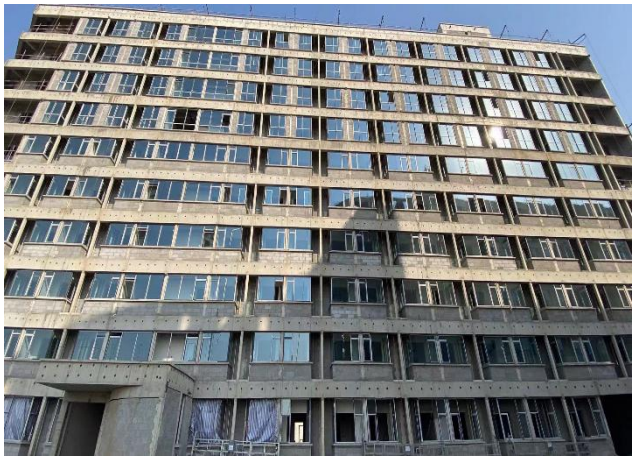
	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101
	1#学生宿舍	**本日施工内容**：电线穿设，物料提升机位置二次砌筑，室内墙体顶棚腻子施工，洞口封堵收边，防火门收口，机房层外墙保温粘贴施工，配电间电缆沟防水施做
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 30%，屋面工程完成 100%；外墙保温完成 80%；机电安装完成 82％；窗户工程完成 85%。
	2#学生宿舍	**本日施工内容**：有水房间 2-6 层防水施工，机电调试，外保温施工，管道打压调试，室内二遍腻子施工，外墙腻子施工。
		整体完成情况：粗装修完成 100%；精装修完成 55%，外墙保温完成 90%；机电安装完成 80％；窗户工程完成 85%。
	3#学生宿舍	**本日施工内容**：电线穿设，消防管施工，排烟执行机构开槽及固定安装，地砖铺贴，收口收边，瓷砖上楼，一遍腻子收尾，施工电梯位置首层至四层窗台压顶及构造柱支模
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 20%；屋面工程完成 100%；机电安装完成 80％；外保温工程完成 30%；窗户工程完成 75%。
	4#学生宿舍	**本日施工内容**：电箱安装，电线穿设，淋浴墙体开槽，材料上楼，腻子施工，施工电梯位置二次结构砌筑，外保温施工
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 30%；电梯工程完成 100%；机电安装完成 78％；外保温工程完成 25%；窗户工程完成 70%。
	5#学生宿舍	**本日施工内容**：电箱安装，电线穿设，淋浴墙体封堵，材料上楼，腻子施工，施工电梯位置二次结构砌筑，外保温施工
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 30%；机电安装完成 78％；窗户工程完成 85%；外保温工程完成 25%。
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、对生活区进行检查；2、对现场临时用电进行检查；3、对整个施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改；4、现场疫情防控监察。	
八、技术质量管理情况	1、对体育馆、食堂、师生活动中心及宿舍楼施工情况进行检查；2、BIM 建模幕墙、钢构、机电安装等。	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	下午项目集体在工人生活区进行核酸检测； 因宁河区政府项目检查，外立面及临边作业停止施工。	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：** **体育馆单体：** 1、中空阳光板幕墙单侧还是双侧请尽快明确。 2、体育馆航天云膜结构由 PTFE 改为 ETFE 是否进行变更请尽快明确。	

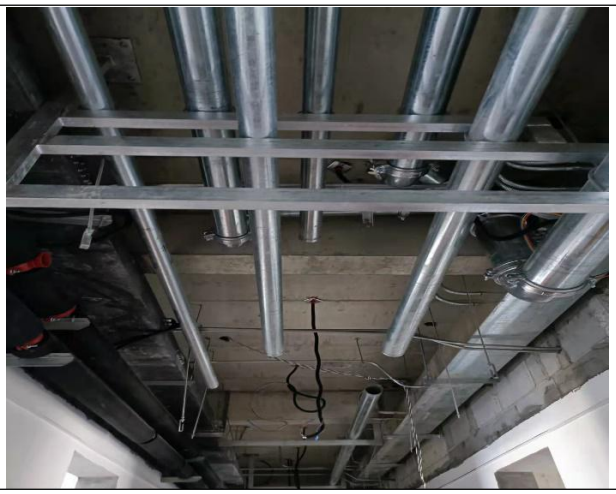
<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">中国建筑　项目管理表格</td></tr>
<tr><td>作业面\项目每日情况报告表</td><td>表格编号
ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">3、游泳馆折叠门变更为推拉门电子版变更已收到，并完成费用估算上报，请明确是否进行调整。
4、防火隔声门清单漏项，费用估算已上报，请尽快协调明确。
5、体育馆地下室受风管截面尺寸影响，影响净空不足 1.8m，移动覆盖机房门无法开启，需协调解决。
师生活动中心:
1、师生活动中心主楼户内点位、裙房点位电子版变更、建筑 90-001、90-002、90-003 电子版变更已收到，且完成费用估算上报，请协调下发纸版图纸。
学生食堂及学生宿舍:
1、宿舍楼盥洗室洗漱台样式、数量变更请尽快下发，增加梳妆镜变更请尽快下发。
2、裙房商业走廊变更请尽快下发。
3、食堂三层精装修全专业图纸请尽快下发。
4、宿舍楼及食堂电梯门增加花纹不锈钢外门套、宿舍楼盥洗室垭口增加不锈钢门套，宿舍及食堂所有窗台均需设置窗台板，食堂打饭窗口上部墙体改为轻钢龙骨隔墙+耐水石膏板，食堂及能源站屋面面层变更花岗岩，食堂就餐区包柱做法变更，宿舍楼及食堂分集水器包封，变更尽快下发。
其他:
1、南校门主体结构请协调尽快下发纸版变更图纸。
2、为过程结算提前准备，已完工程图纸变更、洽商、会审请尽快下发。
3、35KV 变电站施工单位已进场，请尽快提供土建深化图纸及预留洞口图。
4、我司已开始师生活动中心点位变更自行部分大面积拆改，请协调弱电单位尽快进行师生活动中心其变更点位拆改。
学生食堂及体育馆大屏位置最终版变更请尽快下发。</td></tr>
<tr><td>抄送</td><td colspan="2">1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□</td></tr>
</table>

制，项目生产经理亲自填报整个项目部每日情况报告。报告包括的时间为当天上班时间到次日上班时间,提交报告的时间不迟于次日上午的 12 点。

现场施工影像

	
体育馆 抹灰甩毛，墙体砌筑；卫生间墙面开槽及水管安装，风机盘管，消防及通风安装、管道保温；屋面主次檩焊接，底板、保温层安装、排水沟闭水；幕墙埋板安装，幕墙、PC 板、张拉网龙骨安装	师生活动中心 三层、四层卫生间改点位，风机盘管安装，户内线管开槽配管，精装单位户内窗帘盒施工，吊顶丝杆施工
	
学生食堂 二层龙骨焊接，幕墙龙骨安装，首层后厨区防水施工，采光天窗安装施工	南大门 满堂架搭设，操作架搭设，挂设密目网
	
1#学生宿舍楼	2#学生宿舍楼

电线穿设，物料提升机位置二次砌筑，室内墙体顶棚腻子施工，洞口封堵收边，防火门收口，机房层外墙保温粘贴施工，配电间电缆沟防水施做	有水房间 2-6 层防水施工，机电调试，外保温施工，管道打压调试，室内二遍腻子施工，外墙腻子施工
	
3#学生宿舍楼 电线穿设，消防管施工，排烟执行机构开槽及固定安装，地砖铺贴，收口收边，瓷砖上楼，一遍腻子收尾，施工电梯位置首层至四层窗台压顶及构造柱支模	4#学生宿舍楼 电箱安装，电线穿设，淋浴墙体开槽，外墙保温施工，室内腻子施工，施工电梯位置二次结构砌筑
	
5#学生宿舍楼 电箱安装，电线穿设，淋浴墙体开槽，外墙保温施工，室内腻子施工，施工电梯位置二次结构砌筑	体育馆

	
师生活动中心	1#学生宿舍楼
	
2#学生宿舍楼	3#学生宿舍楼
	
4#学生宿舍楼	5#学生宿舍楼

中铁五局室外工程

中国中铁	中国中铁　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001

项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程室外施工									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：187	2022 年 3 月 8 日					✓				
作业计划编号		天气	非常晴朗□ 晴朗☑ 多云□雨□ 雾□ 雪□冰冻□							
施工部位	施工场地内	温度	⩽0 度□ 0 度～10 度☑10 度～21 度□ 21 度～30 度□ ⩾30 度□							
		风力	静风☑中等□ 大风□ 台风□							
		湿度	干燥☑ 中等□ 湿润□							

一、（1）现场人员情况

单位名称	管理人员数	作业工人数	主要工作内容
中铁五局	14	13	裸土苫盖，材料苫盖，场地清扫，
中铁五局	0	0	机械操作
中铁五局	0	0	给水，中水管道安装，土方回填，管道调运
中铁五局	0	0	消防管道安装，土方回填，管道调运，管线场地清理
施工人员合计	14	13	

（2）疫情防控情况

有无新增人员	新增人员排查情况	项目人员体温是否正常	备注
无	/	正常	/

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
铲车	HY950	良好	0
挖掘机	210	良好	0
十轮翻斗车	/	良好	0
/			

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
/					

四、来访人员情况

中国中铁	中国中铁　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001

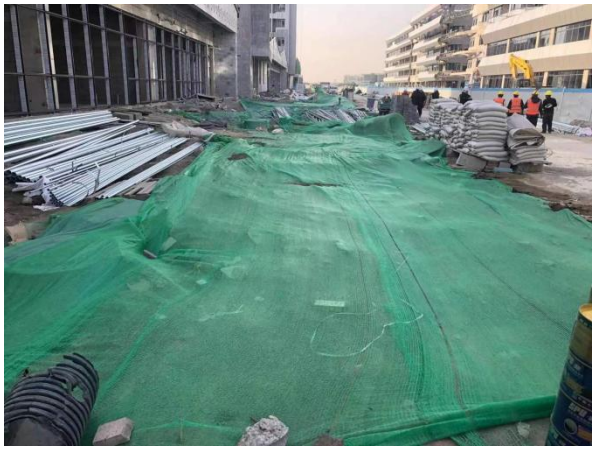
时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				

五、施工完成情况	项目部	**本日施工内容:** 施工场地内 **整体完成情况:** 场地内材料及裸土苫盖，场地清扫 雨水管道完成总量 92%，污水管道完成总量 97%
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、对现场机械进行安全检查；2、对施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改；3、施工人员班前喊话。4、全员参加核酸检测。	
八、技术质量管理情况	开槽全过程质量监管。	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	/	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜:　/**	
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☑；5、项目生产经理（项目总工）☑；6、项目工程部☑；7、项目资料室☐	

现场施工影像





<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">班前安全喊话，场地清扫，裸土苫盖，材料苫盖</td></tr>
</table>

江森自控智慧校园

Johnson Controls	**北京江森自控有限公司　项目管理表格**	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 JCI-CN23/21:1096 BJJSGCB-PM-2021003

项目名称	中国民航大学新校区智慧校园建设弱电专项施工									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：185	2022 年 3 月 8 日					✓				
作业计划编号		天气	非常晴朗☐　晴朗☑多云☐　雨☐雪☐霾☐							
施工部位	全校区	温度	⩽0 度☐　0 度～10 度☑　10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐　⩾30 度☐							
		风力	静风☐　中等☑　大风☐　台风☐							
		湿度	干燥☑　中等☐　湿润☐							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
北京江森自控有限公司	6	6	现场管理、专业设计
施工	34	34	弱电施工
新增人员		0	
合计	40	40	
健康状况（体温）	正常	正常	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
/	/	/	

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

时间	姓名	单位	工作目的	备注

Johnson Controls	北京江森自控有限公司　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 JCI-CN23/21:1096 BJJSGCB-PM-2021003

五、进度完成情况	一、二标段	本日施工内容：现场线缆敷设及敷管作业
		总体完成情况： 48、　公共教学楼末端软管安装完成 100% 49、　公共教学楼时钟布管穿线 95% 50、　飞乘楼末端软管安装完成 100% 51、　飞乘楼敷设楼控通讯线缆 90% 52、　飞乘楼敷设智能照明通讯线 90% 53、　飞乘楼敷设时钟管线线 90% 54、　飞乘楼末端点位穿线 90% 55、　飞乘楼敷设 ONU 电源完成 90% 56、　飞乘楼敷设光缆完成 90% 57、　飞乘楼理线 90% 58、　模拟仓监控线管敷设 100% 59、　图书馆二层 TO 线缆敷设完成 90% 60、　图书馆二层门禁线缆敷设完成 90% 61、　图书馆二层线管敷设完成 50% 62、　图书馆三层开槽弹线完成 100% 63、　图书馆三层墙面敷管完成 95% 64、　图书馆三层水平敷管完成 70% 65、　图书馆一层灯控穿线完成 20% 66、　图书馆一层做管完成 20% 67、　图书馆数据机房门禁线管线缆敷设完成 100% 68、　教学楼、飞乘楼修复被拆管线 69、　实验楼楼控通讯线完成 85% 70、　1#宿舍楼水表线管线缆追位 80% 71、　1#宿舍楼电表线管线缆追位 80% 72、　1#宿舍楼竖井线缆整理 80% 73、　1#宿舍楼水控接线完成 70% 74、　2#宿舍楼水控接线完成 80% 75、　3#宿舍楼主电源线光纤敷设完成 95%,，弱电间线槽未联通，不能到位 76、　3#宿舍舍楼敷设水控线缆完成 90%，末端点位方案未确定。 77、　3#宿舍楼水表线管线缆追位 90% 78、　3#宿舍楼水控接线完成 80% 79、　3#宿舍楼敷设门禁线缆完成 90% 80、　4#宿舍楼主电源线光纤敷设完成 100% 81、　4#宿舍楼竖井线缆整理 100% 82、　4#宿舍楼水表线管线缆追位 90%

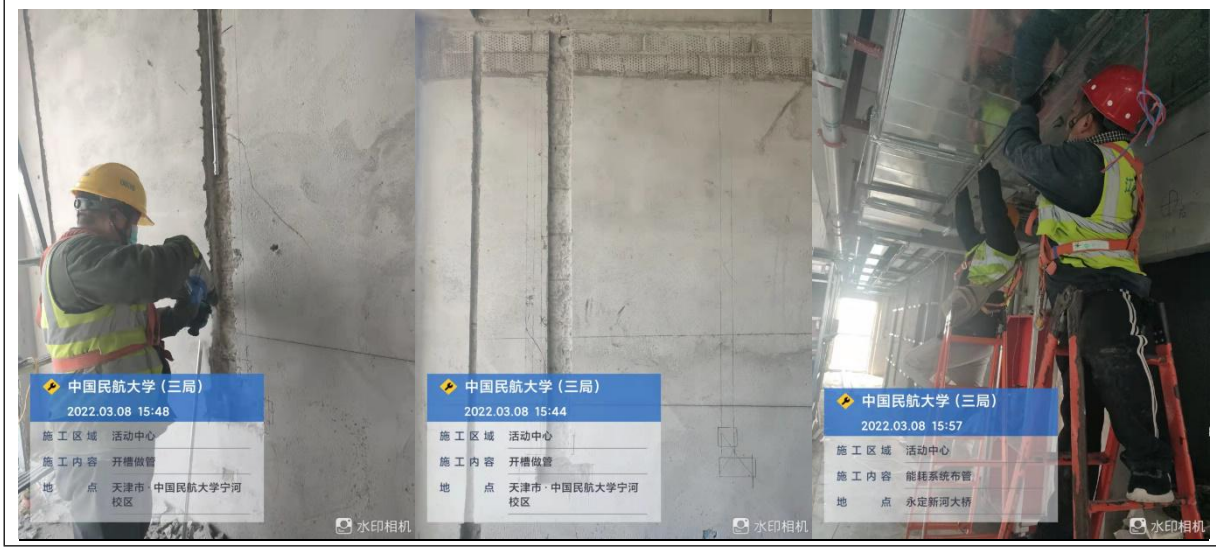
Johnson Controls	北京江森自控有限公司　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 JCI-CN23/21:1096 BJJSGCB-PM-2021003

		83、　4#宿舍楼水控接线 100% 84、　5#宿舍楼主电源线光纤敷设完成 95% ，弱电间线槽未联通，不能到位。 85、　5#宿舍楼竖井线缆整理 100% 86、　5#宿舍楼敷设水控线缆 80% 87、　体育馆一层修复线管 100% 88、　体育馆一层时钟线缆敷设完成 90% 89、　体育馆一层电力监控线缆敷设完成 80% 90、　体育馆一层水表线缆敷设完成 80% 91、　食堂一层配管 90% 92、　食堂一层穿线 90% 93、　活动中心墙面开槽配管 70% 94、　活动中心能耗敷设线管 30%
六、业主监理指令		
七、安全管理情况		
八、技术质量管理		
九、过程关键文件		
十、本日重大事项	弱电间、弱电井已吊顶弱电线槽未连接到位	
十一、明日施工计划		
十二、工作小结		
抄送	1、建设方代表□；2、工程监理□；3、项目经理□；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室£	

作业影像


天津市.中国民航大学新校
2022.03.08 10:39
施工区域 师生活动中心4层
施工内容 做管
地 点 天津市-中国民航大学新校区
水印相机
天津市.中国民航大学新校
2022.03.08 15:06
施工区域 师生活动中心5层
施工内容 做管
地 点 天津市-中国民航大学新校区
水印相机
工程记录天津民航大学
施工区域：3号宿舍楼1层
施工内容：复位
地 点：我在这里
今日水印相机 真实时间


天津民航大学
2022.03.08 07:59
施工区域 师生活动中心
施工内容 做能源管
地 点 天津市·民航大学新校区
水印相机
工程记录天津民航大学
施工区域：食堂楼3层
施工内容：加软管
拍摄时间：2022.03.08 08:58
天 气：多云 6℃
地 点：天津市·天津华翔汽车金属零部件有限公司
今日水印相机 真实时间
中国民航大学（三局）
2022.03.08 15:44
施工区域 活动中心
施工内容 开槽做管
地 点 天津市·中国民航大学宁河校区
水印相机


中国民航大学（三局）
2022.03.08 15:48
施工区域 活动中心
施工内容 开槽做管
地 点 天津市·中国民航大学宁河校区
水印相机
中国民航大学（三局）
2022.03.08 15:44
施工区域 活动中心
施工内容 开槽做管
地 点 天津市·中国民航大学宁河校区
水印相机
中国民航大学（三局）
2022.03.08 15:57
施工区域 活动中心
施工内容 能耗系统布管
地 点 永定新河大桥
水印相机


工程记录天津民航大学
施 工 区 域：食堂楼3层
施 工 内 容：门禁读卡器开门按钮
拍 摄 时 间：2022.03.08 08:32
天　　气：晴 5°C
地　　点：天津市·S2津宁高速
今日水印
-相机-
真实时间


工程记录天津民航大学
施 工 区 域：食堂楼3层
施 工 内 容：门禁读卡器开门按钮
拍 摄 时 间：2022.03.08 07:34
天　　气：晴 2°C
地　　点：天津市·中国民航大学(宁河校区)
今日水印相机
真实时间


中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段施工
施 工 区 域：图书馆三层加层
施 工 内 容：作管连桥架
拍 摄 时 间：2022.03.08 15:41
地　　点：天津市中国民航大学宁河校区
施 工 单 位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段施工
施 工 区 域：图书馆三层
施 工 内 容：作管连桥架
拍 摄 时 间：2022.03.08 14:55
地　　点：天津市·天津市中国民航大学宁河校区
施 工 单 位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段施工
施 工 区 域：图书馆三层
施 工 内 容：作管连桥架
拍 摄 时 间：2022.03.08 14:58
地　　点：天津市·天津市中国民航大学宁河校区
施 工 单 位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段施工
施 工 区 域：图书馆地下室安防消防中心
施 工 内 容：点位穿线
拍 摄 时 间：2022.03.08 15:47
地　　点：天津市中国民航大学宁河校区
施 工 单 位：江森自控







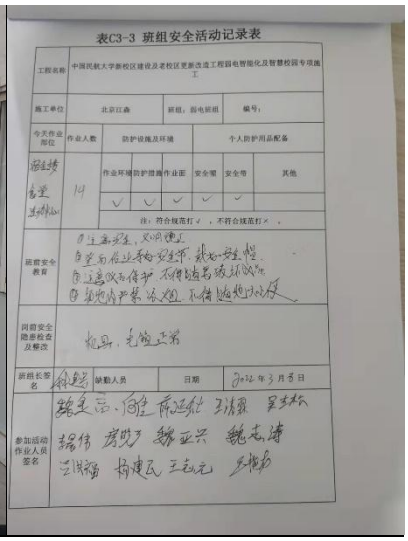




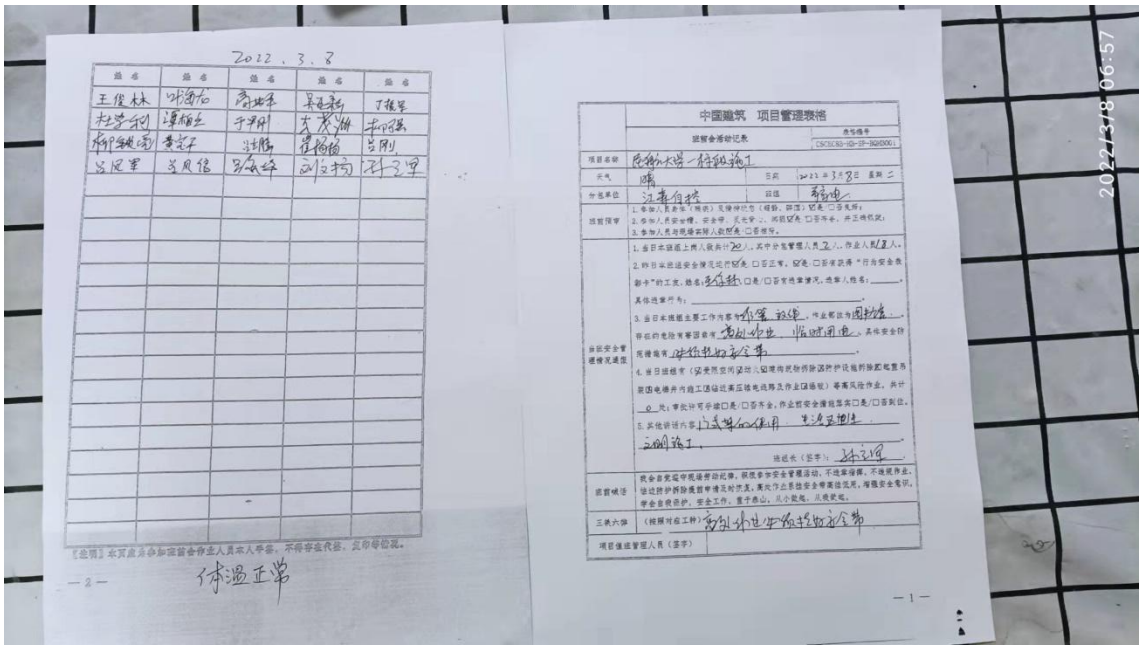


施工内容




表C3-3 班组安全活动记录表


会议室
中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：项目部
施工内容：班前教育
拍摄时间：2022.03.08 06:52
地　　点：宁河区·中国民航大学(宁河校区)
施工单位：江森自控
今日水印
－相机－
真实时间


2022.3.8
中国建筑 项目管理班组
班前会活动记录
项目名称
民航大学一标段施工
施工单位
江森自控
2022.03.08 06:57

班前教育及安全检查



中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程弱电智能化及智慧校园专项施工-八局区域体温检测表

姓名	2022/2/26		2022/2/27		2022/2/28		2022/3/1		2022/3/2		2022/3/3		2022/3/4		2022/3/5		2022/3/6		2022/3/7		2022/3/8		2022/3/9		2022/
	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午
孙立军	36.2	36.3	36.2	36.3	36.2	36.2	36.3	36.2	36.2	36.2	36.4	36.3	36.2	休	36.2	36.2	36.3	36.3	36.2	36.4	36.5				
黄宝平	36.3	36.2	35.9	36.2	35.9	36.4	36.1	36.3	休	休	36.1	36.4	35.9	休	36.3	36.3	35.8	36.1	36.1	36.3	36.3				
崔扬扬	36.2	36.3	36	36	36	36.1	36.2	36.1	38	36.1	36	36	36.1	休	36.1	36.3	36.2	36	36	36.4	36				
李茂洲	38.1	36.1	36.1	36.2	36.1	36.3	36.2	36.2	36.1	36.3	36.1	36.2	36.3	休	36.2	36.2	36.1	36.3	36.1	36.2	36.1				
柳锁亮	36.1	36.3	36.2	36.3	36.2	36.3	36.2	36.3	36.2	36.3	36.4	36.2	36.2	休	36.2	36.3	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2				
柳 强	36.3	36.4	36.2	36.3	36.3	36.2	36.2	36.4	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	休	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.4	36.3				
刘文扬	36.2	36.1	36.3	36.2	36.3	36.3	36.2	36.1	36.3	36.3	36.2	36.2	36.3	休	36.2	36.3	36.2	36.4	36.2	36.3	36.2				
王俊林	36.3	36.3	36.2	36.3	36.3	36.2	36.3	36	36.3	36.1	36.3	36.2	休	休	36.3	36.2	36.3	36.2	36.3	36.3	36.2				
陈亚拴	36.1	36.2	36.1	36.1	36	36	36.2	36.4	36.1	36.2	休	休													
李庆林	36.6	36.3	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	休													
赵俊伟	36.2	36.2	36.3	36.3	36.3	36.2	36.3	36.2	36.2	36.3	36.2	休													
王秋凤																									
吕凯伟	36.4	36.1	36.2	36.2	36.6	36.2	36.2	36.1	36.2	36.2	36.1	36.2	36.2	休	36.2	36.1	36.2	36.2	36.1	36.2	36.2				
马利锋	36.2	36.2	36.3	36.3	36.1	36.3	36.3	36.3	36.1	36.2	36.2	36.3	36.1	休	36.1	36.2	36.4	36.4	36.2	36.2	36.2				
吕永平	36.2	36.2	36.1	36.2	36.2	36.4	36.3	36.2	36.2	36.3	36.4	36.2	36.1	36.2	36.4	36.3	36		36.3	36.3	36.3				
田存仁							36.5	36.3	36.2	36.2	36.2	休	—						潘梅文		36.1				
郭世荣							36.1	36.2	36.3	36.3	休	休	—						丁振堂		36.3				
张存宝							36.2	36.3	36.1	36.2	休	休	—						杜增和		36.2				
任张青							36.2	36.3	36.2	36.1	休	休	—						牛申刚		36.2				
田存仁									36.2						许海龙	36.2	36.3	36.2	36.2	36.2					
郭世荣									36.1						吴世新	36.3	36	36.1	36.2	36.1					
张存宝									36.1						高科平	36.4	36.3	36.3	36.4	36.2					
任张青									36.3	36.2	36.2	休	—												
姬小强																									

吕世军

吕世利

36.2 休 休 36.1 36.2 36.4 36.1 36.3
36.1 休 36.1 36.2 36.1 36.2 36.2 36.3 36.2

2022/3/8 06:57

体温记录表-北京江森自控有限公司中国民航大学项目部

姓名	2022/3/7		2022/3/8		2022/3/9		2022/3/10		2022/3/11		2022/3/12	
	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午
安国红	36.3	36.4	36.2	36.4								
刘广亮	36.3	36.3	36.3	36.3								
杜欣	36.2	36.4	36.2	36.4								
刘桐轩	36.3	36.3	36.1	36.3								
芦玉	36.2	36.4	36.1	36.3								
程燕宁	36.3	36.3	36.2	36.2								

	2022/3/13		2022/3/14		2022/3/15		2022/3/16		2022/3/17		2022/3/18	
安国红												
刘广亮												
杜欣												
刘桐轩												
芦玉												
程燕宁												

	2022/3/19		2022/3/20		2022/3/21		2022/3/22		2022/3/23		2022/3/24	
安国红												
刘广亮												
杜欣												
刘桐轩												
芦玉												
程燕宁												



中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程弱电智能化及智慧校园专项施工 -三局区域

表C3-3 班组安全活动记录表

单位名称	姓名	联系方式	体温 2022/3/8 上午	下午	2022/3/9 上午	下午	2022/3/10 上午	下午	2022/3/11 上午	下午	2022/3/12 上午	下午	2022/3/13 上午	下午	2022/3/14 上午	下午	2022/3/15 上午	下午	2022/3/16 上午	下午	2022/3/17 上午	下午
江森自控	种建宾	18931838836	36.2	36.4																		
江森自控	魏金亮	18103282986	36.3	36.3																		
江森自控	杨建民	19903281134	36.2	36.4																		
江森自控	吴杰松	15010108095	36.1	36.3																		
江森自控	薛延秋	15933849171	36.2	36.3																		
江森自控	何佳	17331364132	36.1	36.4																		
江森自控	王清霖	15832812012	36.2	36.1																		
江森自控	李晨伟	13253255752	36.2	36.3																		
江森自控	王志元	13131832928	36.2	36.4																		
江森自控	魏亚兴	13831814894	36.1	36.2																		
江森自控	魏志涛	17601036727	36.1	36.3																		
江森自控	房晓光	15811279590	36.2	36.3																		
江森自控	王艳龙	13466666858	36.1	36.2																		
江森自控	吕荣福	18310235608	36.2	36.3																		

每日体温监测

恒益建安能源专项施工日报

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司 项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告		制作完成情况:						表格编号	
	项目每日情况报告表								HYJA-MHDX-NYGC-001	
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程能源专项工程									
本表顺序号	时 间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO: 00171	2022 年 3 月 8 日					√				
作业计划编号		天气	非常晴朗☑ 晴朗☐ 多云☐ 雨☐ 雪☐ 冰冻☐							
施工部位	能源站	温度	⩽0 度☐ 0 度～10 度☐ 10 度～21 度☑ 21 度～30 度☐ ⩾30 度☐							
		风力	静风☐ 中等☐ 大风☑ 台风☐							
		湿度	干燥☐ 中等☐ 湿润☐							
一、现场人员情况										
单位名称	管理人员数		作业工人数				主要工作内容			

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告	整体完成情况:	表格编号
	项目每日情况报告表		HYJA-MHDX-NYGC-001

恒益建安	3	现场安排 13 人	能源站管道、阀门安装；烟囱安装
恒益建安	0	现场安排 0 人	
恒益建安	1	现场安排 24 人	水平连管开挖、接管、回填
施工人员合计	4	37 人	新增人员 0，项目人员体温正常

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
石油钻机	ZJ-30	良好	0
浅层钻机		良好	0

三、主要物资（设备）进场情况

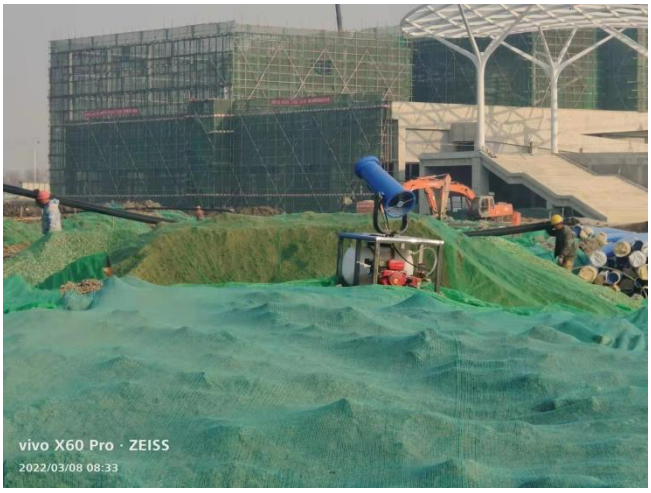
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				

五、施工完成情况	能源站	**本日施工内容:** 能源站管道、阀门安装；烟囱安装
		整体完成情况: 能源站管道、阀门安装 70%；烟囱安装 100%
施工完成情况	中深层地源热井	**本日施工内容: 施工完成**
		整体完成情况:
	浅层地源热井	**本日施工内容:** 第八系统第二条沟，回程开始连接，第十三系统第一条沟试水平连接完成，试压完成，开始回填，第十四系统第一条沟挖完，开始水平连接，第十五系统第一条沟开挖
		第八系统第二条沟，回程开始连接，第十三系统第一条沟试水平连接完成，试压完成，开始回填 80%，第十四系统第一条沟挖完，开始水平连接，第十五系统第一条沟开挖 50%
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	对高处作业施工进行专项巡视检查	
八、技术质量管理情况	施工进行全过程质量监管，日常机械监测，危险源辨识等。	

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格 作业面\项目每日情况制作 项目每日情况报告表	制作生成情况： 表格编号 HYJA-MHDX-NYGC-001
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	/	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：**	
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□	

现场施工影像	
	

	
能源站管道、阀门安装；烟道安装；第八系统第二条沟，回程开始连接，第十三系统第一条沟试水平连接完成，试压完成，开始回填，第十四系统第一条沟挖完，开始水平连接，第十五系统第一条沟开挖	

35KV 变电站

	中国建筑**项目管理表格**									
	作业面\项目每日情况报告表					表格编号				
						ZTWJ-MHDX-SWGC-001				
项目名称及编码	中国民航大学宁河校区 35kV 变电站工程电源线工程									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO: 0018	2022 年 3 月 8 日					✓				
作业计划编号		天气	非常晴朗☐ 晴朗☑ 多云☐ 雨☐ 雾☐ 雪☐ 冰冻☐							
施工部位	35kv 变电站电源线在外线	温度	⩽0 度☐ 0 度～10 度☑10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐ ⩾30 度☐							
		风力	静风☑中等☐ 大风☐ 台风☐							
		湿度	干燥☑ 中等☐ 湿润☐							
一、现场人员情况										
单位名称	管理人员数		作业工人数			主要工作内容				
						校区有检查				
宁东盛源电力	2		10			拆围挡、加工钢筋				
宁东盛源电力						修场、铺钢板协调中				
天津中源电力工程监理有限公司	2									
施工人员合计	4		10							

	中国建筑项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
翻斗车	小金钢		
挖掘机	75		1
挖掘机	200		1
挖掘机	210		2

三、主要物资（设备）进场情况

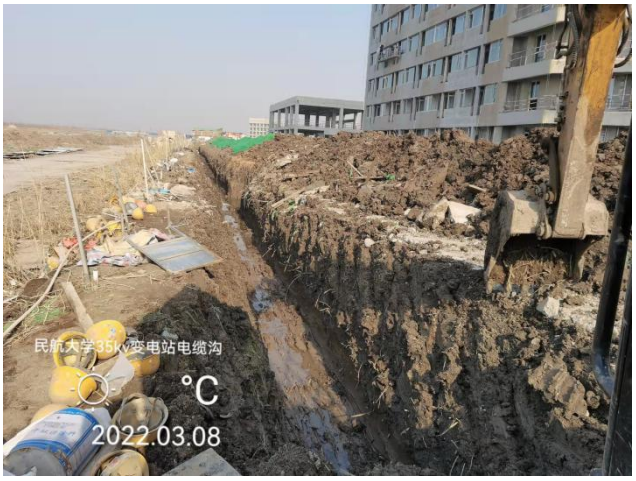
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				

五、施工完成情况	项目部	本日施工: **整体完成情况:**
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、对现场机械进行安全检查；2、对施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改；3、施工人员班前喊话。	
八、技术质量管理情况		
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	/	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：** /	
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☑；5、项目生产经理（项目总工）☑；6、项目工程部☑；7、项目资料室☐	

现场施工影像

民航大学35kv变电站拆围挡 ℃ 2022.03.08	民航大学35kv变电站电缆沟 ℃ 2022.03.08
