**中国民航大学宁河校区 1 月 12 日工程日报**

**一、施工概要**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 图书馆 | **本日施工内容:**电梯安装； 防火门安装；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；幕墙施工；现场文明施工清理；幻彩铝板安装；凸窗玻璃安装； |
| | | **总体完成情况:**机电管线安装 90%；幕墙安装完成 86%；防火门安装完成 91%； 电梯安装完成 31%;外架拆除完成 50%；幻彩铝板安装 40%；凸窗玻璃安装完成 55%; |
| 2 | 机场学院教学实验楼 | **本日施工内容:**机电安装给排水管道;通风管道;空调水管道;现场文明施工清理；外墙铝板安装；内墙腻子；幕墙施工；开启扇安装； |
| | | **总体完成情况:** 机电管线安装 91%；幕墙窗安装完成 100%；幕墙铝板安装完成 100%；内墙腻子完成 100%；主框安装完成 100%；玻璃安装完成 90%；开启扇安装 80%； |
| 3 | 公共教学楼 | **本日施工内容:** 幕墙施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理；外墙保温；外墙防火板安装；吊顶安装；开启扇安装 |
| | | **总体完成情况:** 机电管线安装完成 94%； 幕墙窗安装完成 97%；外墙保温完成 90%；外墙防火板安装完成 100%；外墙铝板安装 85%； 主框安装完成 100%； 玻璃安装完成 95%； 开启扇安装 80%； |
| 4 | 飞行乘务大楼及模拟舱楼 | **本日施工内容:**幕墙施工；门窗主框施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理；玻璃安装；开启扇安装；外墙保温; |
| | | **总体完成情况:** 机电管线安装完成 92%； 乘务楼主框安装完成 100%;玻璃安装完成 80%； 模拟仓外墙保温完成 100%； 首层幕墙安装完成 98%；模拟仓主框安装完成 100%;开启扇安装 50%； |
| 5 | 体育馆 | **本日施工内容:** 停止施工，防疫管理。 |
| | | **整体完成情况:** 二次结构施工完成，粗装修完成 60%；钢结构完成 99%；机电安装完成 71%;金属屋面 29%，幕墙 19%。 |
| 6 | 师生活动中心 | **本日施工内容:** 停止施工，防疫管理。 |
| | | **整体完成情况:** 主体结构完成 100%；二次结构完成 100%；主楼粗装修完成 100%，精装修完成 5%；机电安装完成 83％。 |
| 7 | 学生食堂 | **本日施工内容:** 停止施工，防疫管理。 |
| | | **整体完成情况:** 学生食堂二次结构完成 100%，粗装修完成 95%，屋面防水完成 100%，外保温完成 20%，机电安装完成 78%。 |
| 8 | 1#学生宿舍 | **本日施工内容:** 停止施工，防疫管理。 |
| | | **整体完成情况:** 粗装修完成 100%，精装修完成 25%，屋面工程完成 100%；外墙保温完成 80%；机电安装完成 81％。窗户 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 工程完成 85%；电梯工程完成 100%。 | |
| 9 | 2#学生宿舍 | **本日施工内容：**停止施工，防疫管理。 | |
| | | **整体完成情况：**粗装修完成 100%；精装修完成 55%，外墙保温完成 81%；机电安装完成 79％；窗户工程完成 85%；电梯工程完成 100%。 | |
| 10 | 3#学生宿舍 | **本日施工内容：**停止施工，防疫管理。 | |
| | | **整体完成情况：**二次结构完成 100%；粗装修完成 100%，精装修完成 10%；屋面工程完成 100%；机电安装完成 77％；外保温工程完成 30%；窗户工程完成 70%。 | |
| 11 | 4#学生宿舍 | **本日施工内容：**停止施工，防疫管理。 | |
| | | **整体完成情况：**粗装修完成 100%，精装修完成 30%；电梯工程完成 100%；机电安装完成 77％；外保温工程完成 20%；窗户工程完成 70%。 | |
| 12 | 5#学生宿舍 | **本日施工内容：**停止施工，防疫管理。 | |
| | | **整体完成情况：**粗装修完成 100%，精装修完成 30%；机电安装完成 77％；窗户工程完成 85%；外保温工程完成 20%；电梯工程完成 100%。 | |
| 13 | 35Kv 变电站 | 设备基础施工 | |
| 14 | 垃圾站 | 未施工 | |
| 15 | 弱电专项施工（江森自控） | 一、二标段 | **本日施工内容：**现场线缆敷设及敷管作业 |
| | | | **总体完成情况：**<br>图书馆 F1 层门禁线缆敷设，完成 30%。公共教学楼 F4 监控线缆敷设，总体完成 80%。飞行乘务楼 F1ONU 电源线缆敷设，总体完成 20%。飞行乘务楼综合布线线缆敷设，总体完成 70%。飞行乘务楼 F4 光纤线缆敷设，总体完成 35%。飞行乘务楼 F3、4 监控线缆敷设，总体完成 35%。体育馆楼 F1 层安防综合布线线缆敷设作业，总体完成 50%。3#宿舍 A 楼 F10 层监控综合布线线缆敷设，完成 20%。3#宿舍 F10 层电源线缆敷设，完成 90%。4#宿舍 F9 层能源线缆敷设，完成 70%。4#宿舍 F9 层门禁线缆敷设，完成 91%。 |
| 16 | 能源专项施工（恒益建安） | 能源站 | **本日施工内容：**能源站内支架制作，管道敷设；锅炉房烟囱安装 |
| | | | **整体完成情况：**能源站内支架制作 89%，管道敷设 47%；锅炉房烟囱安装 15% |
| | | 中深层地源热井 | **本日施工内容：**中深层地源热井钻井封堵 |
| | | | **整体完成情况：**中深层地源热井钻井封堵 1660 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 米 |
| | | 浅层地源热井 | **本日施工内容：**体育场浅层地源热井钻井 5 台钻机； |
| | | | **整体完成情况：**浅层地源热井钻井完成 20 口，累计完成 1083 口 |
| 17 | 中铁五局 | 项目部 | **本日施工内容:**因疫情防控原因，今日工人未进场施工，项目部留置人员核酸检测 |
| | | | **整体完成情况：**指挥部至变电站之间雨水管道（DN400）安装完成 50m，污水管道（DN400）安装完成 10m；实验楼南侧污水管道（DN300）安装完成 40m，井室安装 5 座；图书馆与实验楼之间雨水管道安装完成 15m，井室安装 3 座<br>雨水管道完成总量 88％，污水管道完成总量 95％ |
| 18 | 人员情况 | 八局今日劳动力人数 244 人。三局今日劳动力人数 325 人。中铁五局今日劳动力人数 7 人,江森自控今日劳动人数 47 人，恒益建安今日劳动人 31 人。 | |

# 二、监理日报

**一标段：**

1.因疫情原因，现场无大面积施工，监理部对图书馆及教学组团部分施工内容进行巡视检查。

2.监理部组织安全文明检查，主要对防疫物资及工人生活区隔离点进行检查，未发现异常现象。

**二标段：**

1. 因疫情原因，停止施工，全员进行第二次核酸检测。监理部对各单体进行外立面巡视，未发现异常现象。

**室外、能源及弱电：**

1. 能源：能源站内支架制作，管道敷设；锅炉房烟囱安装,中深层地源热井钻井封堵 1660 米；浅层地源热井钻井完成 20 口，累计完成 1083 口。

2. 弱电：现场敷管作业，施工正常。

3. 室外：因疫情防控原因，今日工人未进场施工，项目部留置人员核酸检测。

# 三、监理明日工作安排

| 标段划分 | 单体名称 | 监理人员 | 施工内容 | 监理工作时间、内容及路线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一标段<br>刘刚<br>（15162265570） | 图书馆 | 刘刚<br>（18082566239） | 钢结构施工、二次结构施工 | 对图书馆施工进行巡视检查 | |
| | | 张春博<br>（13027722180） | | 对图书馆施工进行巡视检查 | |
| | | 刘浩<br>（13400385767） | | 对图书馆施工进行巡视检查 | |
| | 教学组团 | 任海博<br>（18082566239） | 二次结构施工 | 对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查 | |
| | | 马瑞峰<br>（15614235758） | | 对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查。 | |
| | 所有单体安装工程 | 滕洪亮<br>（13234049175）<br>张春博<br>（13027722180） | 给排水及消防工程、暖通工程、机电安装工程施工 | 对现场施工巡视检查 | |
| 二标段<br>林利民<br>（18640512507） | 体育馆 | 丁建泽<br>（18845226778）<br>杨宸<br>（13364468744）<br>党泽南<br>（13630253982） | 钢结构施工、二次结构施工 | 对现场施工进行巡视检查，钢构件焊接巡检 | |
| | 师生活动中心 | | 屋面施工，装饰装修 | 对现场施工巡视检查 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4#、5#学生宿舍 | 吕非凡（17532527058）<br>马一博（17692498058） | 地砖铺设、外墙保温 | 对学生宿舍地砖铺设、外墙保温进行巡视检查 | |
| | 1#、2#、3#学生宿舍、食堂 | 乔天航(18547607857)<br>丁建泽（18845226778）<br>宋明（15345517113） | 抹灰施工、防潮层施工、外墙保温施工 | 对学生宿舍、学生食堂屋面砌筑施工，墙体抹灰施工进行巡视检查 | |
| | 垃圾房 | | 未施工 | 未施工 | |
| | 35kv 变电站 | | 设备基础施工 | 对现场施工巡视检查 | |
| | 所有单体安装工程 | 滕洪亮（13234049175）<br>乔天航(18547607857) | 给排水及消防工程、暖通工程、机电安装工程施工 | 对现场施工巡视检查 | |
| 室外 | 一标段 | 刘刚（18082566239）<br>任海博（18082566239）<br>刘浩（13400385767） | 室外管网施工 | 对管网现场施工巡视检查 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 二标段 | 滕洪亮（13234049175）<br>乔天航(18547607857)<br>李会彬（15512769592）<br>吕非凡（17532527058） | 室外管网施工 | 对管网现场施工巡视检查 | |
| 弱电 | 一标段 | 刘刚（18082566239） | 现场敷管作业 | 对现场施工巡视检查 | |
| | 二标段 | 滕洪亮（13234049175） | 现场敷管作业 | 对现场施工巡视检查 | |
| 能源 | 二标段 | 滕洪亮（13234049175）<br>乔天航(18547607857) | 中深层井钻井施工、浅层井施工 | 对现场施工巡视检查，旁站中深层钻井施工 | |
| 弱电 | 一标段 | 刘刚（18082566239） | 现场敷管作业 | 对现场施工巡视检查 | |
| | 二标段 | 滕洪亮（13234049175） | 现场敷管作业 | 对现场施工巡视检查 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源 | 二标段 | 滕洪亮<br>（13234049175）<br>乔天航<br>(18547607857) | 中深层井钻井施工、浅层井施工 | 对现场施工巡视检查，旁站中深层钻井施工 | |
| | | | | | |

**四、施工单位日报**

**一标段施工日报**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **中国建筑　项目管理表格** | | | | | | | | | |
| | 作业面\项目每日情况报告 | | | | | | | | 表格编号 | |
| | | | | | | | | | CSCEC8B-PM-B10401<br>CSCEC-PM-1101 | |
| 项目名称 | 中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段 | | | | | | | | | |
| 本表顺序号 | 时　间 | | 星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| NO：242 | 2022 年 1 月 12 日 | | | | | | ✓ | | | |
| 作业计划编号 | | 天气 | 非常晴朗☑ 晴朗☐　多云☐　雨☐　雪☐　霾☐ | | | | | | | |
| 施工部位 | 图书馆<br>机场学院教学实验楼<br>公共教学楼<br>飞行乘务大楼及模拟舱楼 | 温度 | ⩽0 度☑　0 度～10 度☐　10 度～21 度☐<br>21 度～30 度☐　⩾30 度☐ | | | | | | | |
| | | 风力 | 静风☐　中等☑　大风☐　台风☐ | | | | | | | |
| | | 湿度 | 干燥☑　中等☐　湿润 ☐ | | | | | | | |
| 一、现场人员情况 | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 管理人员数（日/夜） | 作业工人数（日/夜） | 主要工作内容 | | | | | | | |
| 中建八局 | 40 | 40 | 现场管理、方案编制 | | | | | | | |
| 天津唐海 | 2 | 17 | 机电安装 | | | | | | | |
| 北京慧欣 | 3 | 14 | 机电安装 | | | | | | | |
| 福建聚利 | 5 | 3 | 幕墙安装 | | | | | | | |
| 鼎天幕墙 | 1 | 0 | 幕墙安装 | | | | | | | |
| 天宇信达（二构） | 1 | 0 | 二次结构施工 | | | | | | | |
| 天津俊凯 | 1 | 20 | 机电通风 | | | | | | | |
| 宏坤煜业 | 1 | 40 | 机电通风 | | | | | | | |
| 堡泰消防 | 1 | 21 | 机电消防 | | | | | | | |
| 天河伟业 | 0 | 6 | 精装 | | | | | | | |
| 八局装饰 | 2 | 0 | 精装 | | | | | | | |
| 虹吸雨水 | 1 | 3 | 机电安装 | | | | | | | |
| 江森自控 | 2 | 18 | 机电安装 | | | | | | | |
| 三菱电梯 | 1 | 12 | 电梯安装 | | | | | | | |
| 合计 | 21 | 244 | | | | | | | | |
| 本日新增 | 0 人，体温正常 | | | | | | | | | |
| 二、现场机械设备情况 | | | | | | | | | | |
| 设备名称 | 型号 | 状态 | 工作台班 | | | | | | | |

| | 中国建筑　项目管理表格 | | |
|---|---|---|---|
| | 作业面\项目每日情况报告 | | 表格编号<br>CSCEC8B-PM-B10401<br>CSCEC-PM-1101 |
| 货用施工升降机 | SC200/200 | 良好 | 1 |
| 物料提升机 | SC120/120 | 良好 | 1 |
| 叉车 | 2 台 | 良好 | 2 |
| 洒水车 | 1 辆 | 良好 | 1 |
| 雾炮车 | 2 台 | 良好 | 2 |
| 钢筋切断机 | 40 型 | 良好 | 1 |
| 钢筋弯曲机 | 50 型 | 良好 | 1 |
| 钢筋调直机 | 50 型 | 良好 | 2 |
| 钢筋箍筋弯曲机 | 25 型 | 良好 | 3 |
| 挖机 | 60 型 | 良好 | 1 |
| 吊车 | 25 吨 | 良好 | 1 |
| 曲臂高空车 | / | 良好 | 9 |
| 升降车 | / | 良好 | 30 |
| | | | |

三、主要物资（设备）进场情况

| 物资名称 | 规格 | 数量 | 检验情况 | 试验情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

四、来访人员情况

| 时间 | 姓名 | 单位 | 工作目的 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 五、进度完成情况 | 图书馆 | 本日施工内容: 电梯安装； 防火门安装； 机电安装给排水管道； 通风管道; 空调水管道; 幕墙施工; 现场文明施工清理; 幻彩铝板安装; 凸窗玻璃安装; |
| | | 总体完成情况: 机电管线安装 90%; 幕墙安装完成 86%; 防火门安装完成 91%; 电梯安装完成 31%; 外架拆除完成 50%; 幻彩铝板安装 40%; 凸窗玻璃安装完成 55%; |
| | 机场学院 | 本日施工内容: 机电安装给排水管道； 通风管道； 空调水管道； 现场文明施 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 中国建筑　项目管理表格 | | |
| | 作业面\项目每日情况报告 | | 表格编号<br>CSCEC8B-PM-B10401<br>CSCEC-PM-1101 |
| | 教学实验楼 | 工清理；外墙铝板安装；内墙腻子；幕墙施工；开启扇安装； | |
| | | 总体完成情况：机电管线安装 91%；幕墙窗安装完成 100%；幕墙铝板安装完成 100%；内墙腻子完成 100%；主框安装完成 100%；玻璃安装完成 90%；开启扇安装 80%； | |
| | 公共教学楼 | 本日施工内容：幕墙施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理；外墙保温；外墙防火板安装；吊顶安装；开启扇安装 | |
| | | 总体完成情况：机电管线安装完成 94%；幕墙窗安装完成 97%；外墙保温完成 90%；外墙防火板安装完成 100%；外墙铝板安装 85%；主框安装完成 100%；玻璃安装完成 95%；开启扇安装 80%； | |
| | 飞行乘务大楼及模拟舱楼 | 本日施工内容：幕墙施工；门窗主框施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理；玻璃安装；开启扇安装；外墙保温； | |
| | | 总体完成情况：机电管线安装完成 92%；乘务楼主框安装完成 100%；玻璃安装完成 80%；模拟仓外墙保温完成 100%；首层幕墙安装完成 98%；模拟仓主框安装完成 100%；开启扇安装 50%； | |
| 六、业主监理指令 | | | |
| 七、安全管理情况 | 日常三间巡逻检查，裸土苫盖维护，现场排水，安全隐患排查以及整改 | | |
| 八、技术质量管理 | 对精装修技术问题协调、幕墙及门窗施工进行全过程质量监管，日常机械监测，危险源辨识等。 | | |
| 九、过程关键文件 | | | |
| 十、本日重大事项 | | | |
| 十一、工作小结 | **急需业主协调解决事宜：** | | |
| 抄送 | 1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□；<br>5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□ | | |
| 现场作业影像 | | | |

<table>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>库房拆除</td><td>铝板安装</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>生活区防疫巡查</td><td>消防泵房巡查</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>全员核酸检测</td><td>全员核酸检测</td></tr>
<tr><td colspan="2">现场航拍图 12.28</td></tr>
</table>





图书馆



实验楼





| | |
|---|---|
| 公共教学楼 | 飞行乘务大楼及模拟仓 |

**二标段**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **中国建筑　项目管理表格** | | | | | | | | | |
| | 作业面\项目每日情况报告表 | | 表格编号 | | | | | | | |
| | | | ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101 | | | | | | | |
| 项目名称及编码 | 中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程二标段 | | | | | | | | | |
| 本表顺序号 | 时　间 | | 星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| NO：002 | 2022 年 1 月 12 日 | | | | | | ✓ | | | |
| 作业计划编号 | | 天气 | 晴朗☐ 多云☐ 雨☐ 阴☑ 雪☐ 冰冻☐ 雾霾☐ | | | | | | | |
| 施工部位 | 1#-5#宿舍楼；食堂；指挥部；体育馆；师生活动中心 | 温度 | ⩽0 度 ☑ 0 度～10 度☑ 10 度～21 度☐<br>21 度～30 度☐ ⩾30 度 ☐ | | | | | | | |
| | | 风力 | 静风☐ 中等☑ 大风 ☐ 台风☐ | | | | | | | |
| | | 湿度 | 干燥☑ 中等☐ 湿润☐ | | | | | | | |
| 一、现场人员情况 | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 管理人员数（日/夜） | 作业工人数（日/夜） | 主要工作内容 | | | | | | | |
| 中建三局 | 28/15 | / | 方案编制、现场施工管理 | | | | | | | |
| 三局智能 | 2 | / | BIM 建模 | | | | | | | |
| 天津欣蕊 | 2/0 | 0/0 | / | | | | | | | |
| 三局二安 | 10/1 | 124/8 | 宿舍楼穿线、配电箱安装，食堂首层通风管道、风阀、桥架安装,体育馆二次配管，风管、水管、桥架施工 | | | | | | | |
| 三局一公司钢构 | 4/0 | 6/0 | 体育馆钢结构马道施工 | | | | | | | |
| 长沙广大 | 8/0 | 5/0 | 图纸深化 | | | | | | | |
| 兴华鑫宇 | 5/0 | 34/3 | 粗装修销项 | | | | | | | |
| 天津津宝福 | 5/0 | 20/3 | 粗装修销项 | | | | | | | |
| 北京迈易格 | 5/0 | 19/0 | 主框、玻璃安装、幕墙施工 | | | | | | | |
| 东方雨虹（防水） | 1/0 | 8/0 | 室内防水施工，屋面防水施工 | | | | | | | |
| 广日电梯 | 1/0 | 6/0 | 室内电梯安装 | | | | | | | |
| 川众 | 2/0 | 34/0 | 体育馆屋面施工 | | | | | | | |
| 建工幕墙 | 2/0 | 42/0 | 幕墙、门窗 | | | | | | | |
| 施工人员合计 | 75 | 311/14 | | | | | | | | |

| | 中国建筑　项目管理表格 | | |
|---|---|---|---|
| | 作业面\项目每日情况报告表 | 表格编号 | |
| | | ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101 | |

| 健康监测情况 | 体温正常 | 体温正常 | 在场人员防疫资料齐全 |
|---|---|---|---|
| 二、现场机械设备情况 | | | |
| 设备名称 | 型号 | 状态 | 工作台班 |
| 洒水车 | 12m³ | 良好 | 1 |
| 物料提升机 | SC100/100 | 良好 | 5 |
| 电梯 | SC200/200 | 良好 | 3 |
| 汽车吊 | 25t | 良好 | 2 |
| 挖掘机 | 330 型 | 良好 | 0 |
| | 200 型 | 良好 | 1 |
| | 90 型 | 良好 | 1 |
| 自卸汽车 | 20m³ | 良好 | 2 |
| 吊篮 | | 良好 | 97 |
| 保温设备 | 暖风机、加热炉 | 良好 | 66 台 |

| 三、主要物资（设备）进场情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物资名称 | 规格 | 数量 | 检验情况 | 试验情况 | 备注 |
| / | / | / | 合格 | 合格 | / |

| 四、来访人员情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 姓名 | 职位 | 工作目的 | 备注 |
| | | | | |

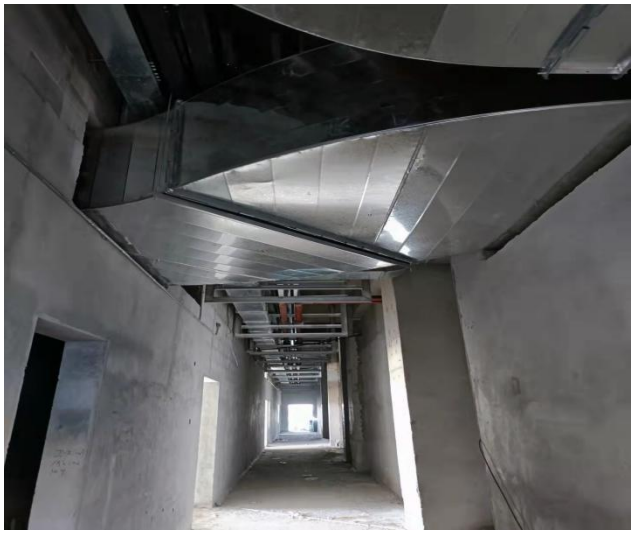
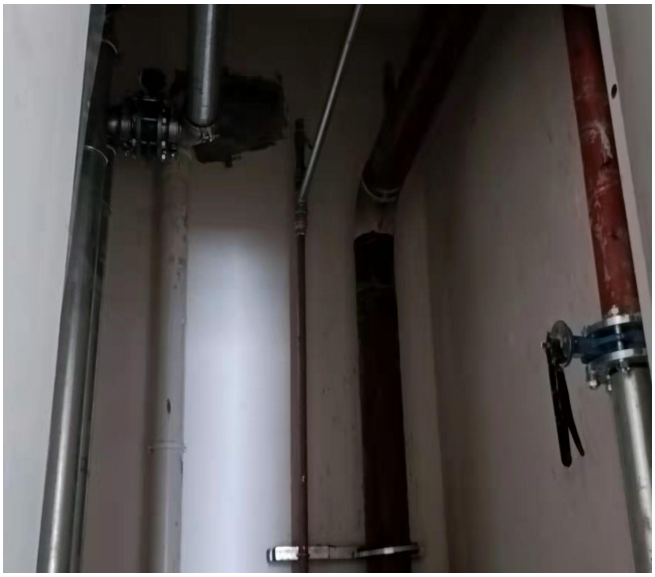
| 五、施工完成情况 | | |
|---|---|---|
| | 体育馆 | **本日施工内容**：停止施工，防疫管理。 |
| | | **整体完成情况**：二次结构施工完成，粗装修完成 60%；钢结构完成 99%；机电安装完成 71%;金属屋面 27%，幕墙 15%。 |
| | 师生活动中心 | **本日施工内容**：停止施工，防疫管理。 |
| | | **整体完成情况**：主体结构完成 100%；二次结构完成 100%；主楼粗装修完成 100%，精装修完成 5%；机电安装完成 83％。 |
| | 学生食堂 | **本日施工内容**：停止施工，防疫管理。 |
| | | **整体完成情况**：学生食堂二次结构完成 100%，粗装修完成 95%，屋面防水完成 100%，外保温完成 20%，机电安装完成 78%。 |
| | 1#学生宿舍 | **本日施工内容**：停止施工，防疫管理。 |
| | | **整体完成情况**：粗装修完成 100%，精装修完成 25%，屋面工程完成 100%；外墙保温完成 80%；机电安装完成 81％。窗户工程完成 85%；电梯工程完成 100%。 |

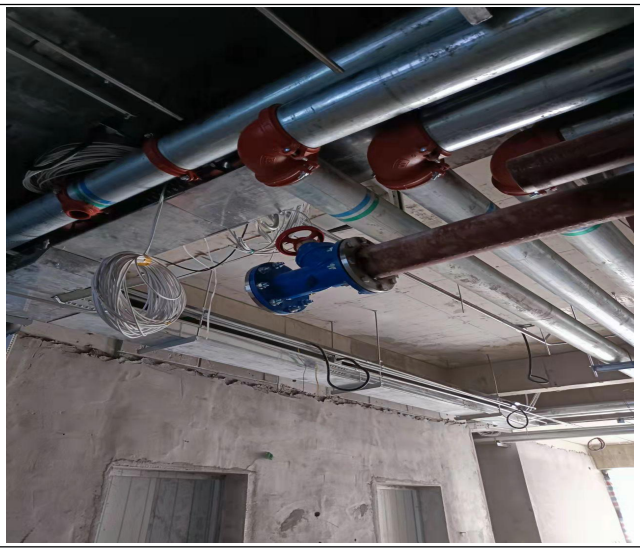
| | | |
|---|---|---|
| | 中国建筑　项目管理表格 | |
| | 作业面\项目每日情况报告表 | 表格编号<br>ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101 |
| | 2#学生宿舍 | **本日施工内容**：停止施工，防疫管理。 |
| | | **整体完成情况**：粗装修完成 100%；精装修完成 55%，外墙保温完成 81%；机电安装完成 79％；窗户工程完成 85%；电梯工程完成 100%。 |
| | 3#学生宿舍 | **本日施工内容**：停止施工，防疫管理。 |
| | | **整体完成情况**：二次结构完成 100%；粗装修完成 100%，精装修完成 10%；屋面工程完成 100%；机电安装完成 77％；外保温工程完成 30%；窗户工程完成 70%。 |
| | 4#学生宿舍 | **本日施工内容**：停止施工，防疫管理。 |
| | | **整体完成情况**：粗装修完成 100%，精装修完成 30%；电梯工程完成 100%；机电安装完成 77％；外保温工程完成 20%；窗户工程完成 70%。 |
| | 5#学生宿舍 | **本日施工内容**：停止施工，防疫管理。 |
| | | **整体完成情况**：粗装修完成 100%，精装修完成 30%；机电安装完成 77％；窗户工程完成 85%；外保温工程完成 20%；电梯工程完成 100%。 |
| 六、业主监理指令 | / | |
| 七、安全管理情况 | 1、对生活区进行检查；2、对现场临时用电进行检查；3、对整个施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改；抽水情况进行排查；4、现场疫情防控监察。 | |
| 八、技术质量管理情况 | 1、对体育馆、食堂、师生活动中心及宿舍楼冬季施工情况进行检查；2、对宿舍楼粗装修销项进行检查。3、BIM 建模幕墙、钢构、机电安装等。 | |
| 九、施工过程中关键问题来往文件记录 | / | |
| 十、本日重大事项 | 下午项目部组织进行在场全员核酸检测。 | |
| 十一、工作小结 | **急需业主协调解决事宜：** | |
| 抄送 | 1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□ | |

制，项目生产经理亲自填报整个项目部每日情况报告。报告包括的时间为当天上班时间到次日上班时间，提交报告的时间不迟于次日上午的 12 点。

| |
|---|
| 现场施工影像 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 体育馆 | 师生活动中心 |
|  |  |
| 学生食堂 | 1#学生宿舍楼 |
|  |  |
| 2#学生宿舍楼 | 3#学生宿舍楼 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 4#学生宿舍楼 | 5#学生宿舍楼 |
|  |  |
| 体育馆 | 学生食堂 |
|  |  |

| 1#学生宿舍楼 | 2#学生宿舍楼 |
| --- | --- |
|  |  |
| 3#学生宿舍楼 | 4#学生宿舍楼 |
|  | |
| 5#学生宿舍楼 | |

**中铁五局室外工程**

| 中国中铁 | 中国中铁　项目管理表格 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 作业面\项目每日情况报告表 | | | | 表格编号 | | | | |
| | | | | | ZTWJ-MHDX-SWGC-001 | | | | |
| 项目名称及编码 | 中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程室外施工 | | | | | | | | |
| 本表顺序号 | 时　间 | 星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |

| 中国中铁 | 中国中铁 项目管理表格 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 作业面\项目每日情况报告表 | | | | | | 表格编号 | | | | |
| | | | | | | | ZTWJ-MHDX-SWGC-001 | | | | |
| NO：149 | 2022 年 1 月 12 日 | | | | | ✓ | | | | | |
| 作业计划编号 | | 天气 | 非常晴朗☐ 晴朗☑ 多云☐ 雨☐ 雾☐ 雪☐ 冰冻☐ | | | | | | | | |
| 施工部位 | 指挥部至变电站之间、实验楼南侧、图书馆与实验楼之间 | 温度 | ⩽0 度☑ 0 度～10 度☑10 度～21 度☐<br>21 度～30 度☐ ⩾30 度☐ | | | | | | | | |
| | | 风力 | 静风☐中等☑ 大风☐ 台风☐ | | | | | | | | |
| | | 湿度 | 干燥☑ 中等☐ 湿润☐ | | | | | | | | |

一、（1）现场人员情况

| 单位名称 | 管理人员数 | 作业工人数 | 主要工作内容 |
|---|---|---|---|
| 中铁五局 | 7 | 0 | 项目部人员整理业内资料，核酸检测筛查 |
| | | | |
| | | | |
| 施工人员合计 | 7 | 0 | |

（2）疫情防控情况

| 有无新增人员 | 新增人员排查情况 | 项目人员体温是否正常 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 无 | / | 正常 | / |

二、现场机械设备情况

| 设备名称 | 型号 | 状态 | 工作台班 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

三、主要物资（设备）进场情况

| 物资名称 | 规格 | 数量 | 检验情况 | 试验情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

四、来访人员情况

| 时间 | 姓名 | 职位 | 工作目的 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| / | | | | |

| 五、施工完成情况 | 项目部 | **本日施工内容:** 因疫情防控原因，今日工人未进场施工，项目部留置人员核酸检测 |
|---|---|---|

| 中国中铁 | 中国中铁　项目管理表格 | |
|---|---|---|
| | 作业面\项目每日情况报告表 | 表格编号<br>ZTWJ-MHDX-SWGC-001 |

| | | |
|---|---|---|
| | | **整体完成情况**：指挥部至变电站之间雨水管道（DN400）安装完成 50m，污水管道（DN400）安装完成 10m；实验楼南侧污水管道（DN300）安装完成 40m，井室安装 5 座；图书馆与实验楼之间雨水管道安装完成 15m，井室安装 3 座<br>雨水管道完成总量 88%，污水管道完成总量 95% |
| 六、业主监理指令 | / | |
| 七、安全管理情况 | 1、对现场机械进行安全检查；2、对施工现场所有安全隐患进行排查； | |
| 八、技术质量管理情况 | / | |
| 九、施工过程中关键问题来往文件记录 | / | |
| 十、本日重大事项 | / | |
| 十一、工作小结 | **急需业主协调解决事宜：** / | |
| 抄送 | 1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☑；5、项目生产经理（项目总工）☑；6、项目工程部☑；7、项目资料室☐ | |

## 现场施工影像

| | |
|---|---|
| | |
| | |

**江森自控智慧校园建设弱电专项施工日报**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson Controls | **北京江森自控有限公司　项目管理表格** | | | | | | | | | |
| | 作业面\项目每日情况报告表 | | | | | | | | | 表格编号<br>JCI-CN23/21:1096<br>BJJSGCB-PM-2021003 |
| 项目名称 | 中国民航大学新校区智慧校园建设弱电专项施工 | | | | | | | | | |
| 本表顺序号 | 时　间 | | 星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| NO：149 | 2022 年 1 月 12 日 | | | | | | ✓ | | | |
| 作业计划编号 | | 天气 | 非常晴朗☐　晴朗☑多云☐　雨☐雪☐霾☐ | | | | | | | |
| 施工部位 | 全校区 | 温度 | ⩽0 度☑　0 度～10 度☐　10 度～21 度☐<br>21 度～30 度☐　⩾30 度☐ | | | | | | | |
| | | 风力 | 静风☐　中等☑　大风☐　台风☐ | | | | | | | |
| | | 湿度 | 干燥☐　中等☑　湿润☐ | | | | | | | |

一、现场人员情况

| 单位名称 | 管理人员数（日/夜） | 作业工人数（日/夜） | 主要工作内容 |
|---|---|---|---|
| 北京江森自控有限公司 | 5 | 5 | 现场管理、专业设计 |
| 施工 | 42 | 42 | 弱电施工 |
| 新增人员 | 0 | 0 | |
| 合计 | 47 | 47 | |
| 健康状况（体温） | 正常 | 正常 | |

二、现场机械设备情况

| 设备名称 | 型号 | 状态 | 工作台班 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| / | / | / | |

三、主要物资（设备）进场情况

| 物资名称 | 规格 | 数量 | 检验情况 | 试验情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Johnson Controls | 北京江森自控有限公司　项目管理表格 | |
| | 作业面\项目每日情况报告表 | 表格编号<br>JCI-CN23/21:1096<br>BJJSGCB-PM-2021003 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

四、来访人员情况

| 时间 | 姓名 | 单位 | 工作目的 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 五、进度完成情况 | 一、二标段 | 本日施工内容：现场线缆敷设及敷管作业 |
| | | 总体完成情况:<br>图书馆 F1 层门禁线缆敷设，完成 30%。公共教学楼 F4 监控线缆敷设，总体完成 80%。飞行乘务楼 F10NU 电源线缆敷设，总体完成 20%。飞行乘务楼综合布线线缆敷设，总体完成 70%。飞行乘务楼 F4 光纤线缆敷设，总体完成 35%。飞行乘务楼 F3、4 监控线缆敷设，总体完成 35%。体育馆楼 F1 层安防综合布线线缆敷设作业，总体完成 50%。3#宿舍 A 楼 F10 层监控综合布线线缆敷设，完成 20%。3#宿舍 F10 层电源线缆敷设，完成 90%。4#宿舍 F9 层能源线缆敷设，完成 70%。4#宿舍 F9 层门禁线缆敷设，完成 91%。 |
| 六、业主监理指令 | | |
| 七、安全管理情况 | | |
| 八、技术质量管理 | | |
| 九、过程关键文件 | | |
| 十、本日重大事项 | | |
| 十一、明日施工计划 | | |
| 十二、工作小结 | | |
| 抄送 | 1、建设方代表□；2、工程监理□；3、项目经理□；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室£ | |

# 作业影像


工程记录天津民航大学
施工区域：体育馆1层
施工内容：放线
拍摄时间：2022.01.12 16:41
天　　气：多云 1℃
地　　点：天津市·七里海大道


工程记录天津民航大学
施工区域：体育馆1层
施工内容：放线
拍摄时间：2022.01.12 16:41
天　　气：多云 1℃
地　　点：天津市·七里海大道


天津民航大学
2022.01.12 07:49
施工区域　4号宿舍楼9层
施工内容　门禁复位
地　　点　天津市宁河区·民航大学新校区
水印相机


天津民航大学
2022.01.12 16:46
施工区域　4号宿舍楼9层
施工内容　能源线缆敷设
地　　点　天津市宁河区·民航大学新校区
水印相机


中国民航大学
2022.01.12 15:52
施工区域　3号、宿舍楼、十层
施工内容　综合布线敷设线缆、加AP电源、复位、入箱
地　　点　天津市·天津市、中国民航大学宁河校区（建设中）
水印相机


中国民航大学
2022.01.12 15:52
施工区域　3号、宿舍楼、十层
施工内容　综合布线敷设线缆、加AP电源、复位、入箱
地　　点　天津市·天津市、中国民航大学宁河校区（建设中）
水印相机


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：图书馆一层
施工内容：门禁布线
拍摄时间：2022.01.12 10:07
地　　点：宁河区·云山垂钓
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：飞梁楼一层
施工内容：ONU箱电源
拍摄时间：2022.01.12 09:54
地　　点：宁河区·七里海大道
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：公共教学楼四层
施工内容：上软管
拍摄时间：2022.01.12 09:33
地　　点：宁河区·七里海大道
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：公共教学楼四层
施工内容：上软管
拍摄时间：2022.01.12 09:34
地　　点：宁河区·中开乳业有限公司
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：图书馆一层
施工内容：门禁布线
拍摄时间：2022.01.12 10:07
地　　点：宁河区·云山雅韵
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：飞乘楼四层
施工内容：监控布点位线
拍摄时间：2022.01.12 09:40
地　　点：宁河区·S2津宁高速
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：飞乘楼三层
施工内容：监控布点位线
拍摄时间：2022.01.12 09:44
地　　点：宁河区·七里海大道
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：图书馆一层
施工内容：门禁布线
拍摄时间：2022.01.12 15:14
地　　点：宁河区·中国民航大学(宁河校区)
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：飞乘楼一层
施工内容：TO布点位线
拍摄时间：2022.01.12 15:54
地　　点：宁河区·中国民航大学(宁河校区)
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：飞乘楼一层
施工内容：TO布点位线
拍摄时间：2022.01.12 15:56
地　　点：宁河区·田辛庄互通立交
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：飞乘楼四层
施工内容：穿光纤
拍摄时间：2022.01.12 16:09
地　　点：宁河区·中国民航大学(宁河校区)
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：飞乘楼三层
施工内容：监控布点位线
拍摄时间：2022.01.12 16:04
地　　点：宁河区·田辛庄互通立交
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：飞乘楼一层
施工内容：ONU箱电源
拍摄时间：2022.01.12 15:58
地　　点：宁河区·七里海大道
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：飞乘楼四层
施工内容：监控布点位线
拍摄时间：2022.01.12 16:06
地　　点：宁河区·七里海大道
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：飞乘楼一层
施工内容：TO布点位线
拍摄时间：2022.01.12 15:55
地　　点：宁河区·田辛庄互通立交
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：飞乘楼一层
施工内容：ONU箱电源
拍摄时间：2022.01.12 15:58
地　　点：宁河区·七里海大道
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施工区域：公共教学楼机房
施工内容：上软管
拍摄时间：2022.01.12 16:11
地　　点：宁河区·中国民航大学(宁河校区)
施工单位：江森自控

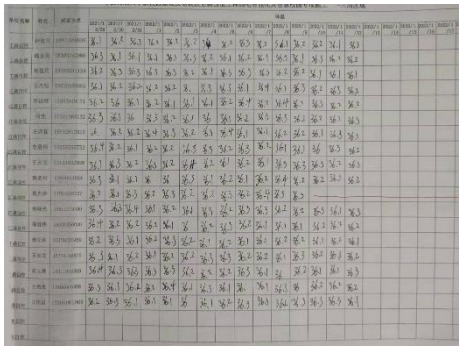
开槽、敷管、放线作业

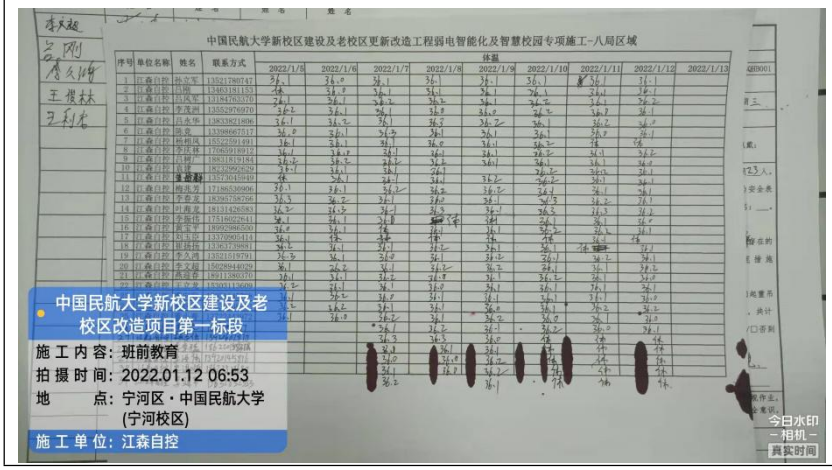






班前教育及安全检查





| 每日体温监测 |
| --- |
|  |
| 现场安全检查 |

**恒益建安能源专项施工日报**

| 恒益建安 | 天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 作业面\项目每日情况报告表 | | | 表格编号 | | | | | | |
| | | | | HYJA-MHDX-NYGC-001 | | | | | | |
| 项目名称及编码 | 中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程能源专项工程 | | | | | | | | | |
| 本表顺序号 | 时　间 | | 星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| NO：00134 | 2022 年 1 月 12 日 | | | | | | √ | | | |
| 作业计划编号 | | 天气 | 非常晴朗☑　晴朗☐ 多云☐　雨☐　雪☐ 冰冻☐ | | | | | | | |
| 施工部位 | 能源站 | 温度 | ⩽0 度☐　0 度～10 度☑ 10 度～21 度☐<br>21 度～30 度☐　⩾30 度☐ | | | | | | | |
| | | 风力 | 静风☑ 中等☐ 大风☑　台风☐ | | | | | | | |
| | | 湿度 | 干燥☐　中等☐　湿润☐ | | | | | | | |
| 一、现场人员情况 | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 管理人员数 | | 作业工人数 | | | | 主要工作内容 | | | |
| 恒益建安 | 3 | | 现场安排 11 人 | | | | 能源站管道、阀门安装，锅炉房烟囱安装 | | | |
| 恒益建安 | 5 | | 现场安排 13 人 | | | | 中深层地源热井钻井 | | | |
| 恒益建安 | 1 | | 现场安排 17 人 | | | | 浅层地源热井钻井 | | | |
| 施工人员合计 | | | 31 人 | | | | 无新增人员，项目人员体温正常 | | | |
| 二、现场机械设备情况 | | | | | | | | | | |

| 恒益建安 | 天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格 | |
|---|---|---|
| | 作业面\项目每日情况报告表 | 表格编号<br>HYJA-MHDX-NYGC-001 |

| 设备名称 | 型号 | 状态 | 工作台班 |
|---|---|---|---|
| 石油钻机 | ZJ-30 | 良好 | 1 |
| 浅层钻机 | | 良好 | 7 |

三、主要物资（设备）进场情况

| 物资名称 | 规格 | 数量 | 检验情况 | 试验情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

四、来访人员情况

| 时间 | 姓名 | 职位 | 工作目的 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| / | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 五、施工完成情况 | 能源站 | **本日施工内容：** 能源站内支架制作，管道敷设；锅炉房烟囱安装 |
| | | **整体完成情况：** 能源站内支架制作 89%，管道敷设 47%；锅炉房烟囱安装 15% |
| 施工完成情况 | 中深层地源热井 | **本日施工内容：** 中深层地源热井钻井封堵 |
| | | **整体完成情况：** 中深层地源热井钻井封堵 1660 米 |
| | 浅层地源热井 | **本日施工内容：** 体育场浅层地源热井钻井 5 台钻机； |
| | | **整体完成情况：** 浅层地源热井钻井完成 20 口，累计完成 1083 口 |
| 六、业主监理指令 | / | |
| 七、安全管理情况 | 1、对能源站临时用电进行巡视检查并进行整改修复 | |
| 八、技术质量管理情况 | 对管件制作焊接施工全过程监管，日常机械维护。 | |
| 九、施工过程中关键问题来往文件记录 | / | |
| 十、本日重大事项 | / | |
| 十一、工作小结 | **急需业主协调解决事宜：** | |
| 抄送 | 1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□ | |

| 现场施工影像 | |
| --- | --- |
| | |
| | |
| 能源站内支架制作，管道敷设；锅炉房烟囱安装；中深层地源热井扫井；体育场浅层地源热井钻井；网球场浅层地源热井钻井 | |
