图书馆组团



图书馆人防地库拆模完成，清理完成 95%，二次结构放线完成 50%；首层架体拆除完成 80%；



图书馆效果图

教学区组团




机场学院教学实验楼三层植筋完成；屋面材料清理打包完成 90%。清理完成 25%；公共教学楼出屋面层 2 段柱筋绑扎完成 40%，首层回填完成 30%；二层二次结构外墙砌筑完成 15%，样板间砌筑完成 100%。飞行乘务大楼飞行乘务大楼出屋面层 1 段 2 段花架梁钢筋绑扎完成 100%，4 段架体搭设完成，一层二次结构基础墙砌筑完成 40%。



教学组团效果图

体育馆组团

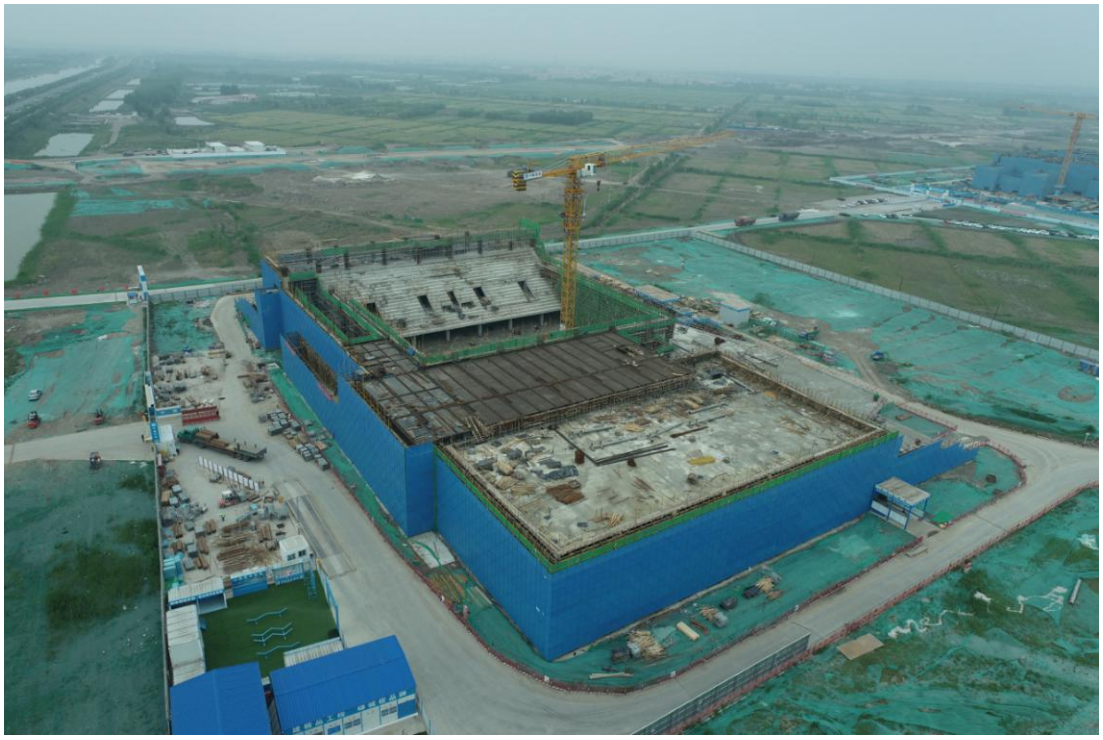

体育馆一区、二区三层架体搭设完成 85%，二层看台拆模完成，首层顶板拆模完成 90%，四区二层顶板、梁模板支设完成 90%，钢筋绑扎完成 75%




体育馆效果图



1 号 A 段 2 层砌筑完成 75%；B 段零层板浇筑完成。2 层砌筑完成 80%，构造柱浇筑完成 80%，3 层反坎浇筑完成；2 号楼 2 层砌筑完成 90%，4 层防水反坎验收合格；3 号 10 层二段竖向钢筋完成 100%，模板完成 80%，一段机房层竖向钢筋完成 50%；4#楼机房层钢筋绑扎完成 80%，夹层顶板完成 80%；4 号楼首层砌筑完成 45%；5#楼机房层夹层顶板浇筑完成，5 号楼 3 层砌筑完成 35%，5 层防水反坎浇筑完成



学生宿舍效果图



食堂首层墙体砌筑完成 60%，圈梁及构造柱砼浇筑完成 50%，能源站反坎模板支设 30%



学生食堂效果图



师生活动中心裙楼 B 水电安装预留预埋，师生活动中心主楼屋面层墙柱顶板、梁砼养护，师生活动中心主楼首层墙体砌筑完成 85%



师生活动中心效果图



35KV 变电站主体完成
