建设单位：中国民航大学宁河校区

施工单位：中国建筑第八工程有限公司（一标段）

中国建筑第三工程有限公司（二标段）

监理单位：全咨

日期：2021 年 5 月 28 日 星期五

天气：晴，风力中等

【目录】

一. 工地疫情防护情况

二. 现场人员设备情况

三. 材料物资进场情况

四. 工程进度情况

五. 现场作业影像

一、疫情防控情况

按本项目疫情防控工作方案和应急预案抓好工地常态化疫情防控工作，防疫物资储备充足，无疫情发生。

二、现场人员设备情况

中建八局（一标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建八局	40	40	现场管理、方案编制
天宇信达	5	202/26	图书馆一次结构
肥城环宇	2	14	机电安装
北京慧欣	2	22	机电安装
永达保信	1	16	文明施工
天津金拓	1	1	降水运行
天津科顺	1	1	防水施工
唐山彬达	7	301/32	教学组团一次结构
东方城	4	8	钢结构施工
福建聚利	3	4	幕墙安装
鼎立安	1	12	外架搭设
天宇信达(二构)	7	28	二次结构施工
天津俊凯	2	2	机电通风
合计	76	650	
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
叉车	3 台	良好	1
洒水车	1 辆	良好	4
雾炮车	2 台	良好	1
钢筋切断机	40 型	良好	2
钢筋弯曲机	50 型	良好	5
钢筋调直机	50 型	良好	5
钢筋箍筋弯曲机	25 型	良好	2
塔吊	XGT7527	良好	3
塔吊	TC7013-10D		2
吊车	50t	良好	3
吊车	350t	良好	1

中建三局（二标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	28/10	/	方案编制、现场施工管理
天津欣蕊	2/0	10/10	师生活动中心裙楼B座回填
三局二安	6/0	75/28	师生活动中心、学生食堂、宿舍楼、体育馆水电预留预埋，指挥部水电安装
梁平荣安	20/2	482/125	模板支设、拆除、满堂架搭设，钢筋清理、绑扎；砼浇筑，清理现场
三局一公司钢构	4/0	10/0	师生活动中心钢梁安装，指挥部防火涂料喷涂，金属屋面施工
北京东方雨虹防水工程有限公司	1/0	0/0	
山东海灏装饰设计有限公司	4/1	71/26	外墙铝板安装，屋面天沟龙骨安装，墙面刮腻子，幕墙玻璃安装
兴华鑫宇	4/0	76/0	二次结构放线、植筋、反坎支模，墙体砌筑
天津津宝福	4/0	58/0	二次结构放线、植筋、反坎支模，墙体砌筑
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	1
塔吊	TC6012	良好	2
	TC7013	良好	2
	XGT6513	良好	2
物料提升机	SC100/100	良好	4
电梯	SC200/200	良好	3
汽车吊	50t	良好	2
挖掘机	330 型	良好	0
	200 型	良好	0
	90 型	良好	0
自卸汽车	20m³	良好	0

三、物资进场情况

中建八局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
蒸压加气快	600*240*200	96	√	√	
中建三局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
加气块		60 方	合格		
白灰		10 吨	合格		

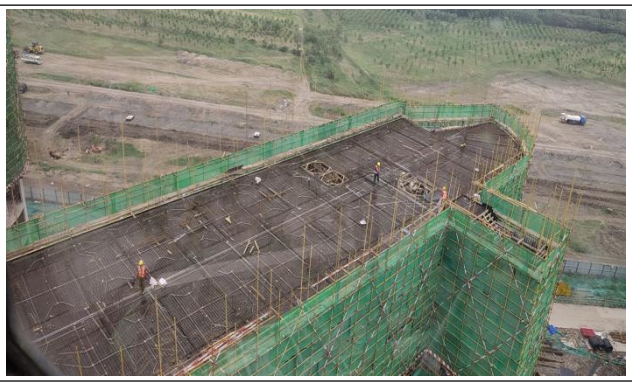
四、工程进度情况

中建八局 （一标段）	①图书馆人防地库拆模完成、清理完成 80%，首层架体拆除完成 50%；D1 区三层架体搭设完成 90%;顶板支模完成 90%;D2 区三层架体搭设完成 90%，;顶板支模完成 90%;D3 区三层架体搭设完成 90%，顶班支模完成 20%;D4 区三层内支撑架体 90%，顶板支模完成 50%;4 节柱安装完成。 ②机场学院教学实验楼首层层材料清理完成 80%；三层植筋 50% ③公共教学楼 4 层 1 段混凝土浇筑完成；一层基础墙砌筑完成 50%。样板间砌筑完成 90%。 ④飞行乘务大楼出屋面层 1 段 2 段花架模板支设完成 70% ⑤模拟舱四层柱筋绑扎完成 60%.
中建三局 （二标段）	1、体育馆一区、二区二层看台及顶板梁砼浇筑完成，看台开始拆模，三层框架柱钢筋备料，四区二层顶板、梁模板支设完成 70%，钢筋绑扎完成 40%，游泳池顶板女儿墙模板支设完成 85%；师生活动中心主楼屋面层梁钢筋绑扎完成，顶板、梁模板完成 95%，主楼首层墙体砌筑完成 95%，二层反坎砼浇筑完成，备料，三层反坎模板支设完成； 2、指挥部外墙铝板安装完成 95%，室内墙面一遍腻子石膏完成 95%，幕墙玻璃安装完成 65%，室内铝板收口完成 25%，屋面挑檐木望板安装完成 95%； 3、1#A 段 2 层砌筑完成 50%；B 段零层板钢筋绑扎完成 100%，2 层砌筑完成 55%；2 号楼零层板浇筑完成。2 层砌筑完成 70%；3#9 层二段顶板上铁钢筋完成 100%，验收合格；4#楼 9 层顶板上铁钢筋完成 100%，验收合格；4#楼首层砌筑完成 25%。5＃楼零层板下垫层浇筑完成，机房层竖向钢筋绑扎完成；5 号楼 4 层防水反坎浇筑完成； 4、食堂首层反坎支设及砼浇筑完成，墙体砌筑完成 45%，圈梁砼浇筑完成 40%。。

五、现场作业影像

<table>
<tr><td colspan="2">中建八局（一标段）</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆钢结构吊装</td><td>公共教学楼首层砌筑</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>公共教学楼样板间砌筑</td><td>三件巡查</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>蒸压加气块进场</td><td>公共教学楼混凝土浇筑</td></tr>
</table>

中建三局（二标段）	
	
体育馆一区、二区二层看台及顶板梁砼浇筑完成，看台开始拆模，三层框架柱钢筋备料	四区二层顶板、梁模板支设完成 70%，钢筋绑扎完成 40%，游泳池顶板女儿墙模板支设完成 85%
	
师生活动中心裙楼 B 回填完成	师生活动中心主楼屋面层梁钢筋绑扎完成，顶板、梁模板完成 95%，主楼首层墙体砌筑完成 95%，二层反坎砼浇筑完成，备料，三层反坎模板支设完成
	
指挥部外墙铝板安装完成 95%，室内墙面一遍腻子石膏完成 95%，幕墙玻璃安装完成 65%，室内铝板收口完成 25%，屋面挑檐木望板安装完成 95%	1#A 段 2 层砌筑完成 50%；B 段零层板钢筋绑扎完成 100%，2 层砌筑完成 55%；

	
2 号楼零层板浇筑完成。2 层砌筑完成 70%；	3#9 层二段顶板上铁钢筋完成 100%，验收合格；
	
4#楼首层砌筑完成 25%，4#楼 9 层顶板上铁钢筋完成 100%，验收合格；	5#楼零层板下垫层浇筑完成，机房层竖向钢筋绑扎完成；5 号楼 4 层防水反坎浇筑完成
	
食堂首层反坎支设及砼浇筑完成，墙体砌筑完成 45%，圈梁砼浇筑完成 40%	
