中国民航大学宁河校区 9 月 5 日工程日报

一、施工概要

1	图书馆	**本日施工内容**:二次结构施工；钢结构屋面钢梁吊装；钢结构楼承板混凝土浇筑；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理
		总体完成情况:图书馆二次结构施工完成 88%；屋面核心筒浇筑完成 100%；钢结构安装完成 98%；机电安装 68%；幕墙安装完成 28%；
2	机场学院教学实验楼	**本日施工内容**:二次结构施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；屋面施工；现场文明施工清理
		总体完成情况:二次结构施工完成 98%；机电安装 62%；幕墙安装完成 63%；屋面施工完成完成 100%；屋面八字脚施工完成 100%
3	公共教学楼	**本日施工内容**:二次结构施工；幕墙施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；屋面施工；现场文明施工清理
		总体完成情况: 二次结构施工完成 100%，机电安装完成 72%；幕墙安装完成 61%；屋面施工完成 100%；屋面八字脚施工完成 10%
4	飞行乘务大楼及模拟舱楼	**本日施工内容**:二次结构施工；屋面混凝土找坡层浇筑；钢楼梯安装；幕墙龙骨施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；屋面施工；现场文明施工清理
		总体完成情况：二次结构施工完成 96%；机电安装完成 61%；幕墙安装完成 67%;钢楼梯安装完成 100%;屋面施工完成 80%。
5	体育馆	**本日施工内容**：首层墙体砌筑，构造柱浇筑，二层打眼、植筋，墙体砌筑，三层备料，变电室墙体模板拆除，钢结构桁架拼装、立柱吊装。机电安装楼梯间疏通及划线定位。墙体二次配管。
		整体完成情况：二次结构施工完成 37%；钢结构完成 75%；机电安装完成 4%。
6	师生活动中心	**本日施工内容**：主楼楼内垃圾清理，墙面拉毛、挂网，室内墙面抹灰，裙房 A 管沟模板拆除清理，机电安装三层公区明配管，四层风管安装。二层样板施工
		整体完成情况：主体结构完成 98%；主楼二次结构完成 99%；主楼初装修完成 31%；机电安装完成 26%
7	学生食堂	**本日施工内容**：首层墙体砌筑收尾，能源站墙体砌筑，能源站设备基础支模，幕墙测量放线，机电安装风管加工，楼梯间疏通划线定位，风管加工。
		整体完成情况:食堂二次结构收尾,能源站二次结构完成 69%；机电安装完成 8%
8	1#学生宿舍	**本日施工内容**：1#楼 A 段屋面砌筑，五层抹灰；B 段屋面砌筑，五层拉毛抹灰；门窗副框安装，1A 六层机电安装宿舍内

		开槽及二次配管， 配电箱安装。	
		整体完成情况：二次结构完成 97%；初装修完成 46%；机电安装完成 23%.	
9	2#学生宿舍	**本日施工内容**：五层拉毛抹灰，门窗副框安装，机电安装六层电井内开槽，宿舍和公区二次配管。	
		整体完成情况：二次结构完成 98%；初装修完成 52%；机电安装完成 23%	
10	3#学生宿舍	**本日施工内容**：九层构造柱模板支设，砼浇筑，屋面墙体砌筑；三层拉毛抹灰，二层拉毛；门窗副框安装；机电安装二层排堵穿线，四层配管及固定箱和线盒。	
		整体完成情况：二次结构完成 95%；初装修完成 7%；机电安装完成 13%	
11	4#学生宿舍	**本日施工内容**：五层抹灰，六层拉毛；屋面层墙体砌筑，砼浇筑，门窗副框安装，机电安装七层卫生间开槽及二次配管，八层立管放线。	
		整体完成情况：二次结构完成 95%；初装修完成 21%；机电安装完成 14%	
12	5#学生宿舍	**本日施工内容**：屋面墙体砌筑，九层构造柱、窗台支模砼浇筑；4 层抹灰，5 层抹灰，6 层拉毛；门窗副框安装，机电安装 5 层桥架安装，6 层宿舍及公区开槽、二次配管。	
		整体完成情况：二次结构完成 97%；初装修完成 31%；机电安装完成 19%	
13	35Kv 变电站	未施工	
14	垃圾站	未施工	
15	弱电专项施工（江森自控）	宿舍楼	**本日施工内容**: 现场核查
			总体完成情况：1#宿舍楼 5 层现场核查完毕，1#宿舍楼总体完成 50%。 2#宿舍 B 楼 6 层核查完成，2#宿舍 B 楼总体完成 50%。4#宿舍楼 5 层核查完成，4#宿舍楼总体完成 22%。5#宿舍楼 4 层核查完成，5#宿舍楼总体完成 11%。
16	能源专项施工（恒益建安）	办公区、能源站	**本日施工内容**：现场查看食堂冷却塔及能源站内基础制作情况，
			整体完成情况：现场查看冷却塔基础制作情况 5%
		中深层井场	**本日施工内容**：中深层井场设备基础底座抽水
			整体完成情况：中深层井场设备基础底座抽水 90%
17	中铁五局	项目部	**本日施工内容**：本日下雨，学习研究图纸图集

			整体完成情况：对于图纸上提到的图集及相关规范进行学习
18	人员情况	八局今日劳动力人数 484 人。三局今日劳动力人数 487 人。中铁五局今日劳动力人数 2 人，江森自控今日劳动人数 7 人恒益建安今日劳动人数 6 人。	

二、监理日报

一标段：

1.现场下雨未大面积施工，前往吊篮厂家考察。

二标段：

1.　监理部下午对体育馆钢结构吊装焊接施工巡视检查。

2.对师生活动中心主楼墙面抹灰工程及水电风管安装施工巡视检查。

3.对学生食堂水电风管安装施工巡视检查，能源站二次结构砌筑巡视检查，符合设计要求。

4.对学生宿舍各单体二次结构施工、墙面抹灰工程及水电风管安装施工巡视检查。

室外、能源及弱电：

1.能源：深层井场设备基础底座抽水 90%。

三、监理明日工作安排

标段划分	单体名称	监理人员	施工内容	监理工作时间、内容及路线	备注
一标段 刘刚 （15162265570）	图书馆	刘刚 （18082566239）	钢结构施工、二次结构施工	对图书馆施工进行巡视检查	
		张春博 （13027722180）		对图书馆施工进行巡视检查，旁站砼浇筑施工	
		刘浩 （13400385767）		对图书馆施工进行巡视检查，旁站砼浇筑施工	
	教学组团	马瑞峰 （15614235758）	二次结构施工	对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查，旁站砼浇筑。	
		任海博 （18082566239）		对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查。	
		乔天航 (18547607857)		对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查，旁站砼浇筑。	
	所有单体安装工程	滕洪亮 （13234049175） 张春博 （13027722180）	给排水及消防工程、暖通工程、机电安装工程施工	对现场施工巡视检查	

二标段 林利民 （18640512507）	体育馆	李晓峰 （15102669182） 党泽南 （13630253982）	钢结构施工、二次结构施工	对现场施工进行巡视检查	
	指挥部		未施工	对现场施工巡视检查	
	师生活动中心		二次结构施工、抹灰施工	对现场施工巡视检查	
	3#、4#、5#学生宿舍	于烨 （13081821380） 李会彬 （15512769592）	二次结构施工、抹灰施工	对学生宿舍屋面砌筑施工，墙体抹灰施工进行巡视检查	
	1#、2#学生宿舍、食堂	吕非凡 （17532527058） 李宝华 （13673126287） 马一博 （17692498058）	二次结构施工、抹灰施工	对学生宿舍、学生食堂屋面砌筑施工，墙体抹灰施工进行巡视检查	
	垃圾房		未施工	未施工	
	35kv 变电站		未施工	未施工	
	所有单体安装工程	滕洪亮 （13234049175） 李会彬 （15512769592）	给排水及消防工程、暖通工程、机电安装工程施工	对现场施工巡视检查	

室外	一标段	刘刚 （18082566239） 张春博 （13027722180）	未施工	未施工	
	二标段	林利民 （18640512507 于烨 （13081821380）	未施工	未施工	
弱电	一标段	滕洪亮 （13234049175） 刘浩 （13400385767）	未施工	未施工	
	二标段	滕洪亮 （13234049175） 吕非凡 （17532527058）	未施工	未施工	
能源	二标段	滕洪亮 （13234049175） 李会彬 （15512769592）	平整场地	对现场施工巡视检查	

四、施工单位日报

一标段施工日报

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="9">中国建筑　项目管理表格</td></tr>
<tr><td colspan="6">作业面\项目每日情况报告表</td><td colspan="3">表格编号
CSCEC8B-PM-B10401
CSCEC-PM-1101</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段</td></tr>
<tr><td>本表顺序号</td><td colspan="2">时　间</td><td colspan="2" rowspan="2">星期</td><td>日</td><td>一</td><td>二</td><td>三</td><td>四</td><td>五</td><td>六</td></tr>
<tr><td>NO：135</td><td colspan="2">2021 年 9 月 5 日</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>作业计划编号</td><td colspan="2"></td><td>天气</td><td colspan="7">非常晴朗☐　晴朗☐　多云☐　雨☑　雪☐　霾☐</td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工部位</td><td rowspan="3">图书馆
机场学院教学实验楼
公共教学楼
飞行乘务大楼及模拟舱楼</td><td>温度</td><td colspan="7">≤0 度☐　0 度～10 度☐　10 度～21 度☐
21 度～30 度☑　≥30 度☐</td></tr>
<tr><td>风力</td><td colspan="7">静风☐　中等☑　大风☐　台风☐</td></tr>
<tr><td>湿度</td><td colspan="7">干燥☐　中等☐　湿润■</td></tr>
<tr><td colspan="10">一、现场人员情况</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="2">管理人员数（日/夜）</td><td colspan="3">作业工人数（日/夜）</td><td colspan="4">主要工作内容</td></tr>
<tr><td>中建八局</td><td colspan="2">40</td><td colspan="3">40</td><td colspan="4">现场管理、方案编制</td></tr>
<tr><td>天宇信达</td><td colspan="2">2</td><td colspan="3">10</td><td colspan="4">图书馆一次结构</td></tr>
<tr><td>肥城环宇</td><td colspan="2">2</td><td colspan="3">18</td><td colspan="4">机电安装</td></tr>
<tr><td>北京慧欣</td><td colspan="2">2</td><td colspan="3">31</td><td colspan="4">机电安装</td></tr>
<tr><td>永达保信</td><td colspan="2">2</td><td colspan="3">20</td><td colspan="4">文明施工</td></tr>
<tr><td>天津金拓</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">1</td><td colspan="4">降水运行</td></tr>
<tr><td>天津科顺</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">4</td><td colspan="4">防水施工</td></tr>
<tr><td>唐山彬达</td><td colspan="2">2</td><td colspan="3">4/2</td><td colspan="4">教学组团一次结构</td></tr>
<tr><td>东方诚</td><td colspan="2">5</td><td colspan="3">36</td><td colspan="4">钢结构施工</td></tr>
<tr><td>福建聚利</td><td colspan="2">6</td><td colspan="3">27</td><td colspan="4">幕墙安装</td></tr>
<tr><td>鼎立安</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">12</td><td colspan="4">外架搭设</td></tr>
<tr><td>天宇信达（二构）</td><td colspan="2">9</td><td colspan="3">205</td><td colspan="4">二次结构施工</td></tr>
<tr><td>天津俊凯</td><td colspan="2">2</td><td colspan="3">22</td><td colspan="4">机电通风</td></tr>
<tr><td>宏坤煜业</td><td colspan="2">3</td><td colspan="3">34/6</td><td colspan="4">机电通风</td></tr>
<tr><td>恒福消防</td><td colspan="2">2</td><td colspan="3">12</td><td colspan="4">机电消防</td></tr>
<tr><td>堡泰消防</td><td colspan="2">2</td><td colspan="3">8</td><td colspan="4">机电消防</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">82</td><td colspan="3">484</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="10">二、现场机械设备情况</td></tr>
<tr><td>设备名称</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">状态</td><td colspan="4">工作台班</td></tr>
</table>

	中国建筑　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告表		表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
货用施工升降机	SC120/120	良好	6
物料提升机	AC/200	良好	1
叉车	3 台	良好	4
洒水车	1 辆	良好	1
雾炮车	2 台	良好	2
钢筋切断机	40 型	良好	5
钢筋弯曲机	50 型	良好	5
钢筋调直机	50 型	良好	2
钢筋箍筋弯曲机	25 型	良好	3
塔吊	XGT7527	良好	2
塔吊	TC7013-10D	良好	3
挖机	60 型	良好	1
挖机	200 型	良好	1

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
加气块	200*240*600	80m³	√	√	

四、来访人员情况

时间	姓名	单位	工作目的	备注

五、进度完成情况	图书馆	本日施工内容:二次结构施工；钢结构屋面钢梁吊装； 钢结构楼承板混凝土浇筑；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理
		总体完成情况:图书馆二次结构施工完成 88%；屋面核心筒浇筑完成 100%；钢结构安装完成 98%；机电安装 68%；幕墙安装完成 28%；
	机场学院教学实验楼	本日施工内容:二次结构施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；屋面施工；现场文明施工清理
		总体完成情况：二次结构施工完成 98%；机电安装 62%；幕墙安装完成 63%；屋面施工完成完成 100%；屋面八字脚施工完成 100%
	公共教学	本日施工内容：二次结构施工；幕墙施工；机电安装给排水管道；通风管道；

	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101

	楼	空调水管道；屋面施工；现场文明施工清理
		总体完成情况：二次结构施工完成 100%，机电安装完成 72%；幕墙安装完成 61%；屋面施工完成 100%；屋面八字脚施工完成 10%
	飞行乘务大楼及模拟舱楼	本日施工内容:二次结构施工；屋面混凝土找坡层浇筑；钢楼梯安装；幕墙龙骨施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；屋面施工；现场文明施工清理
		总体完成情况：二次结构施工完成 96%；机电安装完成 61%；幕墙安装完成 67%；钢楼梯安装完成 100%；屋面施工完成 80%。
六、业主监理指令		
七、安全管理情况	日常三间巡逻检查，裸土苫盖维护，安全隐患排查以及整改，雨后防汛现场排查	
八、技术质量管理	对降水运行、防水清理、架体搭设、钢筋施工、二次结构、幕墙安装、钢结构施工进行全过程质量监管，日常机械监测。	
九、过程关键文件		
十、本日重大事项		
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：**	
抄送	1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□； 5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□	

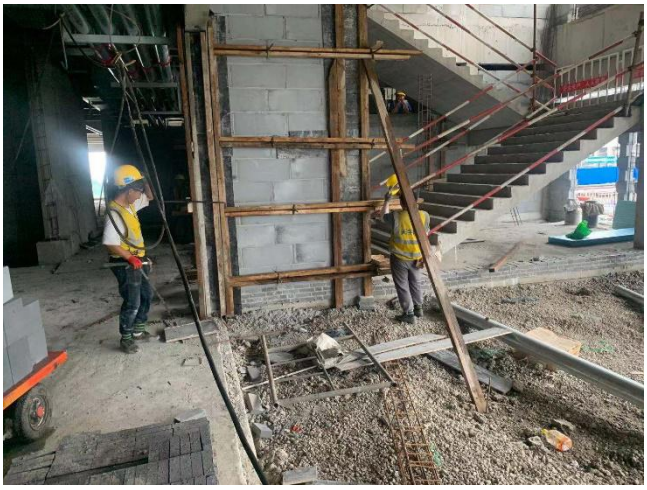
现场作业影像



图书馆屋面巡查



5#塔拆除

	
实验楼样板施工	图书馆钢结构焊接
	
飞行乘务大楼清理	实验楼支模

现场航拍图 8.26

<table>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆</td><td>飞行乘务大楼及模拟舱</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>公共教学楼</td><td>机场学院教学实验楼</td></tr>
</table>

二标段施工日报

中国建筑 项目管理表格										
作业面\项目每日情况报告表							表格编号			
							ZJSJ-XMBD-005 CSCEC-PM-1101			
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程二标段									
本表顺序号	时 间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：002	2021 年 9 月 5 日			√						
作业计划编号		天气	非常晴朗☐ 晴朗☐多云☐ 雨☑ 雪☐ 冰冻☐							
施工部位	1#-5#宿舍楼；食堂；指挥部；体育馆；师生活动中心	温度	≤0 度 0 度～10 度 10 度～21 度☑ 21 度～30 度 ≥30 度							
		风力	静风☐ 中等☑ 大风☐ 台风☐							
		湿度	干燥☐ 中等☐ 湿润☑							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	28/10	/	方案编制、现场施工管理
三局智能	2	/	BIM 建模
天津欣蕊	2/0	0/0	/
三局二安	8/0	126/16	师生活动中心配管风管水管安装、宿舍楼、食堂二次配管风管水管安装施工
梁平荣安	11/2	32/0	模板支设、拆除、材料堆码，钢筋清理、绑扎；砼浇筑，清理现场
三局一公司钢构	4/0	26/5	体育馆钢结构屋面桁架焊接、吊装
北京东方雨虹防水工程有限公司	1/0	8/0	吊篮安装
山东海灏装饰设计有限公司	5/0	28/0	宿舍楼副框加工
长沙广大	4/0	10/0	食堂测量放线、钢附框安装
兴华鑫宇	5/0	130/29	二次结构墙体砌筑，构造柱砼浇筑，墙面抹灰
天津津宝福	5/0	135/28	二次结构墙体砌筑，构造柱砼浇筑，墙面抹灰
施工人员合计		486/78	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	1

	中国建筑　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号	ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101

塔吊	XGT7020	良好	1
物料提升机	SC100/100	良好	6
电梯	SC200/200	良好	3
汽车吊	150t	良好	2
挖掘机	330 型	良好	0
	200 型	良好	1
	90 型	良好	0
推土机		良好	0
自卸汽车	20m³	良好	1

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注

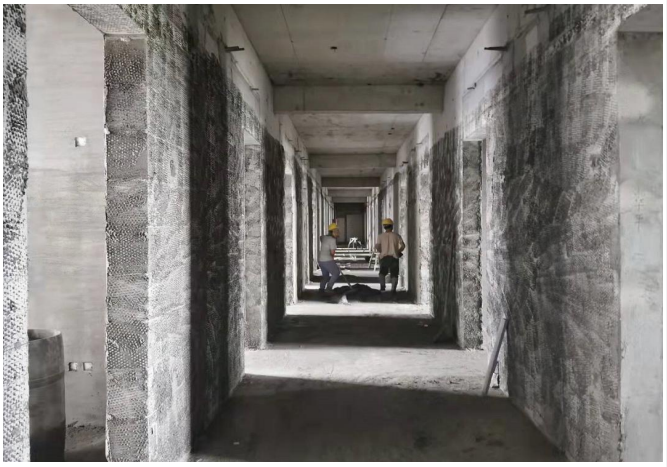
五、施工完成情况	体育馆	**本日施工内容：**首层墙体砌筑，构造柱浇筑，二层打眼、植筋，墙体砌筑，三层备料，变电室墙体模板拆除，钢结构桁架拼装、立柱吊装。机电安装楼梯间疏通及划线定位。墙体二次配管。
		整体完成情况：二次结构施工完成 37%；钢结构完成 75%；机电安装完成 4%。
	师生活动中心	**本日施工内容：**主楼楼内垃圾清理，墙面拉毛、挂网，室内墙面抹灰，裙房 A 管沟模板拆除清理，机电安装三层公区明配管，四层风管安装。二层样板施工
		整体完成情况：主体结构完成 98%；主楼二次结构完成 99%；主楼初装修完成 31%；机电安装完成 26%
	学生食堂	**本日施工内容：**首层墙体砌筑收尾，能源站墙体砌筑，能源站设备基础支模，幕墙测量放线，机电安装风管加工，楼梯间疏通划线定位，风管加工。
		整体完成情况：食堂二次结构收尾，能源站二次结构完成 69%；机电安装完成 8%
	1#学生宿舍	**本日施工内容：**1#楼 A 段屋面砌筑，五层抹灰；B 段屋面砌筑，五层拉毛抹灰；门窗副框安装，1A 六层机电安装宿舍内开槽及二次配管， 配电箱安装。

	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101

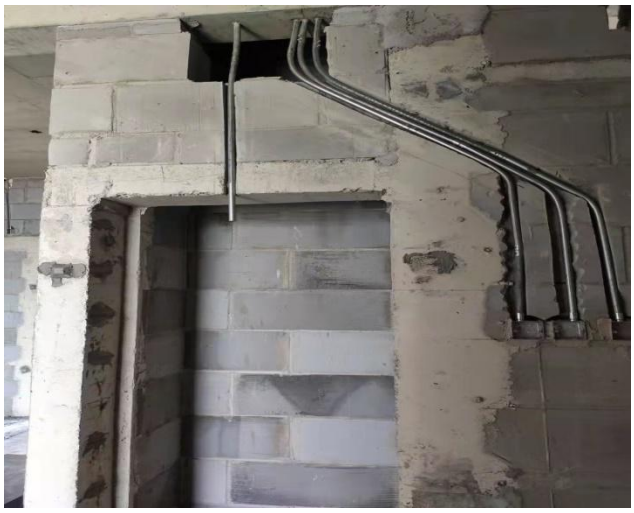
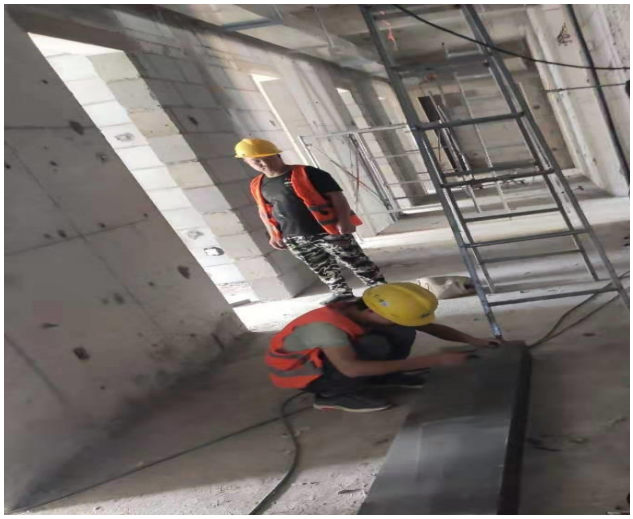
		整体完成情况：二次结构完成 97%；初装修完成 46%；机电安装完成 23%.
	2#学生宿舍	**本日施工内容**：五层拉毛抹灰，门窗副框安装，机电安装六层电井内开槽，宿舍和公区二次配管。
		整体完成情况：二次结构完成 98%；初装修完成 52%；机电安装完成 23%
	3#学生宿舍	**本日施工内容**：九层构造柱模板支设，砼浇筑，屋面墙体砌筑；三层拉毛抹灰，二层拉毛；门窗副框安装；机电安装二层排堵穿线，四层配管及固定箱和线盒。
		整体完成情况：二次结构完成 95%；初装修完成 7%；机电安装完成 13%
	4#学生宿舍	**本日施工内容**：五层抹灰，六层拉毛；屋面层墙体砌筑，砼浇筑，门窗副框安装，机电安装七层卫生间开槽及二次配管，八层立管放线。
		整体完成情况：二次结构完成 95%；初装修完成 21%；机电安装完成 14%
	5#学生宿舍	**本日施工内容**：屋面墙体砌筑，九层构造柱、窗台支模砼浇筑；4 层抹灰，5 层抹灰，6 层拉毛；门窗副框安装，机电安装 5 层桥架安装，6 层宿舍及公区开槽、二次配管。
		整体完成情况：二次结构完成 97%；初装修完成 31%；机电安装完成 19%
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、对生活区进行检查；2、对现场临时用电进行检查；3、对整个施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改；	
八、技术质量管理情况	1、对体育馆、食堂及宿舍楼墙体砌筑进行检查；2、对师生活动中心及宿舍楼墙体抹灰进行检查。	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项		
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：**	
抄送	1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□	

制，项目生产经理亲自填报整个项目部每日情况报告。报告包括的时间为当天上班时间到次日上班时间,提交报告的时间不迟于次日上午的 12 点

现场施工影像

	
首层墙体砌筑，构造柱浇筑，二层打眼、植筋，墙体砌筑，三层备料，变电室墙体模板拆除，钢结构桁架拼装、立柱吊装。机电安装楼梯间疏通及划线定位。墙体二次配管。	主楼楼内垃圾清理，墙面拉毛、挂网，室内墙面抹灰，裙房 A 管沟模板拆除清理
	
学生食堂首层墙体砌筑收尾，能源站墙体砌筑，能源站设备基础支模，幕墙测量放线	1#楼 A 段屋面砌筑，五层抹灰；B 段屋面砌筑，五层拉毛抹灰；门窗副框安装
	
2#楼五层拉毛抹灰，门窗副框安装	3#楼九层构造柱模板支设，砼浇筑，屋面墙体砌筑；

	三层拉毛抹灰，二层拉毛；门窗副框安装
	
4#楼五层抹灰，六层拉毛；屋面层墙体砌筑，砼浇筑，门窗副框安装	5#楼屋面墙体砌筑，九层构造柱、窗台支模砼浇筑；4层抹灰，5层抹灰，6层拉毛；门窗副框安装
	
师生活动中心机电安装三层公区明配管，四层风管安装。	食堂楼梯间疏通划线定位，风管加工
	

1#楼 1A 六层机电安装开槽及二次配管，宿舍配电箱安装。	2#楼机电安装六层电井内开槽，宿舍和公区二次配管。
	
3#楼机电安装二层排堵穿线，四层配管及固定箱和线盒。	4#楼机电安装七层卫生间开槽及二次配管，八层立管处放线。
	
5#楼机电安装五层桥架安装，六层宿舍及公区开槽、二次配管。	

中铁五局室外项目施工日报

中国中铁	中国中铁　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程室外施工	

中国中铁	中国中铁　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001

本表顺序号	时　间	星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：021	2021 年 9 月 5 日		√						

作业计划编号		天气	非常晴朗☐ 晴朗☐ 多云☐ 雨☑ 雪☐ 冰冻☐
施工部位	新校区师生活动中心南侧临建设施	温度	≤0 度☐ 0 度～10 度☐ 10 度～21 度☐ 21 度～30 度☑ ≥30 度☐
		风力	静风☑ 中等☐ 大风☐ 台风☐
		湿度	干燥☐ 中等☑ 湿润☐

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数	作业工人数	主要工作内容
中铁五局	2		熟悉图纸
施工人员合计			

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
/			

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
/					

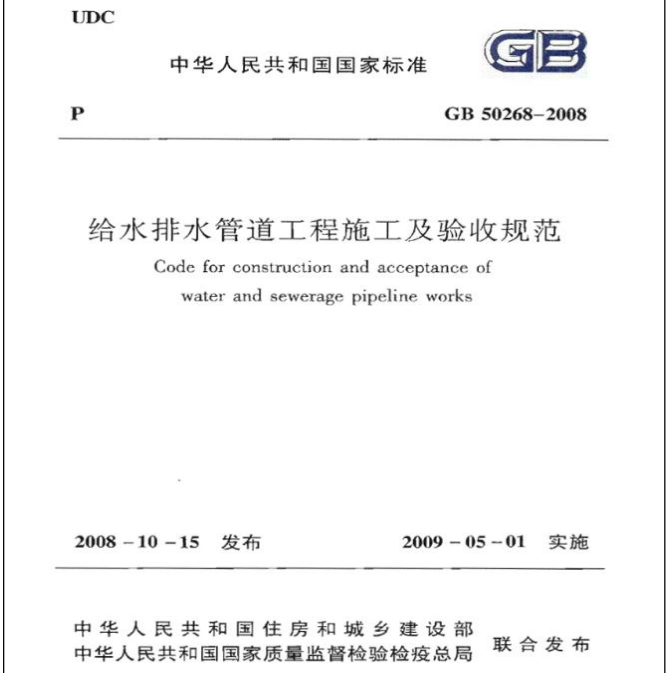
四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				

五、施工完成情况	项目部	**本日施工内容：**本日下雨，学习研究图纸图集
		整体完成情况：对于图纸上提到的图集及相关规范进行学习
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、服从总包单位安全及疫情防控管理。	
八、技术质量管理情况	1、图纸技术人员熟悉图纸，审图，学习相关图集及规范	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	/	

中国中铁	中国中铁　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：**	
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☑；5、项目生产经理（项目总工）☑；6、项目工程部☐；7、项目资料室☐	

现场施工影像



UDC

中华人民共和国国家标准　GB

P　GB 50268-2008

给水排水管道工程施工及验收规范

Code for construction and acceptance of water and sewerage pipeline works

2008－10－15　发布　2009－05－01　实施

中华人民共和国住房和城乡建设部
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局　联合发布





室外给水管道附属构筑物

批准部门　中华人民共和国建设部　批准文号　建质[2005]14号
主编单位　中国建筑标准设计研究院　北京市自来水设计公司　统一编号　GJBT-805
实行日期　二〇〇五年三月一日　图集号　05S502

主编单位负责人　王汝艳　杨健
主编单位技术负责人　丁勇　李波
技术审定人　贾莽　朱波
设计负责人　张先石　王汝艳

目　录　索　引

砖砌圆形立式闸阀井 15~25
砖砌圆形立式蝶阀井 26~34
砖砌圆形卧式蝶阀井 35~41
砖砌水表井 42~53
砖砌圆形排气阀井 54~59
砖砌排泥阀(湿)井 60~67
钢筋混凝土矩形立式闸阀井 68~88
钢筋混凝土矩形立式蝶阀井 89~111
钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井 112~131
钢筋混凝土矩形水表井 132~163
钢筋混凝土矩形排气阀井 164~180

目　录

图　名　页

目录(一)~(九) 1~9
总说明(一)~(五) 10~14
砖砌圆形立式闸阀井
阀门组合节点图 15
地面操作砖砌圆形立式闸阀井 16
预制盖板YB-Ⅰ-1~3配筋图 17

目　录　(一)　图集号　05S502
审核 韩炎超　校对 曾令超　设计 王龙生　页　1

图纸上提到的图集及相关规范进行学习。

江森自控智慧校园建设弱电专项施工日报

Johnson Controls	**北京江森自控有限公司　项目管理表格**									
	作业面\项目每日情况报告表									表格编号 JCI-CN23/21:1096 BJJSGCB-PM-2021002
项目名称	中国民航大学新校区智慧校园建设弱电专项施工									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：020	2021 年 9 月 5 日			√						
作业计划编号		天气	非常晴朗☐　晴朗☐　多云☐　雨☑　雪☐　霾☐							
施工部位	全校区	温度	≤0 度☐　0 度～10 度☐　10 度～21 度☐ 21 度～30 度☑　≥30 度☐							
		风力	静风☑　中等☐　大风☐　台风☐							
		湿度	干燥☐　中等☐　湿润☑							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
北京江森自控有限公司	5	5	现场管理、专业设计
施工	2	2	弱电施工
合计	7	7	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
/			
/			
/	/	/	

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
/	/	/			


Johnson Controls	**北京江森自控有限公司　项目管理表格**	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 JCI-CN23/21:1096 BJJSGCB-PM-2021002

四、来访人员情况

时间	姓名	单位	工作目的	备注

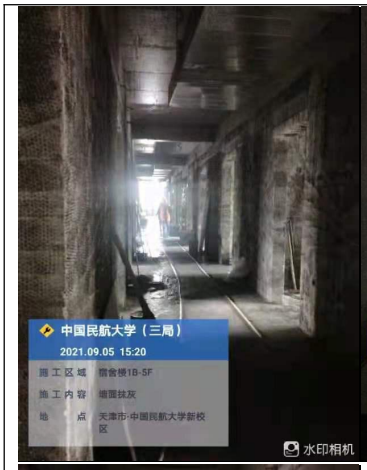
五、进度完成情况	宿舍楼	本日施工内容：现场核查
		总体完成情况：1#宿舍楼 5 层现场核查完毕，1#宿舍楼总体完成 50%。 2#宿舍 B 楼 6 层核查完成，2#宿舍 B 楼总体完成 50%。4#宿舍楼 5 层核查完成，4#宿舍楼总体完成 22%。5#宿舍楼 4 层核查完成，5#宿舍楼总体完成 11%。
六、业主监理指令		
七、安全管理情况	1、建设方代表□；2、工程监理□；3、项目经理□；4、项目商务项目□； 5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□	
八、技术质量管理	图纸审核	
九、过程关键文件		
十、本日重大事项		
十一、明日施工计划		
十二、工作小结		
抄送		

作业影像





图纸审核









图纸现场核对

恒益建安能源专项施工日报

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告表						表格编号			
							HYJA-MHDX-NYGC-001			
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程能源专项工程									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：0014	2021 年 9 月 5 日			√						
作业计划编号		天气	非常晴朗☐ 晴朗☐ 多云☐ 雨☑ 雪☐ 冰冻☐							
施工部位	新校区师生活动中心南侧临建设施	温度	≤0 度☐ 0 度～10 度☐ 10 度～21 度☐ 21 度～30 度☑ ≥30 度☐							
		风力	静风☑ 中等☐ 大风☐ 台风☐							
		湿	干燥☐ 中等☐ 湿润☐							

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 HYJA-MHDX-NYGC-001

		度	

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数	作业工人数	主要工作内容
恒益建安	1	现场安排 3 人	查看能源站及食堂冷却塔基础制作情况
恒益建安	3	现场安排 3 人	中深层井场设备基础抽水
施工人员合计		6 人	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
挖掘机	200	良好	1

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
/					

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				

五、施工完成情况	办公区、能源站	**本日施工内容：**现场查看食堂冷却塔及能源站内基础制作情况， **整体完成情况：**现场查看冷却塔基础制作情况 5%
	中深层井场	**本日施工内容：**中深层井场设备基础底座抽水 **整体完成情况：**中深层井场设备基础底座抽水 90%
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、对办公区进行安全巡视大检查。	
八、技术质量管理情况	1、中深层井场平整，对作业台班挖掘机司机进行安全教育警示，严禁作业地下标识电缆范围内的区域。	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	/	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：**	

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 HYJA-MHDX-NYGC-001
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☐；5、项目生产经理（项目总工）☐；6、项目工程部☐；7、项目资料室☐	

现场施工影像	
	
中深层井场平整；查看食堂冷却塔基础及能源站内基础制作，中深层井场设备基础底座抽水	
