建设单位：中国民航大学宁河校区

施工单位：中国建筑第八工程有限公司（一标段）

中国建筑第三工程有限公司（二标段）

监理单位：全咨

日期：2021 年 6 月 25 日 星期五

天气：雨，风力中等

【目录】

一. 工地疫情防护情况

二. 现场人员设备情况

三. 材料物资进场情况

四. 工程进度情况

五. 现场作业影像

一、疫情防控情况

按本项目疫情防控工作方案和应急预案抓好工地常态化疫情防控工作，防疫物资储备充足，无疫情发生。

二、现场人员设备情况

中建八局（一标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建八局	40	40	现场管理、方案编制
天宇信达	5	180/16	图书馆一次结构
肥城环宇	2	14	机电安装
北京慧欣	2	23	机电安装
永达保信	1	16	文明施工
天津金拓	1	1	降水运行
天津科顺	1	1	防水施工
唐山彬达	7	130/13	教学组团一次结构
东方城	4	8	钢结构施工
福建聚利	3	24	幕墙安装
鼎立安	1	12	外架搭设
天宇信达(二构)	7	90	二次结构施工
天津俊凯	2	9	机电通风
合计	76	547	
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
货用施工升降机	SC120/120	良好	2
叉车	3 台	良好	4
洒水车	1 辆	良好	1
雾炮车	2 台	良好	2
钢筋切断机	40 型	良好	5
钢筋弯曲机	50 型	良好	5
钢筋调直机	50 型	良好	2
钢筋箍筋弯曲机	25 型	良好	3
塔吊	XGT7527	良好	2
塔吊	TC7013-10D	良好	3
挖机	200 型	良好	1
十轮		良好	1

中建三局（二标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	27/10	/	方案编制、现场施工管理
天津欣蕊	2/0	32/0	指挥部室外广场地面铺装，现场回填
三局二安	6/0	68/12	师生活动中心、学生食堂、宿舍楼、体育馆水电预留预埋，指挥部水电安装
梁平荣安	20/2	210/48	模板支设、拆除、满堂架搭设，钢筋清理、绑扎；砼浇筑，清理现场
三局一公司钢构	4/0	6/0	体育馆胎架支撑制作、体育馆钢支座焊接
北京东方雨虹防水工程有限公司	1/0	0/0	
山东海灏装饰设计有限公司	5/1	32/10	指挥部室内铝板收口，室内保洁，墙面乳胶漆修补
兴华鑫宇	3/0	117/18	二次结构放线、植筋、反坎支模，墙体砌筑
天津津宝福	3/0	131/16	二次结构放线、植筋、反坎支模，墙体砌筑
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	1
塔吊	TC6012	良好	2
	TC7013	良好	2
	XGT6513	良好	1
物料提升机	SC100/100	良好	5
电梯	SC200/200	良好	3
汽车吊	25t	良好	2
挖掘机	330 型	良好	0
	200 型	良好	0
	90 型	良好	1
推土机		良好	1
自卸汽车	20m³	良好	0

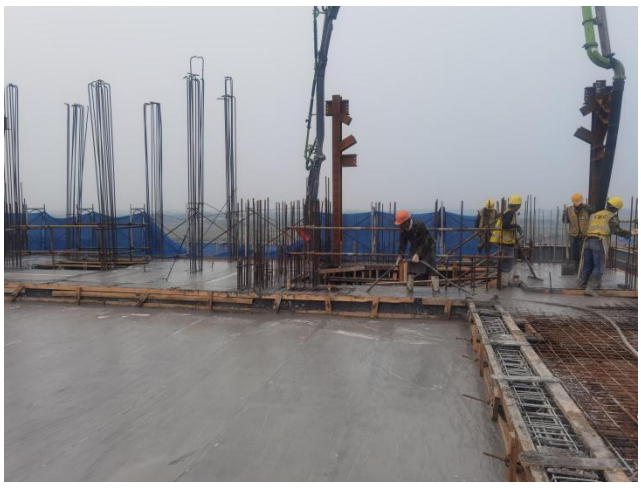
三、物资进场情况

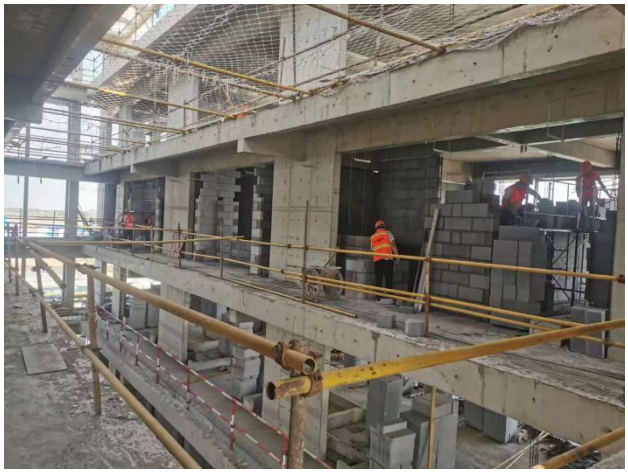
中建八局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
中建三局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
加气块		106.1 方	合格		

四、工程进度情况

中建八局 （一标段）	①图书馆地库二次结构放线完成；地下室反坎支模 80%，打灰 50%，砌筑完成 40%；首层二构放线 20%，植筋 10%，阻尼墙安装完成，二层架体拆除 90%；D1、D4 区三夹层混凝土浇筑完成；D2 区三夹层架体搭设 85%，墙柱绑扎完成，梁筋绑扎 60%;D3 区三夹层架体搭设 90%，墙柱绑扎 90%，梁筋绑扎 60%；钢构 5 节柱安装完成，钢梁完成 70%，汽车坡道防水完成。 ②实验楼二层砌筑完成 70%，铝板龙骨焊接完成 100%，龙骨满焊完成 10%，采光井骨架制作 25% ③公共教学出屋面层一段浇筑完成 100%，二层二次结构构造柱浇筑完成 95%；三层砌筑完成 65%%；四层材料清理完成 85%， ④飞乘大楼出屋面层 4 段浇筑完成 50%；二层 1、2 段砌筑完成 100%；三层清理完成 95%；四层物资整理完成 75%；
中建三局 （二标段）	1、体育馆一区二区三层框架梁拆模完成 80%，体育馆四区三层花架梁模板支设完成 95%，框架柱钢筋绑扎完成，钢结构预埋件安装；师生活动中心裙房 A 管沟垫层浇筑完成，裙楼 B 首层圆柱钢筋绑扎完成，圆柱砼浇筑完成 30%，主楼二层墙体砌筑完成，三层备料，四层墙体砌筑完成 80%，五层反坎砼浇筑完成； 2、指挥部室内铝板收口完成 75%，室内保洁完成 70%，墙面乳胶漆修补完成 90%，室外广场地面铺装完成，走廊波罗格铺装完成 50%； 3、1#A 段 2 层砌筑完成 95%，4 层砌筑完成 95%；B 段首层砌筑完成 20%，2 层砌筑完成，构造柱浇筑完成，4 层砌筑完成 95%；2 号楼 2 层砌筑完成 95%，构造柱浇筑完成 95%，4 层砌筑完成 95%，5 层砌筑 55%，6 层备料。3#楼机房层顶板钢筋验收合格，浇筑混凝土。3#楼 3 层砌筑完成 50%，5 层防水反坎浇筑完成；4#楼机房花架梁顶板浇筑完成；4#楼首层砌筑完成 95%，构造柱浇筑完成 90%；3 层砌筑完成 75%，4 层砌筑完成 40%，5 层反坎浇筑完成。5 号楼机房层浇筑完成。3 层砌筑完成，构造柱浇筑完成 95%。4 层砌筑完成 90%，5 层砌筑完成 15%，6 层防水反坎浇筑完成。 4、食堂二层二次结构砌筑完成 80%，三层反坎砼浇筑完成，构造柱钢筋绑扎完成；

五、现场作业影像

<table>
<tr><td colspan="2">中建八局（一标段）</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆 D1、D4 区三夹层钢筋验收</td><td>公共教学楼首层回填</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>图书馆地下室砌筑</td><td>教学组团回填灰土搅拌</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>飞行乘务大楼二层砌筑</td><td>图书馆 D1、D4 区三夹层混凝土浇筑</td></tr>
</table>

中建三局（二标段）	
	
体育馆一区二区三层框架梁拆模完成 80%	体育馆四区三层花架梁模板支设完成 95%，框架柱钢筋绑扎完成，钢结构预埋件安装
	
师生活动中心裙房 A 管沟垫层浇筑完成，裙楼 B 首层圆柱钢筋绑扎完成，圆柱砼浇筑完成 30%，主楼二层墙体砌筑完成，三层备料，四层墙体砌筑完成 80%，五层反坎砼浇筑完成	食堂二层二次结构砌筑完成 80%，三层反坎砼浇筑完成，构造柱钢筋绑扎完成
	
室内二遍保洁完成 70%，室外广场地面铺装完成，走	1#A 段 2 层砌筑完成 95%，4 层砌筑完成 95%；B 段首

廊波罗格铺装完成 80%	层砌筑完成 20%，2 层砌筑完成，构造柱浇筑完成，4 层砌筑完成 95%
	
2 号楼 2 层砌筑完成 95%，构造柱浇筑完成 95%，4 层砌筑完成 95%，5 层砌筑 55%，6 层备料	3#楼机房层顶板钢筋验收合格，浇筑混凝土。3#楼 3 层砌筑完成 50%，5 层防水反坎浇筑完成
	
4#楼机房花架梁顶板浇筑完成；4#楼首层砌筑完成 95%，构造柱浇筑完成 90%；3 层砌筑完成 75%，4 层砌筑完成 40%，5 层反坎浇筑完成	5 号楼机房层浇筑完成。3 层砌筑完成，构造柱浇筑完成 95%。4 层砌筑完成 90%，5 层砌筑完成 15%，6 层防水反坎浇筑完成
