**中国民航大学宁河校区 8 月 15 日工程日报**

**一、施工概要**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 图书馆 | **本日施工内容:**二次结构施工；钢结构屋面钢梁吊装； 机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理 |
| | | **总体完成情况**:图书馆二次结构施工完成 70%；屋面核心筒浇筑完成 100%；钢结构安装完成 93%；机电安装 47%； |
| 2 | 机场学院教学实验楼 | **本日施工内容:**二次结构施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理 |
| | | **总体完成情况：**二次结构施工完成 97%；机电安装 42%；幕墙安装完成 42%； |
| 3 | 公共教学楼 | **本日施工内容**：二次结构施工；幕墙施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理 |
| | | **总体完成情况：**二次结构施工完成 97%，机电安装完成 51%；幕墙安装完成 41% |
| 4 | 飞行乘务大楼及模拟舱楼 | **本日施工内容**:二次结构施工;屋面基层清理;屋面材料倒运;屋面挤塑板铺设；幕墙龙骨施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理 |
| | | **总体完成情况**：二次结构施工完成 81%；机电安装完成 35%；幕墙安装完成 44%； |
| 5 | 体育馆 | **本日施工内容：**首层房心回填平整，二层打眼、植筋，墙体砌筑，游泳馆高支模架体拆除材料归码，钢结构桁架拼装、立柱吊装。体育馆首层卫生间排水支管，埋地电缆装弯头。 |
| | | **整体完成情况：**体育馆游泳馆高支模顶板梁模板拆除完成 92%；二次结构施工完成 15%；钢结构屋面桁架完成 30%；机电安装完成 4%。 |
| 6 | 师生活动中心 | **本日施工内容：**主楼屋面墙体砌筑，楼内垃圾清理，墙面拉毛，管道间抹灰，裙房 A 管沟支设模板、裙房 B 顶板梁钢筋绑扎，机电安装三层卫生间给水安装，强电井桥架碰头，二层样板间吊顶内配管，新风管安装，四层、五层桥架安装。 |
| | | **整体完成情况：**主体结构完成 96%，主楼二次结构收尾，主楼抹灰完成 2%；机电安装完成 19% |
| 7 | 学生食堂 | **本日施工内容：**首层、三层墙体砌筑收尾，能源站墙体砌筑，机电安装各部位风管加工。 |
| | | **整体完成情况：**食堂二次结构完成 98%，机电安装完成 8% |
| 8 | 1#学生宿舍 | **本日施工内容：**1# 楼 A 段 4-6 层砌筑收尾，六层构造柱砼浇筑，二层抹灰、三层抹灰；B 段五层构造柱，屋面反坎浇筑砼；二层、三层拉毛抹灰；A 段四层机电安装卫生间二次配管，B 段三层宿舍二次配管，卫生间水管配管。 |
| | | **整体完成情况：**二次结构完成 95%；机电安装完成 16%. |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 2#学生宿舍 | **本日施工内容**：六层墙体砌筑收尾，屋面墙体砌筑；三层拉毛，四层抹灰，2#楼三层机电安装宿舍内二次配管，卫生间竖管安装。四层桥架安装，六层开槽。 |
| | | **整体完成情况**：二次结构完成 95%，四层抹灰完成 90%；机电安装完成 16% |
| 10 | 3#学生宿舍 | **本日施工内容**：七层、八层、九层墙体砌筑，六层、七层构造柱模板支设，砼浇筑，屋面墙体砌筑；三层机电安装二次配管，卫生间水管竖管安装，雨水管施工，桥架支架安装。 |
| | | **整体完成情况**：二次结构完成 83%；机电安装完成 13% |
| 11 | 4#学生宿舍 | **本日施工内容**：三层拉毛抹灰，九层墙体砌筑，八层构造柱模板支设，砼浇筑，4-6 层砌筑收尾，机电安装一层风管安装，四层二次配管，三四层桥架安装，雨水管九层安装。 |
| | | **整体完成情况**：二次结构完成 82%；机电安装完成 11% |
| 12 | 5#学生宿舍 | **本日施工内容**：九层、屋面墙体砌筑，八层构造柱、窗台支模砼浇筑；机电安装三层卫生间配水管施工，桥架支架安装，宿舍二次配管，四层宿舍内二次配管，桥架支架安装，雨水管九层安装。 |
| | | **整体完成情况**：二次结构完成 88%；机电安装完成 15% |
| 13 | 35Kv 变电站 | 未施工 |
| 14 | 垃圾站 | 未施工 |
| 15 | 人员情况 | 八局今日劳动力人数 436 人。三局今日劳动力人数 535 人。 |

# 二、监理日报

1.现场巡视。检查图书馆砌筑，钢结构屋面钢梁吊装，消防管道主管道 A6-A7 安装，地下室通风管道安装，空调水主管道安装，现场安全文明清理情况，施工正常。

2.现场巡视。检查实验楼砌筑，污水管安装；雨水管安装；风管安装；桥架安装；消防水管安装，现场安全文明清理情况，施工正常。

3.现场巡视。检查公共教学楼砌筑，通风管道安装；桥架安装；消防水管安装；雨水管安装；污水管安装，现场安全文明清理情况，施工正常。

4.现场巡视。检查飞乘大楼砌筑，水暖立管安装、桥架安装、通风管道安装；现场文明施工清理情况，施工正常。

5.监理部对体育馆对钢结构吊装焊接施工巡视检查。对首层房心回填土平整巡视检查。对二层二次结构构造柱钢筋绑扎及反坎模板支设巡视检查。

6.对师生活动中心主楼二次结构施工及水电风管安装施工巡视检查，裙房 B 屋面顶板钢筋绑扎巡视检查。裙房 A 电缆沟模板支设。

7.对学生食堂水电风管安装施工巡视检查，符合设计要求。

8.对学生宿舍各单体及水电风管安装施工巡视检查。

9.监理部同业主方、施工单位方对现场消防管材生产厂家进行考察。

# 三、监理明日工作安排

| 标段划分 | 单体名称 | 监理人员 | 施工内容 | 监理工作时间、内容及路线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一标段<br>刘刚<br>（15162265570） | 图书馆 | 刘刚<br>（18082566239） | 钢筋绑扎、模板支设、架体搭设 | 对图书馆施工进行巡视检查 | |
| | | 张春博<br>（13027722180） | | 对图书馆施工进行巡视检查，旁站砼浇筑施工 | |
| | | 刘浩<br>（13400385767） | | 对图书馆施工进行巡视检查，旁站砼浇筑施工 | |
| | 教学组团 | 马瑞峰<br>（15614235758） | 材料整理、钢筋绑扎、模板支设、二次结构墙体砌筑 | 对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查，旁站砼浇筑。 | |
| | | 任海博<br>（18082566239） | | 对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查。 | |
| | | 乔天航<br>(18547607857) | | 对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查，旁站砼浇筑。 | |
| 二标段<br>林利民<br>（18640512507） | 体育馆 | 李晓峰<br>（15102669182）<br>党泽南 | 钢结构施工、二次结构施工 | 对现场施工进行巡视检查 | |
| | 指挥部 | | 问题整改、室内清洁 | 对现场施工巡视检查 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 师生活动中心 | | 二次结构施工、水电管安装<br>裙房梁钢筋绑扎 | 对现场施工巡视检查 | |
| | 3#、4#、5#学生宿舍 | 于烨<br>（13081821380）<br>李会彬<br>（15512769592） | 二次结构施工、水电管安装 | 对现场施工巡视检查 | |
| | 1#、2#学生宿舍、食堂 | 吕非凡<br>（17532527058）<br>李宝华<br>（13673126287）<br>马一博<br>（17692498058） | 二次结构施工、水电管安装 | 对现场钢筋绑扎巡视检查，检查模板支设情况 | |
| | 垃圾房 | | 未施工 | 未施工 | |
| | 35kv 变电站 | | 未施工 | 未施工 | |

**四、施工单位日报**

**一标段施工日报**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **中国建筑　项目管理表格** | | | | | | | | | |
| | 作业面\项目每日情况报告表 | | | | | | | | 表格编号 | |
| | | | | | | | | | CSCEC8B-PM-B10401<br>CSCEC-PM-1101 | |
| 项目名称 | 中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段 | | | | | | | | | |
| 本表顺序号 | 时　间 | | 星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| NO：115 | 2021 年 8 月 15 日 | | | √ | | | | | | |
| 作业计划编号 | | 天气 | 非常晴朗☑ 晴朗☐　多云☐　雨 ☐雪☐ 霾☐ | | | | | | | |
| 施工部位 | 图书馆<br>机场学院教学实验楼<br>公共教学楼<br>飞行乘务大楼及模拟舱楼 | 温度 | ≤0 度☐　0 度～10 度☐　10 度～21 度☐<br>21 度～30 度☑　≥30 度☐ | | | | | | | |
| | | 风力 | 静风☑　中等☐　大风☐　台风☐ | | | | | | | |
| | | 湿度 | 干燥☐　中等■　湿润☐ | | | | | | | |

一、现场人员情况

| 单位名称 | 管理人员数（日/夜） | 作业工人数（日/夜） | 主要工作内容 |
|---|---|---|---|
| 中建八局 | 40 | 40 | 现场管理、方案编制 |
| 天宇信达 | 3 | 65/6 | 图书馆一次结构 |
| 肥城环宇 | 2 | 15 | 机电安装 |
| 北京慧欣 | 2 | 35 | 机电安装 |
| 永达保信 | 2 | 20 | 文明施工 |
| 天津金拓 | 1 | 1 | 降水运行 |
| 天津科顺 | 1 | 3 | 防水施工 |
| 唐山彬达 | 2 | 8/2 | 教学组团一次结构 |
| 东方城 | 4 | 6 | 钢结构施工 |
| 福建聚利 | 3 | 56 | 幕墙安装 |
| 鼎立安 | 1 | 12 | 外架搭设 |
| 天宇信达（二构） | 7 | 130 | 二次结构施工 |
| 天津俊凯 | 2 | 23 | 机电通风 |
| 宏坤煜业 | 3 | 36/6 | 机电通风 |
| 恒福消防 | 1 | 12 | 机电消防 |
| 堡泰消防 | 1 | 6 | 机电消防 |
| 合计 | 75 | 436 | |

二、现场机械设备情况

| 设备名称 | 型号 | 状态 | 工作台班 |
|---|---|---|---|
| 货用施工升降机 | SC120/120 | 良好 | 6 |

| | 中国建筑　项目管理表格 | | |
|---|---|---|---|
| | 作业面\项目每日情况报告表 | | 表格编号<br>CSCEC8B-PM-B10401<br>CSCEC-PM-1101 |
| 物料提升机 | AC/200 | 良好 | 1 |
| 叉车 | 3 台 | 良好 | 4 |
| 洒水车 | 1 辆 | 良好 | 1 |
| 雾炮车 | 2 台 | 良好 | 2 |
| 钢筋切断机 | 40 型 | 良好 | 5 |
| 钢筋弯曲机 | 50 型 | 良好 | 5 |
| 钢筋调直机 | 50 型 | 良好 | 2 |
| 钢筋箍筋弯曲机 | 25 型 | 良好 | 3 |
| 塔吊 | XGT7527 | 良好 | 2 |
| 塔吊 | TC7013-10D | 良好 | 3 |
| 挖机 | 60 型 | 良好 | 1 |
| 十轮 | / | / | 1 |

三、主要物资（设备）进场情况

| 物资名称 | 规格 | 数量 | 检验情况 | 试验情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挤塑板 | / | 40m³ | √ | √ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

四、来访人员情况

| 时间 | 姓名 | 单位 | 工作目的 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 五、进度完成情况 | 图书馆 | 本日施工内容:二次结构施工;钢结构屋面钢梁吊装；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理 |
| | | 总体完成情况:图书馆二次结构施工完成 70%；屋面核心筒浇筑完成 100%；钢结构安装完成 93%；机电安装 47%； |
| | 机场学院教学实验楼 | 本日施工内容:二次结构施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理 |
| | | 总体完成情况：二次结构施工完成 97%；机电安装 42%；幕墙安装完成 42%； |
| | 公共教学楼 | 本日施工内容：二次结构施工；幕墙施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理 |
| | | 总体完成情况：二次结构施工完成 97%，机电安装完成 51%；幕墙安装完成 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 中国建筑　项目管理表格 | | |
| | 作业面\项目每日情况报告表 | 表格编号 | CSCEC8B-PM-B10401<br>CSCEC-PM-1101 |
| | | 41% | |
| | 飞行乘务大楼及模拟舱楼 | 本日施工内容:二次结构施工；屋面基层清理；屋面材料倒运；屋面挤塑板铺设；幕墙龙骨施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理 | |
| | | 总体完成情况：二次结构施工完成 81%；机电安装完成 35%；幕墙安装完成 44%； | |
| 六、业主监理指令 | | | |
| 七、安全管理情况 | 日常三间巡逻检查，裸土苫盖维护，安全隐患排查以及整改，雨后防汛现场排查 | | |
| 八、技术质量管理 | 对降水运行、防水清理、架体搭设、钢筋施工、外架，钢结构施工进行全过程质量监管，日常机械监测。 | | |
| 九、过程关键文件 | | | |
| 十、本日重大事项 | | | |
| 十一、工作小结 | **急需业主协调解决事宜：** | | |
| 抄送 | 1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□；<br>5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□ | | |

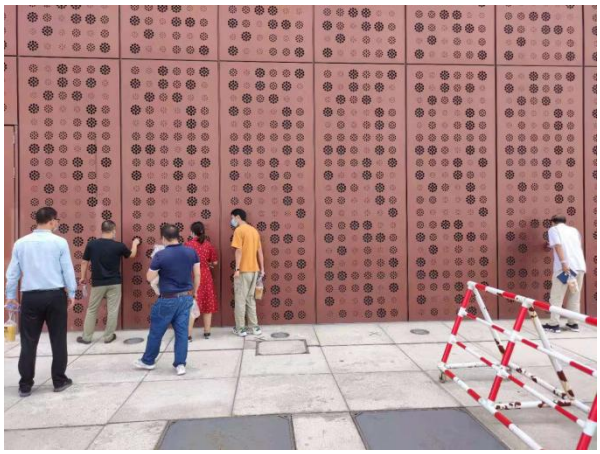
## 现场作业影像




阻尼器安装



图书馆圈梁施工

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>临时用电巡查</td><td>钢结构材料验收</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>幕墙厂家考察</td><td>三间巡查</td></tr>
<tr><td colspan="2">现场航拍图 8.11</td></tr>
</table>





图书馆



飞行乘务大楼及模拟舱



公共教学楼



机场学院教学实验楼

**二标段施工日报**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **中国建筑　项目管理表格** | | | | | | | | | |
| | 作业面\项目每日情况报告表 | | | | | | 表格编号 | | | |
| | | | | | | | ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101 | | | |
| 项目名称及编码 | 中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程二标段 | | | | | | | | | |
| 本表顺序号 | 时　间 | | 星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| NO：002 | 2021 年 8 月 15 日 | | | √ | | | | | | |
| 作业计划编号 | | 天气 | 非常晴朗☐ 晴朗☐多云☑ 雨☐ 雪☐ 冰冻☐ | | | | | | | |
| 施工部位 | 1#-5#宿舍楼；食堂；指挥部；体育馆；师生活动中心 | 温度 | ≤0 度☐ 0 度～10 度☐ 10 度～21 度☐ 21 度～30 度☑ ≥30 度☐ | | | | | | | |
| | | 风力 | 静风☐ 中等☑ 大风☐ 台风☐ | | | | | | | |
| | | 湿度 | 干燥☐ 中等☑ 湿润☐ | | | | | | | |

一、现场人员情况

| 单位名称 | 管理人员数（日/夜） | 作业工人数（日/夜） | 主要工作内容 |
|---|---|---|---|
| 中建三局 | 27/10 | / | 方案编制、现场施工管理 |
| 天津欣蕊 | 2/0 | 8/0 | 体育馆房心回填土平整 |
| 三局二安 | 9/0 | 102/15 | 师生活动中心配管风管水管安装、宿舍楼、食堂二次配管风管水管安装施工 |
| 梁平荣安 | 11/2 | 58/15 | 模板支设、拆除、材料堆码，钢筋清理、绑扎；砼浇筑，清理现场 |
| 三局一公司钢构 | 4/0 | 17/5 | 体育馆钢结构屋面桁架焊接、吊装 |
| 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 0/0 | 0/0 | / |
| 山东海灏装饰设计有限公司 | 5/1 | 1/0 | 指挥部质量缺陷整改 |
| 兴华鑫宇 | 3/0 | 136/25 | 二次结构墙体砌筑，构造柱砼浇筑，墙面抹灰 |
| 天津津宝福 | 3/0 | 133/23 | 二次结构墙体砌筑，构造柱砼浇筑，墙面抹灰 |
| 施工人员合计 | | 452/83 | |

二、现场机械设备情况

| 设备名称 | 型号 | 状态 | 工作台班 |
|---|---|---|---|
| 洒水车 | 12m³ | 良好 | 1 |
| 塔吊 | TC7013 | 良好 | 1 |
| | XGT7020 | 良好 | 1 |

| | 中国建筑　项目管理表格 | | |
|---|---|---|---|
| | 作业面\项目每日情况报告表 | 表格编号 | ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 物料提升机 | SC100/100 | 良好 | 6 |
| 电梯 | SC200/200 | 良好 | 3 |
| 汽车吊 | 50t | 良好 | 1 |
| 挖掘机 | 330 型 | 良好 | 0 |
| | 200 型 | 良好 | 1 |
| | 90 型 | 良好 | 1 |
| 推土机 | | 良好 | 0 |
| 自卸汽车 | 20m³ | 良好 | 0 |

三、主要物资（设备）进场情况

| 物资名称 | 规格 | 数量 | 检验情况 | 试验情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加气块 | | 142.2 方 | 合格 | | |
| | | | | | |

四、来访人员情况

| 时间 | 姓名 | 职位 | 工作目的 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

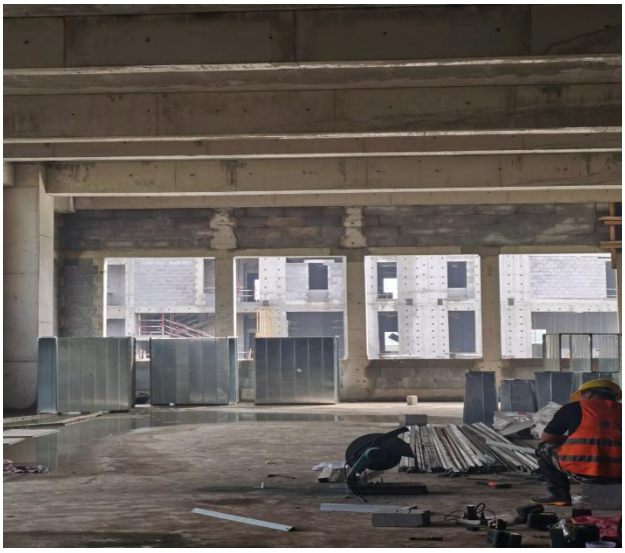
| | | |
|---|---|---|
| 五、施工完成情况 | 体育馆 | **本日施工内容：**首层房心回填平整，二层打眼、植筋，墙体砌筑，游泳馆高支模架体拆除材料归码，钢结构桁架拼装、立柱吊装。体育馆首层卫生间排水支管，埋地电缆装弯头。 |
| | | **整体完成情况：**体育馆游泳馆高支模顶板梁模板拆除完成 92%；二次结构施工完成 15%；钢结构屋面桁架完成 30%；机电安装完成 4%。 |
| | 师生活动中心 | **本日施工内容：**主楼屋面墙体砌筑，楼内垃圾清理，墙面拉毛，管道间抹灰，裙房 A 管沟支设模板、裙房 B 顶板梁钢筋绑扎，机电安装三层卫生间给水安装，强电井桥架碰头，二层样板间吊顶内配管，新风管安装，四层、五层桥架安装。 |
| | | **整体完成情况：**主体结构完成 96%，主楼二次结构收尾，主楼抹灰完成 2%；机电安装完成 19% |
| | 学生食堂 | **本日施工内容：**首层、三层墙体砌筑收尾，能源站墙体砌筑，机电安装各部位风管加工。 |
| | | **整体完成情况：**食堂二次结构完成 98%，机电安装完成 8% |
| | 1#学生宿舍 | **本日施工内容：**1# 楼 A 段 4-6 层砌筑收尾，六层构造柱砼浇筑，二层抹灰、三层抹灰；B 段五层构造柱，屋面反坎浇筑砼；二层、三层拉毛抹灰；A 段四层机电安装卫生间二次配管，B 段三层宿舍二次配管，卫生间水管配管。 |
| | | **整体完成情况：**二次结构完成 95%；机电安装完成 16%. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 中国建筑　项目管理表格 | | |
| | 作业面\项目每日情况报告表 | 表格编号 | ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101 |
| | 2#学生宿舍 | **本日施工内容：**六层墙体砌筑收尾，屋面墙体砌筑；三层拉毛，四层抹灰，2#楼三层机电安装宿舍内二次配管，卫生间竖管安装。四层桥架安装，六层开槽。 | |
| | | **整体完成情况：**二次结构完成 95%，四层抹灰完成 90%；机电安装完成 16% | |
| | 3#学生宿舍 | **本日施工内容：**七层、八层、九层墙体砌筑，六层、七层构造柱模板支设，砼浇筑，屋面墙体砌筑；三层机电安装二次配管，卫生间水管竖管安装，雨水管施工，桥架支架安装。 | |
| | | **整体完成情况：**二次结构完成 83%；机电安装完成 13% | |
| | 4#学生宿舍 | **本日施工内容：**三层拉毛抹灰，九层墙体砌筑，八层构造柱模板支设，砼浇筑，4-6 层砌筑收尾，机电安装一层风管安装，四层二次配管，三四层桥架安装，雨水管九层安装。 | |
| | | **整体完成情况：**二次结构完成 82%；机电安装完成 11% | |
| | 5#学生宿舍 | **本日施工内容：**九层、屋面墙体砌筑，八层构造柱、窗台支模砼浇筑；机电安装三层卫生间配水管施工，桥架支架安装，宿舍二次配管，四层宿舍内二次配管，桥架支架安装，雨水管九层安装。 | |
| | | **整体完成情况：**二次结构完成 88%；机电安装完成 15% | |
| 六、业主监理指令 | / | | |
| 七、安全管理情况 | 1、对生活区进行检查；2、对现场临时用电进行检查；3、对整个施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改； | | |
| 八、技术质量管理情况 | 1、对师生活动中心、食堂及宿舍楼墙体砌筑进行检查； | | |
| 九、施工过程中关键问题来往文件记录 | / | | |
| 十、本日重大事项 | 上午工人健康体检 | | |
| 十一、工作小结 | **急需业主协调解决事宜：** | | |
| 抄送 | 1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□ | | |

制，项目生产经理亲自填报整个项目部每日情况报告。报告包括的时间为当天上班时间到次日上班时间,提交报告的时间不迟于次日上午的 12 点

## 现场施工影像

| | |
|---|---|
|  |  |
| 首层房心回填平整，二层打眼、植筋，墙体砌筑，游泳馆高支模架体拆除材料归码，钢结构桁架拼装、立柱吊装 | 师生活动中心主楼屋面墙体砌筑，楼内垃圾清理，墙面拉毛，管道间抹灰，裙房 A 管沟支设模板、裙房 B 顶板梁钢筋绑扎 |
|  |  |
| 首层、三层墙体砌筑收尾，能源站墙体砌筑 | 1# 楼 A 段 4-6 层砌筑收尾，六层构造柱砼浇筑，二层抹灰、三层抹灰；B 段五层构造柱，屋面反坎浇筑砼；二层、三层拉毛抹灰； |
|  |  |
| 2#楼六层墙体砌筑收尾，屋面墙体砌筑；三层拉毛，四层抹灰 | 3#楼七层、八层、九层墙体砌筑，六层、七层构造柱模板支设，砼浇筑，屋面墙体砌筑 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| 4#楼三层拉毛抹灰，九层墙体砌筑，八层构造柱模板支设，砼浇筑，4-6 层砌筑收尾 | 5#楼四层至六层砌筑收尾，九层、屋面墙体砌筑，八层构造柱、窗台支模砼浇筑 |
|  |  |
| 师生活动中心机电安装三层卫生间给水安装，强电井桥架碰头，二层样板间吊顶内配管，新风管安装，四层、五层桥架安装 | 食堂机电安装风管、消防管加工 |
|  |  |

| | |
|---|---|
| 1#楼 B 段四层机电安装卫生间二次配管,B 段三层宿舍二次配管，卫生间水管配管 | 2#楼四层机电安装宿舍内二次配管,卫生间竖管安装，四层桥架安装，六层开槽 |
|  |  |
| 3#楼三层机电安装二次配管，卫生间水管竖管安装，雨水管施工，桥架支架安装 | 4#楼机电安装一层风管安装，四层二次配管，三四层桥架安装，雨水管九层安装 |
|  | |
| 5#楼机电安装三层卫生间配水管施工，桥架支架安装，宿舍二次配管，四层宿舍内二次配管，桥架支架安装，雨水管九层安装 | |
