建设单位：中国民航大学宁河校区

施工单位：中国建筑第八工程有限公司（一标段）

中国建筑第三工程有限公司（二标段）

监理单位：全咨

日期：2021 年 7 月 19 日 星期一

天气：多云，风力中等

【目录】

一. 工地疫情防护情况

二. 现场人员设备情况

三. 材料物资进场情况

四. 工程进度情况

五. 现场作业影像

一、疫情防控情况

按本项目疫情防控工作方案和应急预案抓好工地常态化疫情防控工作，防疫物资储备充足，无疫情发生。

二、现场人员设备情况

中建八局（一标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建八局	40	40	现场管理、方案编制
天宇信达	5	135/13	图书馆一次结构
肥城环宇	2	14	机电安装
北京慧欣	2	21	机电安装
永达保信	1	16	文明施工
天津金拓	1	1	降水运行
天津科顺	1	1	防水施工
唐山彬达	7	117/18	教学组团一次结构
东方城	4	13	钢结构施工
福建聚利	3	24	幕墙安装
鼎立安	1	12	外架搭设
天宇信达(二构)	7	110	二次结构施工
天津俊凯	2	9	机电通风
合计	76	512	
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
货用施工升降机	SC120/120	良好	2
叉车	3 台	良好	4
洒水车	1 辆	良好	1
雾炮车	2 台	良好	2
钢筋切断机	40 型	良好	5
钢筋弯曲机	50 型	良好	5
钢筋调直机	50 型	良好	2
钢筋箍筋弯曲机	25 型	良好	3
塔吊	XGT7527	良好	2
塔吊	TC7013-10D	良好	3
挖机	200 型	良好	1
十轮		良好	1

中建三局（二标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	27/10	/	方案编制、现场施工管理
天津欣蕊	2/0	22/6	指挥部室外草皮养护，现场抽排水
三局二安	6/0	68/6	师生活动中心、学生食堂、宿舍楼、体育馆水电预留预埋，指挥部水电安装
梁平荣安	20/2	160/35	模板支设、拆除、满堂架搭设，钢筋清理、绑扎；砼浇筑，清理现场
三局一公司钢构	4/0	6/0	体育馆钢支座安装
北京东方雨虹防水工程有限公司	1/0	0/0	
山东海灏装饰设计有限公司	5/1	16/6	指挥部室外阳台安装龙骨，室内保洁，室内墙面踢脚线安装
兴华鑫宇	3/0	167/35	二次结构墙体砌筑，构造柱砼浇筑
天津津宝福	3/0	135/38	二次结构墙体砌筑，构造柱砼浇筑
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	2
塔吊	TC6012	良好	2
	TC7013	良好	2
	XGT6513	良好	1
物料提升机	SC100/100	良好	5
电梯	SC200/200	良好	3
汽车吊	25t	良好	0
挖掘机	330 型	良好	0
	200 型	良好	2
	90 型	良好	0
推土机		良好	0
自卸汽车	20m³	良好	0

三、物资进场情况

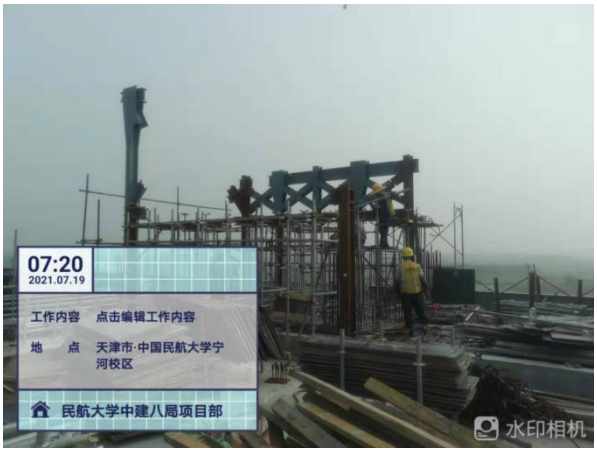
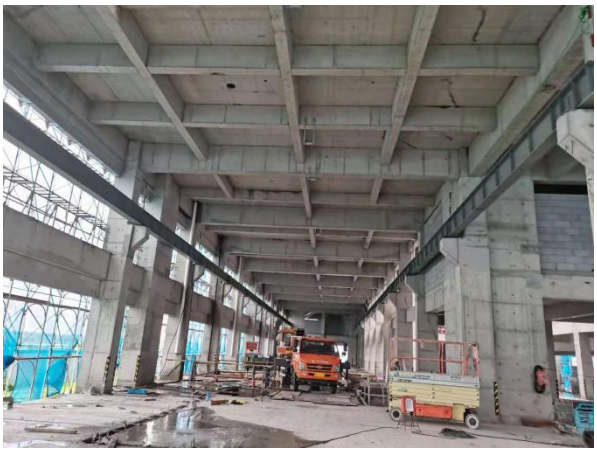
中建八局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
蒸压加气快	600*240*200	80 立方	√	√	
混凝土	C20 细石	24 立方	√	√	
中建三局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、工程进度情况

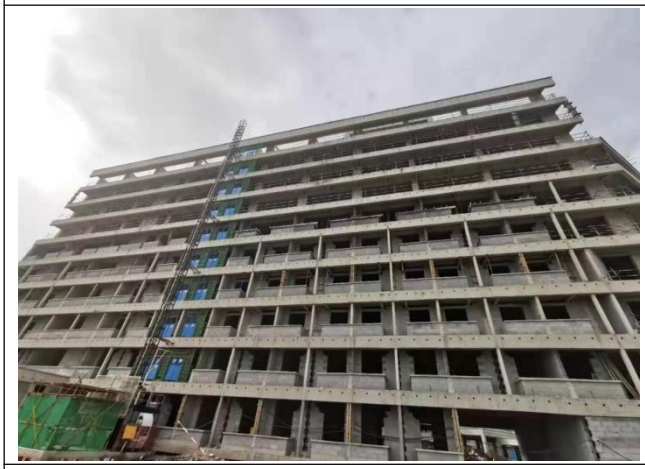
中建八局 （一标段）	1、图书馆地库砌筑完成 97%，构造柱支模完成 95%；首层二构倒砖 78%，砌筑完成 25%,二层阻尼墙混凝土浇筑完成;二层放线完成 100%,植筋完成 15%,D2D3 结构柱操作架搭设完成；钢构屋面钢梁完成 95%，汽车坡道钢筋绑扎完成 100%,浇筑完成。 2、实验楼首层地面浇筑完成 95%，钢筋绑扎完成 95%；二层构造柱浇筑完成 95%，圈梁浇筑完成 65%，三层构造柱浇筑完成 100%，四层砌筑 55%。钢梁安装完成。 3、公共教学楼四层砌筑完成 70%；三层构造柱浇筑完成 80%；首层放线完成，植筋完成 50%；首层砌筑 20% 4、飞乘大楼三层 1、2 段砌筑完成 85%，3 段砌筑完成 20%；二层构造柱浇筑完成 95%，3、4 段回填完成 100%；首层 1 段放线完成。 5、图书馆地下室：A3 区域桥架安装 92%，消防管道主管道 A6-A7 完成 86%，通风管道地下室安装 55%，空调水主管道安装 62% 6、教学楼：二层通风管道安装 75%、2 层桥架安装 80%，3 层桥架支架安装 60% 7.飞机乘务楼：二层水暖立管安装 45%；二层桥架支架安装 53%; 8.实验楼：污水管安装 60%；二层风管安装 50%；三层桥架安装 80%；四层桥架安装 80%。
中建三局 （二标段）	**因下雨及迎检施工现场暂停施工，现场安排部分人员进行清理、覆盖防尘网及抽排水。** 1、体育馆首层墙体基础开槽完成 75%，墙基础砌筑完成 45%，体育馆游泳馆高支模顶板梁模板拆除完成 35%；师生活动中心北侧抽排水，钢板路平整，准备拆除塔吊，裙楼 B 首层顶板梁模板支设完成 50%，主楼四层构造柱砼浇筑完成 95%，三层构造柱砼浇筑完成 80%，模板支设完成，五层构造柱模板支设完成，砼浇筑完成，屋面层反坎砼浇筑完成 85%; 2、指挥部室内墙面踢脚线安装完成 95%，防火门安装，北侧停车场及路面铺装完成，室外鹅卵石铺装完成，室外阳台铝板安装完成; 3、1#A 段首层砌筑完成 90%，2 层砌筑完成，4 层砌筑完成 95%，3 层砌筑完成 85%，5 层砌筑完成 60%，6 层砌筑完成 40%，；B 段首层砌筑完成 95%，2 层砌筑完成，4 层砌筑完成 95%，5 层砌筑完成 85%，6 层砌筑完成 90%；2 号楼首层砌筑完成 95%，2 层砌筑完成，3 层砌筑完成 90%，4 层砌筑完成 95%，5 层砌筑 95%，6 层砌筑完成 90%。3#楼首层砌筑完成 75%，2 层砌筑完成 90%，3 层砌筑完成 95%，4 层砌筑完成 95%，5 层砌筑完成 85%，6 层砌筑完成 80%；4#楼首层砌筑完成，2 层砌筑完成 85%，3 层砌筑完成 95%，4 层砌筑完成 95%，5 层砌筑完成 85%，6 层砌筑完成 40%。5 号

	楼首层砌筑完成95%，2层砌筑完成90%，3层砌筑完成95，4层砌筑完成95%，5层砌筑完成95%，6层砌筑完成70%； 4、食堂首层砌筑除暂停砌筑部分外，其余完成95%，构造柱完成95%，二层二次结构砌筑完成95%，构造柱砼浇筑完成95%，三层砌筑完成85%，构造柱砼浇筑完成70%。

五、现场作业影像

<table>
<tr><td colspan="2">中建八局（一标段）</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆屋面结构施工</td><td>图书馆北侧钢构吊装</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实验楼钢梁安装</td><td>教学楼首层砌筑</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆首层砌筑</td><td>飞乘地面回填</td></tr>
</table>

中建三局（二标段）	
	
体育馆首层墙体基础开槽完成 75%，墙基础砌筑完成 45%	体育馆游泳馆高支模顶板梁模板拆除完成 35%
	
师生活动中心北侧抽排水，钢板路平整，准备拆除塔吊，裙楼 B 首层顶板梁模板支设完成 50%，主楼四层构造柱砼浇筑完成 95%，三层构造柱砼浇筑完成 80%，模板支设完成，五层构造柱模板支设完成，砼浇筑完成，屋面层反坎砼浇筑完成 85%	食堂首层砌筑除暂停砌筑部分外，其余完成 95%，构造柱完成 95%，二层二次结构砌筑完成 95%，构造柱砼浇筑完成 95%，三层砌筑完成 85%，构造柱砼浇筑完成 70%
	

指挥部室内墙面踢脚线安装完成 70%，防火门安装，北侧停车场及路面铺装完成，室外鹅卵石铺装完成，室外阳台铝板安装完成；	1#A 段首层砌筑完成 90%，2 层砌筑完成，4 层砌筑完成 95%，3 层砌筑完成 85%，5 层砌筑完成 60%，6 层砌筑完成 40%，；B 段首层砌筑完成 95%，2 层砌筑完成，4 层砌筑完成 95%，5 层砌筑完成 85%，6 层砌筑完成 90%
	
2 号楼首层砌筑完成 95%，2 层砌筑完成，3 层砌筑完成 90%，4 层砌筑完成 95%，5 层砌筑 95%，6 层砌筑完成 90%	3#楼首层砌筑完成 75%，2 层砌筑完成 90%，3 层砌筑完成 95%，4 层砌筑完成 95%，5 层砌筑完成 85%，6 层砌筑完成 80%
	
4#楼首层砌筑完成，2 层砌筑完成 85%，3 层砌筑完成 95%，4 层砌筑完成 95%，5 层砌筑完成 85%，6 层砌筑完成 40%	5 号楼首层砌筑完成 95%，2 层砌筑完成 90%，3 层砌筑完成 95，4 层砌筑完成 95%，5 层砌筑完成 95%，6 层砌筑完成 70%
