建设单位：中国民航大学宁河校区

施工单位：中国建筑第八工程有限公司（一标段）

中国建筑第三工程有限公司（二标段）

监理单位：全咨

日期：2021 年 5 月 16 日星期日

天气：晴，风力中等

【目录】

一.　工地疫情防护情况

二.　现场人员设备情况

三.　材料物资进场情况

四.　工程进度情况

五.　现场作业影像

一、疫情防控情况

按本项目疫情防控工作方案和应急预案抓好工地常态化疫情防控工作，防疫物资储备充足，无疫情发生。

二、现场人员设备情况

中建八局（一标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建八局	42	9	现场管理、方案编制
天宇信达	5	219	图书馆一次结构
肥城环宇	1	13	机电安装
北京慧欣	2	29	机电安装
永达保信	1	12	文明施工
天津金拓	1	1	降水运行
天津科顺	1	0	防水施工
唐山彬达	7	342	教学组团一次结构
东方城	4	5	钢结构施工
福建聚利	2	3	幕墙安装
合计	66	633	
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
挖掘机	200 型	良好	1
叉车		良好	2
洒水车		良好	1
雾炮车		良好	2
钢筋切断机	40 型	良好	5
钢筋弯曲机	50 型	良好	5
钢筋调直机	50 型	良好	2
钢筋箍筋弯曲机	25 型	良好	3
吊车	70t	良好	1
吊车	25t	良好	0
自卸吊	8t	良好	2
吊车	50t	良好	1

中建三局（二标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	28/10	/	方案编制、现场施工管理
天津欣蕊	2/0	0/0	
三局二安	6/0	75/45	师生活动中心、学生食堂、宿舍楼、体育馆水电预留预埋
梁平荣安	20/0	662/285	模板支设、拆除、满堂架搭设，钢筋清理、绑扎；砼浇筑，清理现场
三局一公司钢构	4/0	10/0	师生活动中心钢梁安装，高强螺栓安装，电梯井钢梁吊装，指挥部防火涂料喷涂
北京东方雨虹防水工程有限公司	1/0	0/0	
山东海灏装饰设计有限公司	4/0	39/15	指挥部木结构材料拼装吊运，指挥部幕墙材料进场下料，立龙骨，轻钢龙骨隔墙安装，二次结构砌筑
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	1
塔吊	TC6012	良好	2
	TC7013	良好	2
	XGT6513	良好	2
汽车吊	50t	良好	2
挖掘机	330 型	良好	0
	200 型	良好	0
	90 型	良好	0
自卸汽车	20m³	良好	0

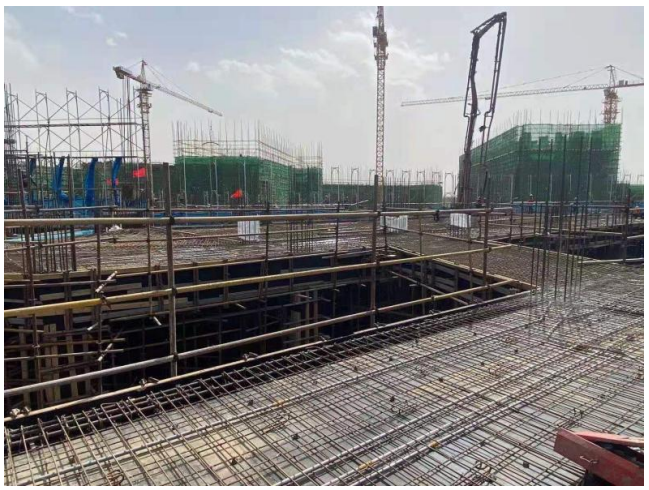
三、物资进场情况

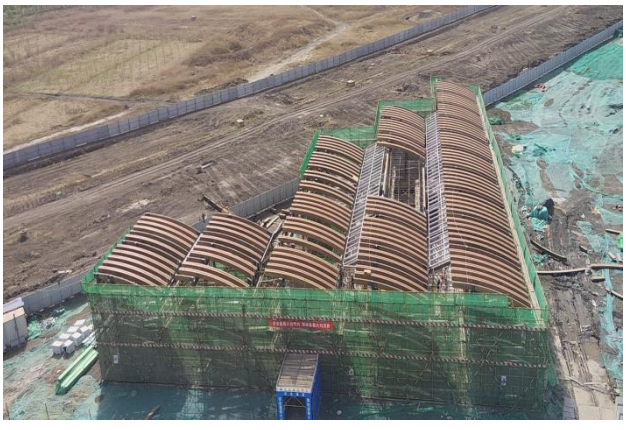
中建八局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
钢管	1.5m	2200 根			
	2m	1200 根			
十字扣件		10020 个			
钢筋		30t			
中建三局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
卸料平台		6 套	合格		
木望板		1818 平米	合格		
止水螺杆		1440 套	合格		

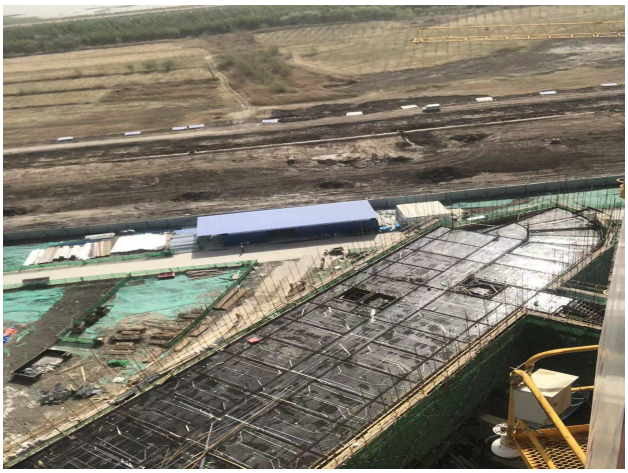
四、工程进度情况

中建八局 （一标段）	①图书馆 41 口井正常降水，8 口观测井水位正常；A1 区半地下室养护完成，一层内架搭设完成 70%；A2 区半地下室顶板养护完成，一层内架搭设 80%；A3 区半地下室顶板养护完成，一层内架搭设 80%；A4 区半地下室顶板养护完成，一层内架搭设 70%；A5 区半地下室梁筋验收完成；A6 区半地下室梁筋验收完成；A7 区半地下室梁筋验收完成；A8 区半地下室养护完成，B1 顶板养护完成,B2 区顶板养护完成；B3 区养护完成，B4-B5 区地下室梁筋验收完成；C1 区墙柱、梁顶板养护完成；C2-3 区墙柱、梁顶板养护完成；C4 区顶板模板配制完成梁板安装完成；C5 区梁顶板养护完成；C6 区顶板模板配制完成，梁板安装完成；C7 区梁顶板养护完成 ②机场学院教学实验 4 层模板完成 70%，钢筋成 60%。 ③公共教学楼 3 层模板完成 70%，钢筋完成 60%。 ④飞行乘务大楼 3 层模板完成 70%，钢筋完成 60%。 ⑤模拟舱 2 层模板完成，钢筋完成 90%。
中建三局 （二标段）	1、体育馆一区顶板钢筋绑扎完成，二区顶板钢筋绑扎完成，台阶、看台模板支设完成 95%，三区顶板模板支设完成 95%，顶板梁钢筋绑扎完成 40%，四区高支模区域架体搭设完成 90%；师生活动中心裙房 A 钢梁焊接完成 50%，基础回填土完成，师生活动中心主楼四层墙柱模板支设完成 95%，顶板梁钢筋绑扎完成 30%；指挥部木结构满焊工人完成 92%，指挥部幕墙材料进场下料，竖铝龙骨，满焊完成 96%，轻钢龙骨隔墙安装完成 93%，二次结构砌筑完成 97%。 2、1#B 段五层竖向钢筋绑扎完成，顶板完成 100，梁钢筋 100% ，下铁钢筋完成 100%。A 段 6 层竖向钢筋绑扎完成 100%，模板完成 60%；2#5 层顶板验收合格，浇筑混凝土；3#四层墙柱模板完成 100%，满堂架完成 100%，顶板完成 90%；4#四层顶板浇筑混凝土；5＃楼 6 层顶板完成 100%，下铁钢筋完成 100%； 3、食堂二段二层满堂架完成 100%，顶板完成 100%，梁钢筋，上铁钢筋完成 80%。食堂一段二层顶板完成 100%，梁钢筋完成 60%，能源站首层顶板浇筑完成。

五、现场作业影像

<table>
<tr><td colspan="2">中建八局（一标段）</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆 A5 区浇筑</td><td>图书馆 A 区钢筋验收</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>钢结构焊缝探伤</td><td>三间巡查</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆 A5 机电验收</td><td>飞行大楼混凝土浇筑</td></tr>
</table>

中建三局（二标段）	
	
体育馆一区顶板钢筋绑扎完成，二区顶板钢筋绑扎完成，台阶、看台模板支设完成 95%	三区顶板模板支设完成 95%，顶板梁钢筋绑扎完成 40%，四区高支模区域架体搭设完成 90%；
	
师生活动中心裙房 A 钢梁焊接完成 50%，基础回填土完成；	师生活动中心主楼四层墙柱模板支设完成 95%，顶板梁钢筋绑扎完成 30%
	
指挥部木结构满焊工人完成 92%，指挥部幕墙材料进场下料，竖铝龙骨，满焊完成 96%，轻钢龙骨隔墙安装完成 93%，二次结构砌筑完成 97%	1#B 段五层竖向钢筋绑扎完成，顶板完成 100，梁钢筋 100% ，下铁钢筋完成 100%。A 段 6 层竖向钢筋绑扎完成 100%，模板完成 60%

	
2#5 层顶板验收合格，浇筑混凝土	3#四层墙柱模板完成 100%，满堂架完成 100%，顶板完成 90%
	
4#四层顶板浇筑混凝土	5#楼 6 层顶板完成 100%，下铁钢筋完成 100%
	
食堂二段二层满堂架完成 100%，顶板完成 100%，梁钢筋，上铁钢筋完成 80%。食堂一段二层顶板完成 100%，梁钢筋完成 60%，能源站首层顶板浇筑完成	
