建设单位：中国民航大学宁河校区

施工单位：中国建筑第八工程有限公司（一标段）

中国建筑第三工程有限公司（二标段）

监理单位：全咨

日期：2021 年 6 月 10 日 星期四

天气：晴，风力中等

【目录】

一. 工地疫情防护情况

二. 现场人员设备情况

三. 材料物资进场情况

四. 工程进度情况

五. 现场作业影像

一、疫情防控情况

按本项目疫情防控工作方案和应急预案抓好工地常态化疫情防控工作，防疫物资储备充足，无疫情发生。

二、现场人员设备情况

中建八局（一标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建八局	40	40	现场管理、方案编制
天宇信达	5	198/23	图书馆一次结构
肥城环宇	2	14	机电安装
北京慧欣	2	23	机电安装
永达保信	1	16	文明施工
天津金拓	1	1	降水运行
天津科顺	1	1	防水施工
唐山彬达	7	177/31	教学组团一次结构
东方城	4	8	钢结构施工
福建聚利	3	7	幕墙安装
鼎立安	1	12	外架搭设
天宇信达(二构)	7	70	二次结构施工
天津俊凯	2	9	机电通风
合计	76	576	
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
货用施工升降机	SC120/120	良好	2
叉车	3 台	良好	4
洒水车	1 辆	良好	1
雾炮车	2 台	良好	2
钢筋切断机	40 型	良好	5
钢筋弯曲机	50 型	良好	5
钢筋调直机	50 型	良好	2
钢筋箍筋弯曲机	25 型	良好	3
塔吊	XGT7527	良好	2
塔吊	TC7013-10D	良好	3

中建三局（二标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	27/10	/	方案编制、现场施工管理
天津欣蕊	2/0	9/0	指挥部周边绿化回填
三局二安	6/0	52/28	师生活动中心、学生食堂、宿舍楼、体育馆水电预留预埋，指挥部水电安装
梁平荣安	20/2	306/116	模板支设、拆除、满堂架搭设，钢筋清理、绑扎；砼浇筑，清理现场
三局一公司钢构	4/0	6/0	体育馆埋件安装
北京东方雨虹防水工程有限公司	1/0	0/0	
山东海灏装饰设计有限公司	5/1	35/16	室内铝板收口，瓷砖地面铺设，墙面腻子打磨，外架拆除
兴华鑫宇	3/0	72/0	二次结构放线、植筋、反坎支模，墙体砌筑
天津津宝福	3/0	69/0	二次结构放线、植筋、反坎支模，墙体砌筑
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	1
塔吊	TC6012	良好	2
	TC7013	良好	2
	XGT6513	良好	1
物料提升机	SC100/100	良好	5
电梯	SC200/200	良好	3
汽车吊	25t	良好	3
挖掘机	330 型	良好	0
	200 型	良好	1
	90 型	良好	2
自卸汽车	20m³	良好	4

三、物资进场情况

中建八局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
中建三局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
加气块		96 方	合格		

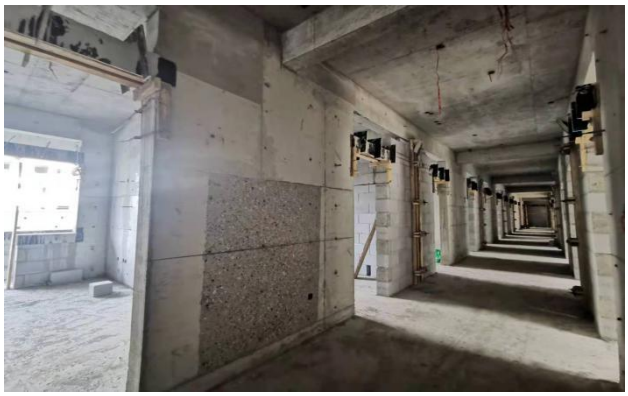
四、工程进度情况

中建八局 （一标段）	图书馆人防地库拆模完成，清理完成，二次结构放线完成 85%，植筋 70%，地下室倒砖 5%；首层架体拆除完成，二层架体拆除 10%；D1 区三夹层架体搭设 10%；D2 区三夹层放线养护完成;D3 区三层架体搭设完成，顶班支模完成，墙柱合模完成，梁筋绑扎完成;D4 区三层浇筑完成 70%；C 区地下室设备基础浇筑完成。 ②实验楼首层植筋 80%，砌筑基础墙砌筑完成 10%，三层砌筑完成 90%。二层植筋完成 90%，四层清理完成 90%； ③公共教学楼出屋面层 2 段模板加固完成 80%，3 段柱筋绑扎 100%，首层回填完成 90%；二层二次结构砌筑完成 75%， ④飞乘大楼出屋面层花架 3 段柱筋绑扎完成 100%，4 段柱筋绑扎 50%，一层二次结构基础墙砌筑完成 100%，1，2 段基础墙构造柱浇筑完成 ⑤模拟舱四层梁筋绑扎完成 100%。模板加固完成 50%
中建三局 （二标段）	1、体育馆花架梁模板搭设完成，框架柱及花架梁钢筋绑扎完成，钢结构预埋件安装,比赛场馆褥零层板钢筋绑扎完成 60%,体育馆四区三层花架梁架体搭设完成 40%;师生活动中心裙房 B 零层板钢筋绑扎完成；主楼首层构造柱砼浇筑完成 80%，二层墙体砌筑完成 40%； 2、指挥部室内铝板收口完成 70%；室内墙面打磨完成 75%；瓷砖地面铺设 65%，外架拆除完成，周边绿化回填完成 40%； 3、1#A 段 2 层砌筑完成 90%，4 层砌筑完成 55%；B 段 2 层砌筑完成 100%，构造柱浇筑完成是 100%，4 层砌筑完成 40%；2 号楼 2 层砌筑完成 95%，构造柱浇筑完成 95%，4 层砌筑完成 50%，5 层反坎浇筑完成；3#10 层二段顶板浇筑完成。一段机房层花架梁满堂架完成 90%；4#楼机房花架梁顶板完成 100%；4#楼首层砌筑完成 85%，3 层砌筑完成 15%。5 号楼 3 层砌筑完成 100%，构造柱浇筑完成 80%，4 层砌筑完成 40%，6 层防水反坎浇筑完成。 4、食堂首层二次结构砌筑完成 75%，构造柱及腰梁砼浇筑完成 65%，二层开始砌筑。

五、现场作业影像

中建八局（一标段）

中建三局（二标段）	
	
体育馆花架梁模板搭设完成，框架柱及花架梁钢筋绑扎完成，钢结构预埋件安装，比赛场馆褥零层板钢筋绑扎完成 60%	体育馆四区三层花架梁架体搭设完成 40%
	
师生活动中心裙房 B 零层板钢筋绑扎完成；主楼首层构造柱砼浇筑完成 80%，二层墙体砌筑完成 40%	食堂首层二次结构砌筑完成 75%，构造柱及腰梁砼浇筑完成 65%，二层开始砌筑
	
指挥部室内铝板收口完成 70%；室内墙面打磨完成 75%；瓷砖地面铺设 65%，外架拆除完成，周边绿化回填完成 40%	1#A 段 2 层砌筑完成 90%，4 层砌筑完成 55%；B 段 2 层砌筑完成 100%，构造柱浇筑完成是 100%，4 层砌筑完成 40%

	
2 号楼 2 层砌筑完成 95%，构造柱浇筑完成 95%，4 层砌筑完成 50%，5 层反坎浇筑完成	3#10 层二段顶板浇筑完成。一段机房层花架梁满堂架完成 90%
	
4#楼首层砌筑完成 85%，3 层砌筑完成 15%	5 号楼 3 层砌筑完成 100%，构造柱浇筑完成 80%，4 层砌筑完成 40%，6 层防水反坎浇筑完成
	
体育馆花架梁模板搭设完成，框架柱及花架梁钢筋绑扎完成，钢结构预埋件安装，比赛场馆褥零层板钢筋绑扎完成 60%	体育馆四区三层花架梁架体搭设完成 40%
