建设单位：中国民航大学宁河校区

施工单位：中国建筑第八工程有限公司（一标段）

中国建筑第三工程有限公司（二标段）

监理单位：全咨

日期：2021 年 6 月 7 日 星期一

天气：晴，风力中等

【目录】

一. 工地疫情防护情况

二. 现场人员设备情况

三. 材料物资进场情况

四. 工程进度情况

五. 现场作业影像

一、疫情防控情况

按本项目疫情防控工作方案和应急预案抓好工地常态化疫情防控工作，防疫物资储备充足，无疫情发生。

二、现场人员设备情况

中建八局（一标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建八局	40	40	现场管理、方案编制
天宇信达	5	198/23	图书馆一次结构
肥城环宇	2	14	机电安装
北京慧欣	2	23	机电安装
永达保信	1	16	文明施工
天津金拓	1	1	降水运行
天津科顺	1	1	防水施工
唐山彬达	7	177/31	教学组团一次结构
东方城	4	8	钢结构施工
福建聚利	3	7	幕墙安装
鼎立安	1	12	外架搭设
天宇信达(二构)	7	63	二次结构施工
天津俊凯	2	9	机电通风
合计	76	569	
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
货用施工升降机	SC120/120	良好	2
叉车	3 台	良好	4
洒水车	1 辆	良好	1
雾炮车	2 台	良好	2
钢筋切断机	40 型	良好	5
钢筋弯曲机	50 型	良好	5
钢筋调直机	50 型	良好	2
钢筋箍筋弯曲机	25 型	良好	3
塔吊	XGT7527	良好	2
塔吊	TC7013-10D	良好	3

中建三局（二标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	28/10	/	方案编制、现场施工管理
天津欣蕊	2/0	12/0	体育馆比赛场馆褥垫层回填平整
三局二安	6/0	52/22	师生活动中心、学生食堂、宿舍楼、体育馆水电预留预埋，指挥部水电安装
梁平荣安	20/2	317/128	模板支设、拆除、满堂架搭设，钢筋清理、绑扎；砼浇筑，清理现场
三局一公司钢构	4/0	6/0	体育馆钢柱爬梯焊接
北京东方雨虹防水工程有限公司	1/0	0/0	
山东海灏装饰设计有限公司	5/1	35/18	室内铝板收口，外墙装饰盖安装，墙面腻子打磨，幕墙玻璃安装
兴华鑫宇	3/0	72/0	二次结构放线、植筋、反坎支模，墙体砌筑
天津津宝福	3/0	69/0	二次结构放线、植筋、反坎支模，墙体砌筑
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	1
塔吊	TC6012	良好	2
	TC7013	良好	2
	XGT6513	良好	1
物料提升机	SC100/100	良好	5
电梯	SC200/200	良好	3
汽车吊	25t	良好	3
挖掘机	330 型	良好	1
	200 型	良好	0
	90 型	良好	2
自卸汽车	20m³	良好	6

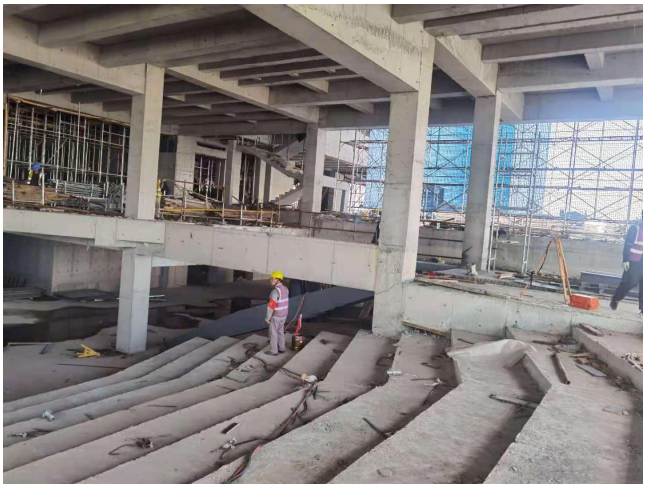
三、物资进场情况

中建八局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
中建三局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
加气块		216 方	合格		

四、工程进度情况

中建八局 （一标段）	①图书馆人防地库拆模完成，清理完成，二次结构放线完成 70%，植筋 50%；首层架体拆除完成 95%；D1 区三夹层放线养护完成；D2 区三层架体搭设完，;顶板支模完成，墙柱合模完成，梁筋绑扎完成，验收完成;D3 区三层架体搭设完成 95%，顶班支模完成 95%，墙柱合模完成 95%，梁筋绑扎完成 95%;D4 区三层内支撑架体完成，顶板支模完成 95%，墙柱合模完成，梁板筋绑扎完成;4 节柱安装完成，演艺厅钢楼梯安装完成 80%。②实验楼三层砌筑完成 60%。四层清理完成 80%；屋面层清理完成 100% ③公共教学楼出屋面层 2 段柱筋绑扎完成 100%，3 段柱筋绑扎 70%，首层回填完成 60%；二层二次结构砌筑完成 60%， ④飞乘大楼出屋面层 1、2 段梁模板加固完成 100%，一层二次结构基础墙砌筑完成 95%， ⑤模拟舱四层梁筋绑扎完成 90%。
中建三局 （二标段）	1、体育馆花架梁模板搭设完成 90%，框架柱及花架梁钢筋绑扎完成 90%，体育馆四区二层顶板砼浇筑完成，比赛场馆褥垫层回填完成；师生活动中心裙房 B 零层板垫层砼浇筑完成；主楼首层构造柱砼浇筑完成 50%，二层墙体砌筑完成 25%； 2、指挥部室内铝板收口完成 55%；室内墙面打磨完成 45%；瓷砖地面铺设 40%，外架拆除完成 60%； 3、1#A 段 2 层砌筑完成 90%，4 层砌筑完成 45%；B 段 2 层砌筑完成 100%，构造柱浇筑完成 90%，4 层反坎浇筑完成；2 号楼 2 层砌筑完成 95%，4 层防水反坎浇筑完成，砌筑完成 40%；3#10 层二段下铁钢筋完成 100%，一段机房层夹层浇筑完成；4#楼机房夹层顶板浇筑完成；4#楼首层砌筑完成 70%，4 号楼首次悬挑外架拆除 90%；5 号楼 3 层砌筑完成 80%，6 层防水反坎浇筑完成。 4、食堂首层二次结构反坎浇筑完成，砌筑完成 70%，构造柱及腰梁砼浇筑完成 50%，能源站砌筑完成 25%。

五、现场作业影像

<table>
<tr><td colspan="2">中建八局（一标段）</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实验楼屋面层清理完成</td><td>公共教学楼二层砌筑</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>图书馆钢楼梯安装</td><td>现场综合巡查</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆三层 D3 钢筋绑扎</td><td>图书馆 D1 区三层浇筑完成</td></tr>
</table>

中建三局（二标段）	
	
体育馆花架梁模板搭设完成 90%，框架柱及花架梁钢筋绑扎完成 90%	体育馆四区二层顶板砼浇筑完成，比赛场馆褥垫层回填完成
	
师生活动中心裙房 B 零层板垫层砼浇筑完成；主楼首层构造柱砼浇筑完成 50%，二层墙体砌筑完成 25%	食堂首层二次结构反坎浇筑完成，砌筑完成 70%，构造柱及腰梁砼浇筑完成 50%，能源站砌筑完成 25%
	
指挥部室内铝板收口完成 55%；室内墙面打磨完成 45%；瓷砖地面铺设 40%，外架拆除完成 60%	1#A 段 2 层砌筑完成 90%，4 层砌筑完成 45%；B 段 2 层砌筑完成 100%，构造柱浇筑完成 90%，4 层反坎浇筑完成

	
2 号楼 2 层砌筑完成 95%，4 层防水反坎浇筑完成，砌筑完成 40%	3#10 层二段下铁钢筋完成 100%，一段机房层夹层浇筑完成
	
4#楼机房夹层顶板浇筑完成,4#楼首层砌筑完成 70%，4 号楼首次悬挑外架拆除 90%	5 号楼 3 层砌筑完成 80%，6 层防水反坎浇筑完成
	
体育馆花架梁模板搭设完成 90%，框架柱及花架梁钢筋绑扎完成 90%	体育馆四区二层顶板砼浇筑完成，比赛场馆褥垫层回填完成
