建设单位：中国民航大学宁河校区

施工单位：中国建筑第八工程有限公司（一标段）

中国建筑第三工程有限公司（二标段）

监理单位：全资

日期：2021 年 4 月 30 日星期五

天气：多云，风力中等

【目录】

一.　工地疫情防护情况

二.　现场人员设备情况

三.　材料物资进场情况

四.　工程进度情况

五.　现场作业影像

一、疫情防控情况

按本项目疫情防控工作方案和应急预案抓好工地常态化疫情防控工作，防疫物资储备充足，无疫情发生。

二、现场人员设备情况

中建八局（一标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建八局	42	9	现场管理、方案编制
天宇信达	5	302	图书馆一次结构
肥城环宇	1	13	机电安装
北京慧欣	2	29	机电安装
永达保信	1	20	文明施工
天津金拓	1	1	降水运行
天津科顺	1	7	防水施工
唐山彬达	7	387	教学组团一次结构
东方城	4	9	钢结构施工
福建聚利	2	3	幕墙安装
鼎立安	2	12	外架搭设
合计	68	792	
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
挖掘机	200 型	良好	1
叉车		良好	3
洒水车		良好	1
雾炮车		良好	2
钢筋切断机	40 型	良好	5
钢筋弯曲机	50 型	良好	5
钢筋调直机	50 型	良好	2
钢筋箍筋弯曲机	25 型	良好	3
自卸吊	9m	良好	1
挖机	60 型	良好	1
十轮		良好	0
吊车	50t	良好	2

中建三局（二标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	28/10	/	方案编制、现场施工管理
天津欣蕊	2/0	2/0	物料提升机基础平整
三局二安	6/0	86/46	师生活动中心、学生食堂、宿舍楼、体育馆水电预留预埋，指挥部水电安装
梁平荣安	20/0	668/289	模板支设、拆除、满堂架搭设，钢筋清理、绑扎；砼浇筑，清理现场
三局一公司钢构	4/0	10/0	师生活动中心钢梁安装，高强螺栓安装，指挥部防火涂料喷涂
北京东方雨虹防水工程有限公司	1/0	0/0	
山东海灏装饰设计有限公司	4/0	51/21	竖铝龙骨，满焊，墙面抹灰，屋面天沟龙骨安装，轻钢龙骨隔断封板
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	1
塔吊	TC6012	良好	2
	TC7013	良好	2
	XGT6513	良好	2
汽车吊	50t	良好	2
挖掘机	330 型	良好	0
	200 型	良好	0
	90 型	良好	1
自卸汽车	20m³	良好	2

三、物资进场情况

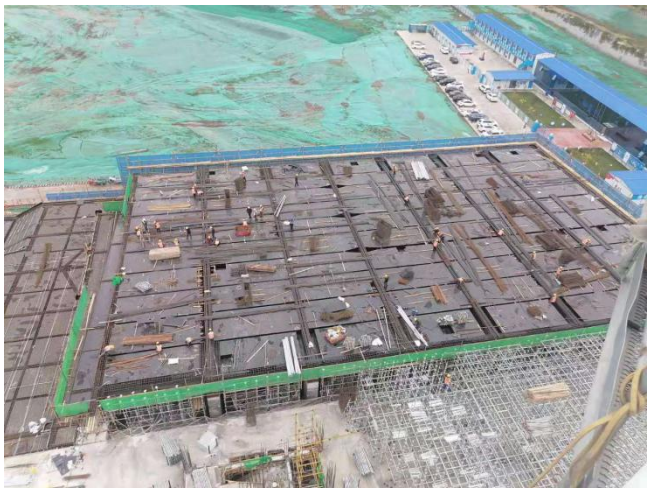
中建八局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
钢包木	50*50*3m	7000 根			
中建三局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
钢管		36 吨	合格		
模板		2460 平米	合格		

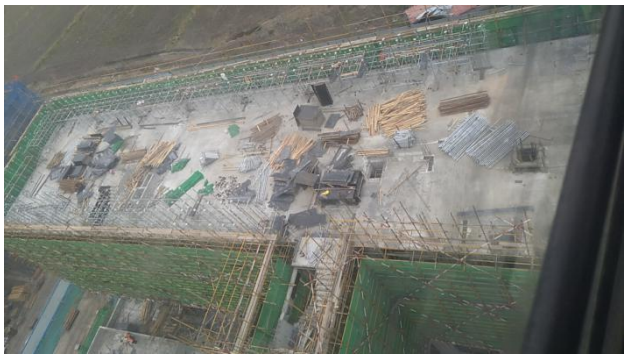
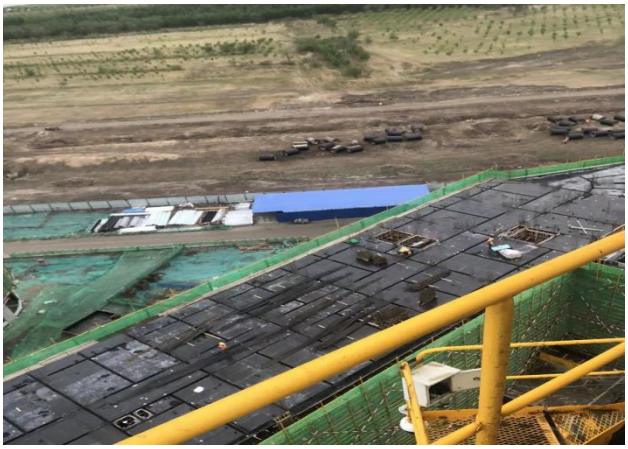
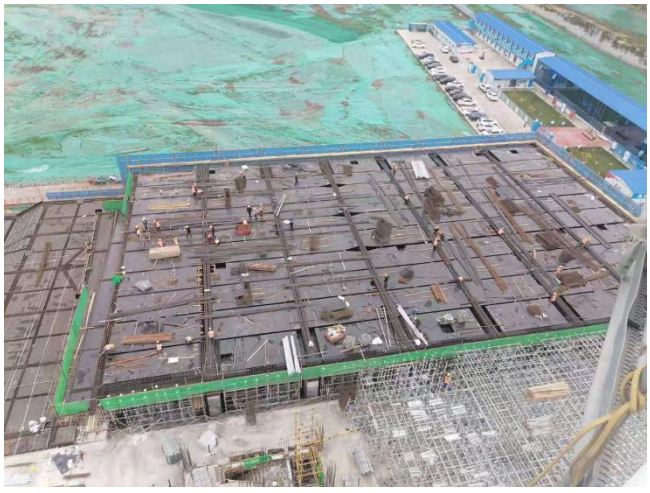
四、工程进度情况

中建八局 （一标段）	①图书馆 41 口井正常降水，8 口观测井水位正常； A 区地库顶板混凝土浇筑完成，A 区首层顶板支模架体搭设完成 100%，首层顶板支模完成 100%，首层顶板钢筋绑扎完成 70%，首层钢柱吊装完成 100%，B 区地库顶板混凝土浇筑完成，C 区地库顶板混凝土浇筑完成。外墙修补及清理完成 80%，地库外墙防水施工完成 65%，土方回填完成 40%。 ②机场学院教学实验楼屋面架体搭设完成，柱钢筋绑扎完成，模板安装完成。 ③公共教学楼 3 层模板完成，钢筋完成 100%。 ④飞行乘务大楼 3 层模板完成 85%，钢筋完成 70%。 ⑤模拟舱 3 层架体搭设完成 30%。
中建三局 （二标段）	1、体育馆一区、二区二层柱钢筋绑扎完成 45%，二层满堂架搭设完成 93%，台阶斜梁、板钢筋绑扎完成 35%，三区四区二层满堂架搭设完成 30%，四区高支模区域顶板、梁模板支设完成 88%，梁钢筋绑扎完成 35%；师生活动中心五层顶板、梁钢筋绑扎完成； 2、指挥部屋面天沟龙骨安装满焊完成 53%，轻钢龙骨隔断封板完成 98%，轻钢龙骨隔墙填岩棉完成 13%，室内挡烟垂壁满焊完成 100%，窗帘盒安装完成 35%。 3、1#B 段 6 层顶板浇筑完成，备料。A 段机房层钢筋绑扎完成 70%；2#机房层钢筋，模板备料；3#6 层竖向模板及满堂架完成 90%，顶板完成 30%；4#6 层满堂架及顶板完成 90%；5＃8 层竖向钢筋绑扎完成，验收合格； 4、食堂二段三层顶板浇筑完成 100%。食堂一段 3 层顶板完成 100%,梁钢筋完成 50%。

五、现场作业影像

<table>
<tr><td colspan="2">中建八局（一标段）</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆临边防护搭设</td><td>图书馆首层安全网铺设</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实验楼防护网铺设</td><td>实验楼屋面墙柱安装</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>钢包木进场</td><td>三间巡查值班</td></tr>
</table>

中建三局（二标段）	
	
体育馆一区、二区二层柱钢筋绑扎完成 45%，二层满堂架搭设完成 93%，台阶斜梁、板钢筋绑扎完成 35%	三区四区二层满堂架搭设完成 30%，四区高支模区域顶板、梁模板支设完成 88%，梁钢筋绑扎完成 35%
	
师生活动中心五层顶板、梁钢筋绑扎完成；	屋面天沟龙骨安装满焊完成 53%，轻钢龙骨隔断封板完成 98%，轻钢龙骨隔墙填岩棉完成 13%，室内挡烟垂壁满焊完成 100%，窗帘盒安装完成 35%，二层地采暖地面完成
	
食堂二段三层顶板浇筑完成 100%。食堂一段 3 层顶板完成 100%，梁钢筋完成 50%	1#B 段机房层墙柱钢筋绑扎 30%。A 段机房层钢筋绑扎完成 70%

	
2#机房层钢筋，模板备料	3#6 层竖向模板及满堂架完成 90%，顶板完成 30%
	
4#6 层满堂架及顶板完成 90%	5#8 层竖向钢筋绑扎完成，验收合格
	
体育馆一区、二区二层柱钢筋绑扎完成 45%，二层满堂架搭设完成 93%，台阶斜梁、板钢筋绑扎完成 35%	三区四区二层满堂架搭设完成 30%，四区高支模区域顶板、梁模板支设完成 88%，梁钢筋绑扎完成 35%
