建设单位：中国民航大学宁河校区

施工单位：中国建筑第八工程有限公司（一标段）

中国建筑第三工程有限公司（二标段）

监理单位：全咨

日期：2021 年 5 月 19 日 星期三

天气：晴，风力中等

【目录】

一. 工地疫情防护情况

二. 现场人员设备情况

三. 材料物资进场情况

四. 工程进度情况

五. 现场作业影像

一、疫情防控情况

按本项目疫情防控工作方案和应急预案抓好工地常态化疫情防控工作，防疫物资储备充足，无疫情发生。

二、现场人员设备情况

中建八局（一标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建八局	40	40	现场管理、方案编制
天宇信达	5	238/40	图书馆一次结构
肥城环宇	2	12	机电安装
北京慧欣	2	24	机电安装
永达保信	1	12	文明施工
天津金拓	1	1	降水运行
天津科顺	1	4	防水施工
唐山彬达	7	318/70	教学组团一次结构
东方城钢构	4	9	钢结构施工
福建聚利	2	4	幕墙安装
鼎立安	1	12	外架搭设
天宇信达(二构)	7	15/3	二次结构施工
合计	73	689	
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
挖掘机	200 型	良好	1
叉车	3	良好	3
洒水车	1	良好	1
雾炮车	2	良好	2
钢筋切断机	40 型	良好	5
钢筋弯曲机	50 型	良好	5
钢筋调直机	50 型	良好	2
钢筋箍筋弯曲机	25 型	良好	3
吊车	50t	良好	1

中建三局（二标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	28/10	/	方案编制、现场施工管理
天津欣蕊	2/0	0/0	
三局二安	6/0	75/26	师生活动中心、学生食堂、宿舍楼、体育馆水电预留预埋，指挥部水电安装
梁平荣安	20/2	482/108	模板支设、拆除、满堂架搭设，钢筋清理、绑扎；砼浇筑，清理现场
三局一公司钢构	4/0	10/0	师生活动中心钢梁安装，指挥部防火涂料喷涂，金属屋面施工
北京东方雨虹防水工程有限公司	1/0	0/0	
山东海灏装饰设计有限公司	4/1	71/24	竖铝龙骨，满焊，屋面天沟龙骨安装，墙面刮腻子，幕墙玻璃安装
兴华鑫宇	4/0	34/0	二次结构放线、植筋、反坎支模，墙体砌筑
天津津宝福	4/0	28/0	二次结构放线、植筋、反坎支模，墙体砌筑
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	1
塔吊	TC6012	良好	2
	TC7013	良好	2
	XGT6513	良好	2
汽车吊	50t	良好	2
挖掘机	330 型	良好	0
	200 型	良好	0
	90 型	良好	0
自卸汽车	20m³	良好	0
物料提升机		良好	4

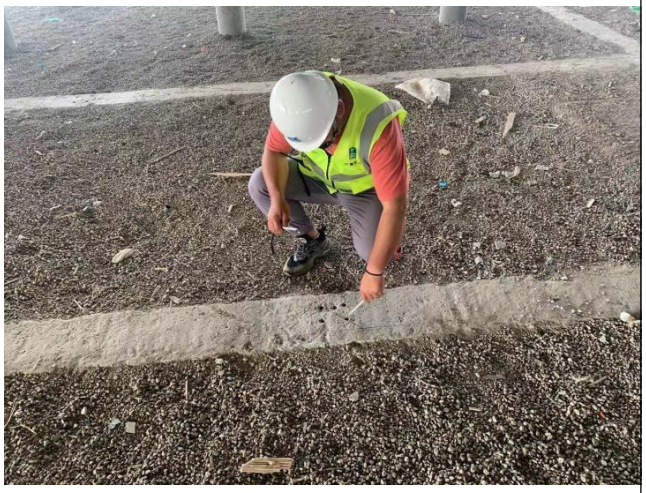
三、物资进场情况

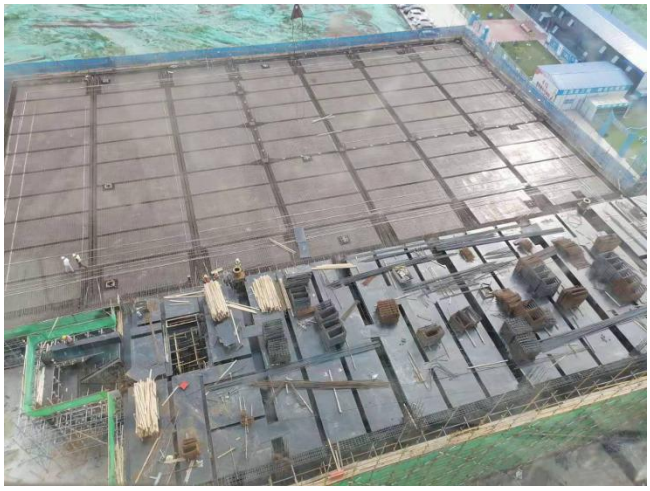
中建八局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
中建三局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
加气块		42 方	合格		

四、工程进度情况

中建八局 （一标段）	①图书馆地库人防、非人防拆模清理完成 80%，二层 D1 砼完成；二层 D2 钢筋、模板完成，验收通过；二层 D3 钢筋、模板完成 80%；二层 D4 墙柱钢筋完成、模板完成 80% 顶板钢筋 60%。 ②公共教学楼四层 2 段钢筋、模板完成 90%，二次结构样板间域放线完成、柱子植筋完成、压墙筋打眼完成。 ③飞行乘务大楼四层 3、4 段梁筋绑扎完成 65% ④模拟仓 3 层钢筋完成 100%，模板安装、加固完成 95%。 ⑤实验楼 3 层模板拆除、清理完成 80%。
中建三局 （二标段）	1、体育馆一区、二区二层看台及顶板梁钢筋绑扎完成 95%，看台模板支设完成 75%，四区高支模区域顶板、梁钢筋绑扎完成，下午验收通过；师生活动中心裙楼 B 零层梁模板支设完成，下午验收，砼浇筑，主楼二层墙体反坎模板支设完成，首层墙体砌筑完成 60%，师生活动中心主楼屋面层模板完成 80%； 2、指挥部屋面工程完成 90%，室内墙面刮腻子石膏完成 75%，幕墙玻璃安装完成 35%； 3、1#B 段机房层顶板模板完成 100%，钢筋完成 90%。A 段 2 层植筋完成，反坎浇筑完成；B 段 2 层反坎浇筑完成，砌筑完成 5%；2 号楼 2 层反坎浇筑完成，砌筑完成 10%；3#8 层顶板下铁钢筋完成 100%；4#楼 8 层顶板上铁钢筋完成 100%，验收合格；5＃楼 9 层顶板浇筑完成；5 号楼 3 层防水反坎支模完成 100%； 4、食堂首层植筋完成，反坎支设及砼浇筑完成 75%，墙体开始砌筑。

五、现场作业影像

<table>
<tr><td colspan="2">中建八局（一标段）</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆三层旋转钢楼梯拆改</td><td>图书馆二层 D2 验收通过</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>安全周检查</td><td>校方领导现场莅临指导</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>教学组团物料提升机检测完成</td><td>教学楼植筋钻孔深度测量</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">中建三局（二标段）</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>体育馆一区、二区二层看台及顶板梁钢筋绑扎完成 95%，看台模板支设完成 75%</td><td>四区高支模区域顶板、梁钢筋绑扎完成，下午验收通过</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>师生活动中心裙楼 B 零层梁模板支设完成，下午验收，砼浇筑</td><td>主楼二层墙体反坎模板支设完成，首层墙体砌筑完成 60%，师生活动中心主楼屋面层模板完成 80%；</td></tr>
<tr><td></td><td> 
1#A 1#B</td></tr>
<tr><td>指挥部屋面工程完成 90%，室内墙面刮腻子石膏完成 75%，幕墙玻璃安装完成 35%</td><td>1#B 段机房层顶板模板完成 100%，钢筋完成 90%。A 段 2 层植筋完成，反坎浇筑完成；B 段 2 层反坎浇筑完成，砌筑完成 5%</td></tr>
</table>

	
2 号楼 2 层反坎浇筑完成，砌筑完成 10%	3#8 层顶板下铁钢筋完成 100%
	
4#楼 8 层顶板上铁钢筋完成 100%，验收合格	5#楼 9 层顶板浇筑完成；5 号楼 3 层防水反坎支模完成 100%
	
食堂首层植筋完成，反坎支设及砼浇筑完成 75%，墙体开始砌筑	
