建设单位：中国民航大学宁河校区

施工单位：中国建筑第八工程有限公司（一标段）

中国建筑第三工程有限公司（二标段）

监理单位：全咨

日期：2021 年 7 月 24 日 星期六

天气：多云，风力中等

【目录】

一. 工地疫情防护情况

二. 施工概要

三. 材料物资进场情况

四. 工程进度情况

五. 现场作业影像

一、疫情防控情况

按本项目疫情防控工作方案和应急预案抓好工地常态化疫情防控工作，防疫物资储备充足，无疫情发生。

二、施工概要

1	图书馆	**本日施工内容**:地库砌筑、构造柱支模；首层砌筑；二层打植筋孔，D1、D4 区植筋；D2/D3 四层竖向钢筋绑扎；钢结构屋面钢梁吊装；中庭钢楼梯安装；消防管道主管道 A6-A7 安装，地下室通风管道安装，空调水主管道安装。
		总体完成情况:砌筑完成 25%，钢结构安装 63%，地库机电安装 42%。
2	机场学院教学实验楼	**本日施工内容**: 污水管安装；雨水管安装；二层风管安装；三层桥架安装；四层桥架安装、消防水管安装
		总体完成情况: 砌筑完成 70%，机电安装完成 20%
3	公共教学楼	**本日施工内容**: 四层砌筑；三层构造柱浇筑；首层砌筑，植筋；二层通风管道安装；二层桥架安装；三层桥架支架安装；二层消防水管安装；四层消防水管安装；雨水管安装；污水管安装。
		总体完成情况: 砌筑完成 77%，机电安装完成 22%
4	飞行乘务大楼及模拟舱楼	**本日施工内容**: 三层 1、2 段砌筑，3，4 段砌筑；一层 3、4 段地面浇筑；四层一段砌筑；二层水暖立管安装、桥架安装、通风管道安装
		总体完成情况: 砌筑完成 42%，机电安装 11%
5	体育馆	**本日施工内容**：首层基础墙体开槽、回填、砌筑，圈梁植筋钢筋绑扎，圈梁模板支设，游泳馆高支模架体拆除材料归码，钢结构桁架拼装、立柱吊装
		整体完成情况：体育馆游泳馆高支模顶板梁模板拆除完成 60%；二次结构施工完成 6%；钢结构完成 7%；机电安装完成 4%。
6	师生活动中心	**本日施工内容**：屋面墙体砌筑，机电安装二次配管，裙房管沟抽水、顶板模板支设，裙房周围材料归码
		整体完成情况：主体结构完成 96%，主楼二次结构完成 86%；机电安装完成 8%
7	指挥部	**本日施工内容**：收尾销项整改，草皮养护，空调调试
		整体完成情况：精装修完成、外立面完成、园林景观完成
8	5#学生宿舍	**本日施工内容**：首层墙体砌筑，构造柱模板支设、砼浇筑，机电安装二次配管，风管安装
		整体完成情况：食堂二次结构完成 78%，机电安装完成 6%
9	4#学生宿舍	**本日施工内容**：A 段六层墙体砌筑，B 段三层砌筑，构造柱模板支设，砼浇筑，机电安装二次配管，风管安装
		整体完成情况：二次结构完成 82%；机电安装完成 7%
10	3#学生宿舍	**本日施工内容**：六层墙体砌筑，构造柱模板支设，砼浇筑，机电安装二次配管，风管安装

		整体完成情况：二次结构完成 82%；机电安装完成 7%
11	2#学生宿舍	**本日施工内容**：首层、六层、八层、九层墙体砌筑，构造柱模板支设，砼浇筑，机电安装二次配管，风管安装；东侧材料清理退场
		整体完成情况：二次结构完成 62%；机电安装完成 7%
12	1#学生宿舍	**本日施工内容**：六层墙体砌筑，构造柱模板支设，砼浇筑，机电安装二次配管；西层材料清理退场
		整体完成情况：二次结构完成 62%；机电安装完成 7%
13	学生食堂	**本日施工内容**：七层、八层、九层墙体砌筑，构造柱模板支设，砼浇筑，机电安装二次配管；东侧模板木枋材料清理
		整体完成情况：二次结构完成 68%；机电安装完成 5%
14	35Kv 变电站	未施工
15	垃圾站	未施工
16	人员情况	八局今日劳动力人数 542 人。三局今日劳动力人数 588 人。

三、物资进场情况

中建八局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
混凝土	C20	180m³			
混凝土实心砌块	200×240×600mm	120m³			
混凝土实心砌块	100×240×600mm	20m³			
小灰砖	190×53×90mm	16000 块			
中建三局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
加气块		270.2m³	合格		
小砖		1.6 万块	合格		

四、工程进度情况

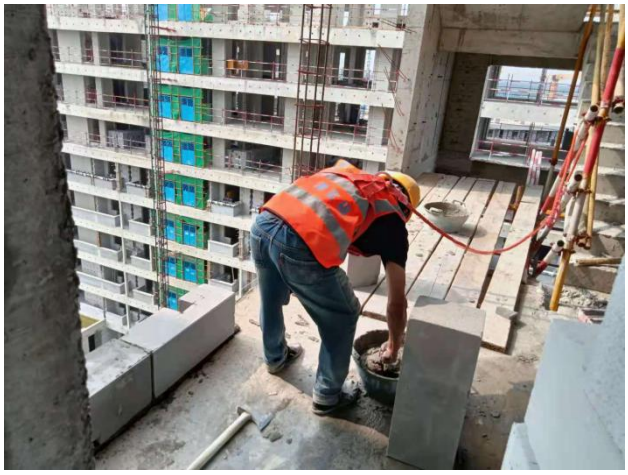
一标段	图书馆	本日施工内容:地库砌筑、构造柱支模；首层砌筑；二层打植筋孔，D1、D4 区植筋；D2/D3 四层竖向钢筋绑扎；钢结构屋面钢梁吊装；中庭钢楼梯安装；消防管道主管道 A6-A7 安装，地下室通风管道安装，空调水主管道安装。
		总体完成情况:砌筑完成 25%，钢结构安装 63%，地库机电安装 42%。
	机场学院教学实验楼	本日施工内容：污水管安装；雨水管安装；二层风管安装；三层桥架安装；四层桥架安装、消防水管安装
		总体完成情况：砌筑完成 70%，机电安装完成 20%
	公共教学楼	本日施工内容：四层砌筑；三层构造柱浇筑；首层砌筑，植筋；二层通风管道安装；二层桥架安装；三层桥架支架安装；二层消防水管安装；四层消防水管安装；雨水管安装；污水管安装。
		总体完成情况：砌筑完成 77%，机电安装完成 22%
	飞行乘务大楼及模拟舱楼	本日施工内容：三层 1、2 段砌筑，3，4 段砌筑；一层 3、4 段地面浇筑；四层一段砌筑；二层水暖立管安装、桥架安装、通风管道安装
		总体完成情况：砌筑完成 42%，机电安装 11%
二标段	体育馆	**本日施工内容**：首层基础墙体开槽、回填、砌筑，圈梁植筋钢筋绑扎，圈梁模板支设，游泳馆高支模架体拆除材料归码，钢结构桁架拼装、立柱吊装
		整体完成情况：体育馆游泳馆高支模顶板梁模板拆除完成 60%；二次结构施工完成 6%；钢结构完成 7%；机电安装完成 4%。
	师生活动中心	**本日施工内容**：屋面墙体砌筑，机电安装二次配管，裙房管沟抽水、顶板模板支设，裙房周围材料归码
		整体完成情况：主体结构完成 96%，主楼二次结构完成 86%；机电安装完成 8%
	指挥部	**本日施工内容**：收尾销项整改，草皮养护，空调调试
		整体完成情况：精装修完成、外立面完成、园林景观完成
	学生食堂	**本日施工内容**：首层墙体砌筑，构造柱模板支设、砼浇筑，机电安装二次配管，风管安装
		整体完成情况：食堂二次结构完成 78%，机电安装完成 6%
	1#学生宿舍	**本日施工内容**：A 段六层墙体砌筑，B 段三层砌筑，构造柱模板支设，砼浇筑，机电安装二次配管，风管安装
		整体完成情况：二次结构完成 82%；机电安装完成 7%
	2#学生宿舍	**本日施工内容**：六层墙体砌筑，构造柱模板支设，砼浇筑，机电安装二次配管，风管安装
		整体完成情况：二次结构完成 82%；机电安装完成 7%
	3#学生宿舍	**本日施工内容**：首层、六层、八层、九层墙体砌筑，构造柱模板支设，砼浇筑，机电安装二次配管，风管安装；东侧材料清理退场
		整体完成情况：二次结构完成 62%；机电安装完成 7%

	4#学生宿舍	**本日施工内容**：六层墙体砌筑，构造柱模板支设，砼浇筑，机电安装二次配管；西层材料清理退场
		整体完成情况：二次结构完成 62%；机电安装完成 7%
	5#学生宿舍	**本日施工内容**：七层、八层、九层墙体砌筑，构造柱模板支设，砼浇筑，机电安装二次配管；东侧模板木枋材料清理
		整体完成情况：二次结构完成 68%；机电安装完成 5%

五、现场作业影像

<table>
<tr><td colspan="2">中建八局（一标段）</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>实验楼采光顶软平台验收</td><td>材料退场</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>飞行乘务大楼钻心取样</td><td>教学楼钻心取样</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>教学楼四层砌筑</td><td>飞乘 4 段地面混凝土浇筑</td></tr>
</table>

中建三局（二标段）	
	
首层基础墙体开槽、回填、砌筑，圈梁植筋钢筋绑扎，圈梁模板支设，游泳馆高支模架体拆除材料归码，钢结构行架拼装、立柱吊装	指挥部室内收尾销项整改，草皮养护
	
师生活动中心主楼屋面墙体砌筑，机电安装二次配管；裙房管沟抽水、顶板模板支设；裙房周围材料归码	学生食堂首层墙体砌筑，构造柱模板支设、砼浇筑，机电安装二次配管，风管安装
	
1#学生宿舍 A 段六层墙体砌筑，B 段三层砌筑，构造柱模板支设，砼浇筑，机电安装二次配管，风管安装	2#学生宿舍六层墙体砌筑，构造柱模板支设，砼浇筑，机电安装二次配管，风管安装

	
3#楼首层、六层、八层、九层墙体砌筑，构造柱模板支设，砼浇筑，机电安装二次配管，风管安装；东侧材料清理退场	4#楼六六层墙体砌筑，构造柱模板支设，砼浇筑，机电安装二次配管；西侧材料清理退场
	
5#楼七层、八层、九层墙体砌筑，构造柱模板支设，砼浇筑，机电安装二次配管；东侧模板木枋材料清理	
