建设单位：中国民航大学宁河校区

施工单位：中国建筑第八工程有限公司（一标段）

中国建筑第三工程有限公司（二标段）

监理单位：全资

日期：2021 年 3 月 31 日星期三

天气：晴朗，风力中等

【目录】

一.　工地疫情防护情况

二.　现场人员设备情况

三.　材料物资进场情况

四.　工程进度情况

五.　现场作业影像

一、疫情防控情况

按本项目疫情防控工作方案和应急预案抓好工地常态化疫情防控工作，防疫物资储备充足，无疫情发生。

二、现场人员设备情况

中建八局（一标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建八局	42	9	现场管理、方案编制
天宇信达	5	326	图书馆一次结构
肥城环宇	1	13	机电安装
北京慧欣	2	29	机电安装
永达保信	1	12	文明施工
天津金拓	1	1	降水运行
天津科顺	1	0	防水施工
唐山彬达	7	443	教学组团一次结构
东方城	4	5	钢结构施工
福建聚利	2	3	幕墙安装
合计	66	892	
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
挖掘机	200 型	良好	1
叉车		良好	2
洒水车		良好	1
雾炮车		良好	2
钢筋切断机	40 型	良好	5
钢筋弯曲机	50 型	良好	5
钢筋调直机	50 型	良好	2
钢筋箍筋弯曲机	25 型	良好	3
吊车	70t	良好	1
吊车	25t	良好	0
自卸吊	8t	良好	1
吊车	50t	良好	1

中建三局（二标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	28/10	/	方案编制、现场施工管理
天津欣蕊	2/0	0/0	现场道路平整
三局二安	6/0	75/15	师生活动中心、学生食堂、宿舍楼、体育馆水电预留预埋
梁平荣安	20/0	662/83	模板支设、拆除、满堂架搭设，钢筋清理、绑扎；砼浇筑，清理现场
三局一公司钢构	4/0	10/0	师生活动中心构件吊装，高强螺栓，指挥部吊装，焊接，师生活动中心裙房 A 钢柱吊装完成，钢梁安装，高强螺栓安装
北京东方雨虹防水工程有限公司	1/0	8/0	体育馆四区地下室外墙防水施工
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	1
塔吊	TC6012	良好	2
	TC7013	良好	2
	XGT6513	良好	2
汽车吊	50t	良好	3
挖掘机	330 型	良好	1
	200 型	良好	0
	90 型	良好	2
自卸汽车	20m³	良好	3

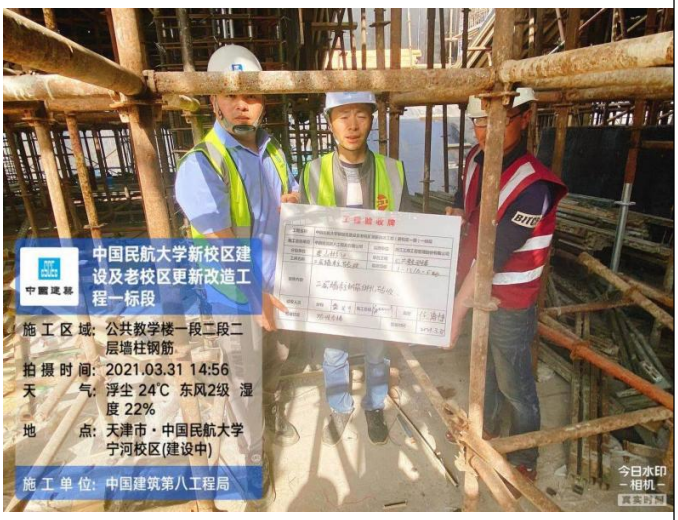
三、物资进场情况

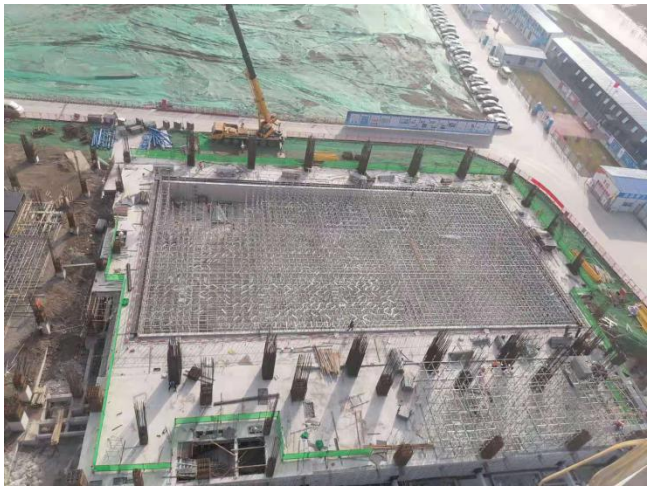
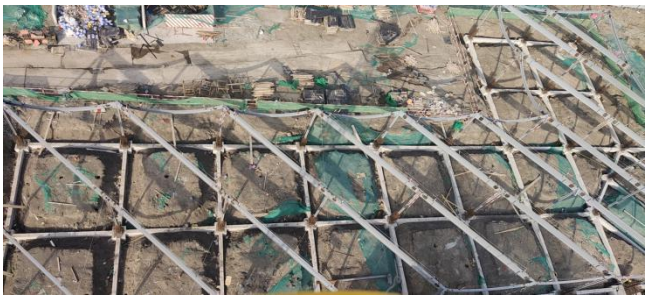
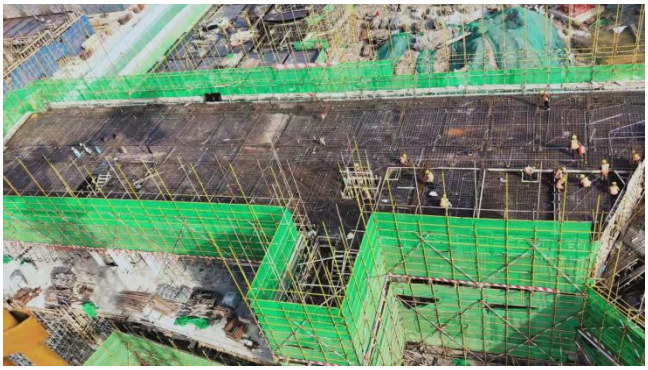
中建八局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
模板		50 包			模板
轮扣架		1000 根			轮扣架
木方		50 方			木方
中建三局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
模板		5100 平米	合格		
盘扣		72 吨	合格		
钢管		36 吨	合格		
扣件		36000 个	合格		

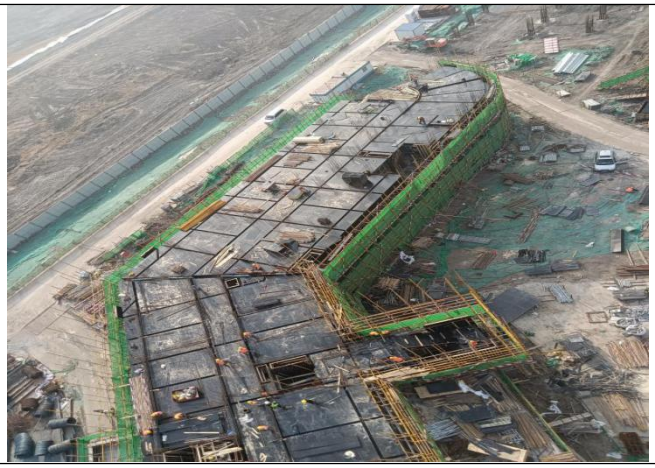
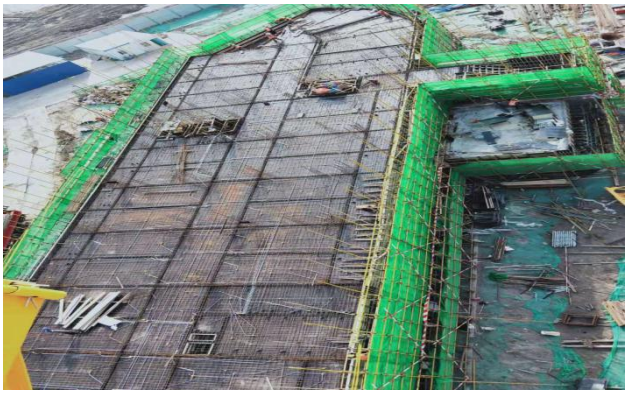
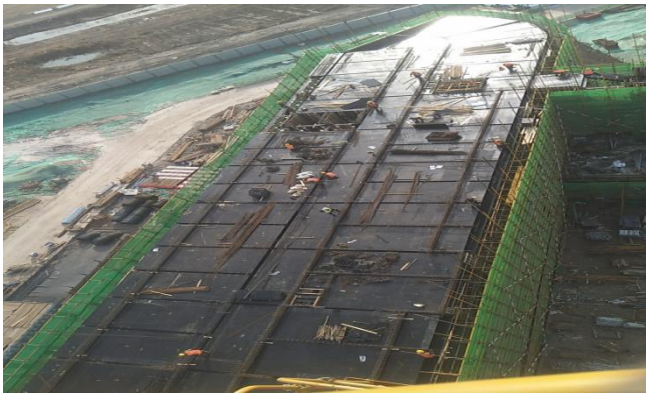
四、工程进度情况

中建八局 （一标段）	①图书馆 41 口井正常降水，8 口观测井水位正常；A1 区内架完成，钢柱安装完成，顶板配模完成，墙柱钢筋完成，梁筋绑扎完成 80%；A2 区内架完成，顶板配模完成，钢柱安装完成，墙柱钢筋完成，梁筋绑扎完成 80%，；A3 区内架完成，顶板配模完成，钢柱安装完成，墙柱钢筋完成，梁筋绑扎完成 80%；A4 区模板铺设完成，梁筋绑扎完成 50%；A5 区底板放线完成；A6 区底板钢筋验收完成；A7 区内架搭设完成；B1-B6 区内架完成，B1-B6 区模板搭设完成，B1-B5 墙柱绑扎完成，B2-B4 人防门安装完成；C1 区墙柱、梁顶板养护完成；C2 区顶板模板配制完成，梁板安装完成；C3 区顶板模板配制完成，梁板安装完成；C4 区顶板模板配制完成，梁板安装完成 90%；C5 区顶板模板配制完成，梁板安装完成 90%；C6 区顶板模板配制完成梁板安装完成 80%；C7 区模板配制完成。 ②机场学院教学实验楼二层模板工程完成，二层钢筋工程完成 80%，外架搭设完成。 ③公共教学楼二层模板工程完成，，二层架体搭设完成，二层钢筋完成 90%。 ④飞行乘务大楼首层 4 段钢筋验收完成，二层架体搭设完成，模板工程完成 90%。
中建三局 （二标段）	1、体育馆一区、二区首层顶板模板支设完成 80%，顶板梁钢筋绑扎完成 10%，体育馆体育馆三区满堂架搭设完成 85%，四区首层框架柱钢筋绑扎完成 40%，高支模架体搭设完成 15%；地下室防水完成 30%；师生活动中心高强螺栓安装，柱底灌浆，体育馆埋件预埋，指挥部焊接完成，师生活动中心裙房 A 钢柱吊装完成 100%，钢梁完成 100%，高强螺栓安装完成 60%，二层顶板砼浇筑完成；指挥部木结构材料拼装吊运完成 70%，指挥部幕墙立龙骨完成 60%，轻钢龙骨隔墙安装完成 5%，二次结构砌筑完成 40%。 2、1#B 段三层顶板支设完成，上铁钢筋绑扎完成，A 段 4 层顶板完成 80%，竖向模板完成 90%；2#四层竖向钢筋完成 80%；3#二层竖向模板完成 80%，顶板完成 90%；4#二层顶板支设完成，上铁绑扎完成 100%；5＃楼 4 层顶板完成 80%，竖向模板完成 80%； 3、食堂二段首层顶板浇筑混凝土，食堂一段、三段首层顶板支设完成，梁钢筋绑扎完成 80%，能源站首层顶板梁板支模完成 100%，梁钢筋完成 50%。

五、现场作业影像

<table>
<tr><td colspan="2">中建八局（一标段）</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆 A6 区底板验收</td><td>图书馆领导检查指导</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>公共教学楼二层墙柱钢筋验收</td><td>三间巡查</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>劳动竞赛启动仪式</td><td>劳动竞赛启动仪式</td></tr>
</table>

中建三局（二标段）	
	
体育馆一区、二区首层顶板模板支设完成 80%，顶板梁钢筋绑扎完成 10%	体育馆三区满堂架搭设完成 85%，四区首层框架柱钢筋绑扎完成 40%，高支模架体搭设完成 15%；地下室防水完成 30%
	
二层顶板砼浇筑完成	师生活动中心高强螺栓安装，柱底灌浆，师生活动中心裙房 A 钢柱吊装完成 100%，钢梁完成 100%，高强螺栓安装完成 60%
	
指挥部木结构材料拼装吊运完成 70%，指挥部幕墙立龙骨完成 60%，轻钢龙骨隔墙安装完成 5%，二次结构砌筑完成 40%	1#B 段三层顶板支设完成，上铁钢筋绑扎完成，A 段 4 层顶板完成 80%，竖向模板完成 90%

	
2#四层竖向钢筋完成 80%	3#二层竖向模板完成 80%，顶板完成 90%
	
4#二层顶板支设完成，上铁绑扎完成 100%	5#楼 4 层顶板完成 80%，竖向模板完成 80%
	
食堂二段首层顶板浇筑混凝土，食堂一段、三段首层顶板支设完成，梁钢筋绑扎完成 80%，能源站首层顶板梁板支模完成 100%，梁钢筋完成 50%	
