建设单位：中国民航大学宁河校区

施工单位：中国建筑第八工程有限公司（一标段）

中国建筑第三工程有限公司（二标段）

监理单位：全资

日期：2021 年 4 月 19 日星期一

天气：晴朗，风力中等

【目录】

一.　工地疫情防护情况

二.　现场人员设备情况

三.　材料物资进场情况

四.　工程进度情况

五.　现场作业影像

一、疫情防控情况

按本项目疫情防控工作方案和应急预案抓好工地常态化疫情防控工作，防疫物资储备充足，无疫情发生。

二、现场人员设备情况

中建八局（一标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建八局	42	9	现场管理、方案编制
天宇信达	5	336	图书馆一次结构
肥城环宇	1	13	机电安装
北京慧欣	2	29	机电安装
永达保信	1	20	文明施工
天津金拓	1	1	降水运行
天津科顺	1	2	防水施工
唐山彬达	7	439	教学组团一次结构
东方城	4	9	钢结构施工
福建聚利	2	3	幕墙安装
合计	66	861	
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
挖掘机	200 型	良好	1
叉车		良好	2
洒水车		良好	1
雾炮车		良好	2
钢筋切断机	40 型	良好	5
钢筋弯曲机	50 型	良好	5
钢筋调直机	50 型	良好	2
钢筋箍筋弯曲机	25 型	良好	3
吊车	70t	良好	0
挖机	60 型	良好	1
十轮		良好	1
吊车	50t	良好	1

中建三局（二标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	28/10	/	方案编制、现场施工管理
天津欣蕊	2/0	0/0	
三局二安	6/0	75/45	师生活动中心、学生食堂、宿舍楼、体育馆水电预留预埋
梁平荣安	20/0	668/365	模板支设、拆除、满堂架搭设，钢筋清理、绑扎；砼浇筑，清理现场
三局一公司钢构	4/0	10/0	师生活动中心钢梁安装，高强螺栓安装，电梯井钢梁吊装，指挥部防火涂料喷涂
北京东方雨虹防水工程有限公司	1/0	0/0	
山东海灏装饰设计有限公司	4/0	39/15	指挥部木结构材料拼装吊运，指挥部幕墙材料进场下料，立龙骨，轻钢龙骨隔墙安装，二次结构砌筑
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	1
塔吊	TC6012	良好	2
	TC7013	良好	2
	XGT6513	良好	2
汽车吊	50t	良好	2
挖掘机	330 型	良好	0
	200 型	良好	0
	90 型	良好	0
自卸汽车	20m³	良好	0

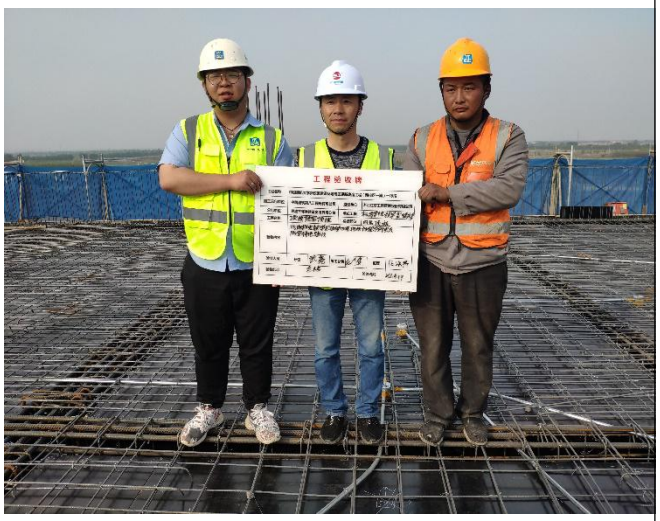
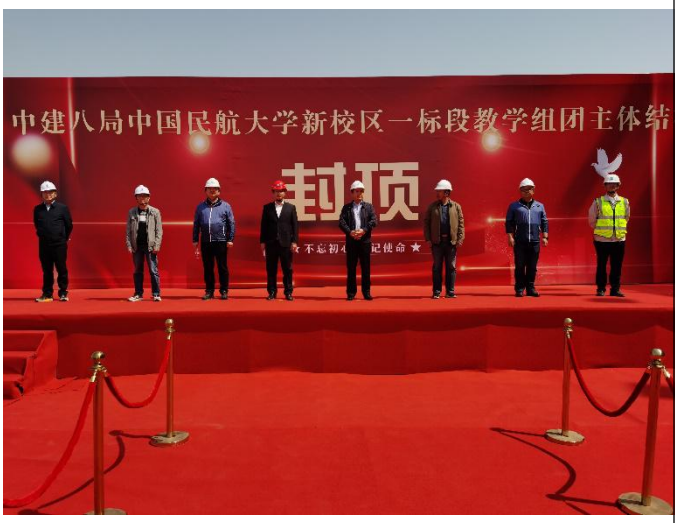
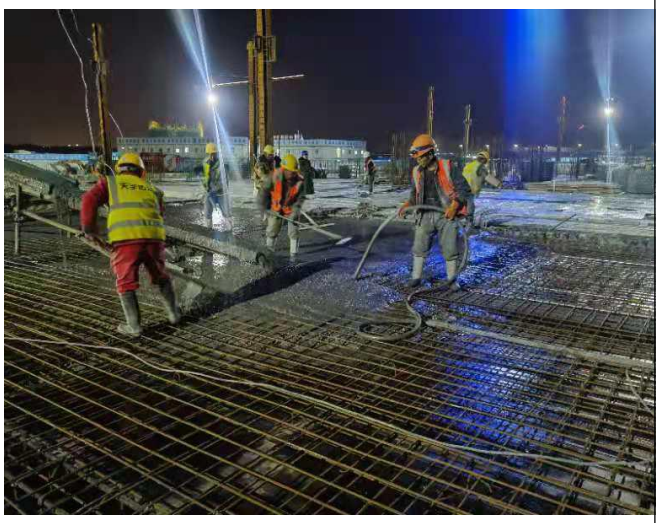
三、物资进场情况

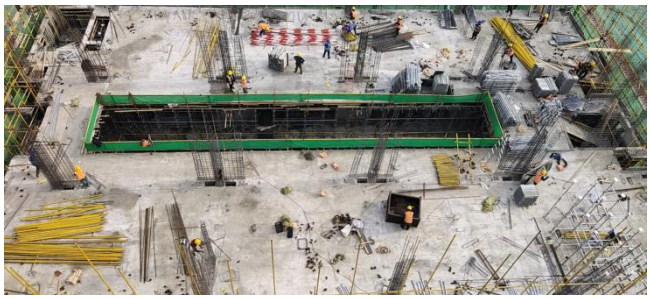
中建八局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
混凝土	C30-C50	600m³	已检验	已做试块	无
中建三局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
盘扣		38 方	合格		
钢管		36 吨	合格		

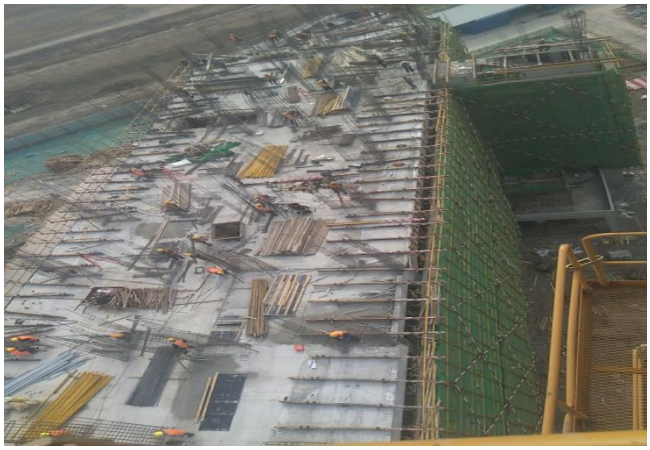
四、工程进度情况

中建八局 （一标段）	①图书馆 41 口井正常降水，8 口观测井水位正常； A 区地库顶板混凝土浇筑完成，A 区首层顶板支模架体搭设完成 50%，首层顶板支模完成 40%，首层墙柱钢筋绑扎完成 40%，首层钢柱吊装完成 100%，B 区、C 区地库顶板混凝土浇筑完成 90%。外墙修补及清理完成 60%。 ②机场学院教学实验楼 4 层 1 段混凝土开始浇筑，4 层 2 段钢筋绑扎完成 90%。 ③公共教学楼 3 层模板完成 100%，钢筋完成 85%。 ④飞行乘务大楼 3 层模板完成 90%，钢筋完成 70%。 ⑤模拟舱 2 层模板完成，钢筋完成 100%。
中建三局 （二标段）	1、体育馆一区、二区首层柱、顶板砼浇筑进行中，台阶、看台模板支设完成，台阶斜梁钢筋绑扎完成 30%，三区顶板模板支设完成 95%，顶板梁钢筋绑扎完成 50%，4#台阶模板支设完成 30%，四区高支模区域架体搭设完成 93%，框架柱钢筋绑扎完成 80%；师生活动中心裙房 A 钢梁焊接完成 60%，师生活动中心主楼五层墙柱墙柱钢筋绑扎完成 50%；指挥部木结构满焊完成 99%，幕墙材料进场下料，竖铝龙骨，满焊完成 98%，二次结构砌筑完成 100%，墙面抹灰完成 10%，轻钢龙骨隔断封板完成 31%，木望板安装完成 4%。 2、1#B 段五层顶板浇筑完成。A 段 6 层竖向钢筋绑扎完成 100%，模板及满堂架完成 100%；2#6 层竖向钢筋 100%；3#四层顶板浇筑完成；4#五层竖向钢筋完成 100%；5＃楼 6 层悬挑架施工； 3、食堂二段二层顶板浇筑完成，备料。食堂一段二层顶板完成 100%，梁钢筋完成 100%，下铁钢筋 50%

五、现场作业影像

<table>
<tr><td colspan="2">中建八局（一标段）</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>教学实验楼 4 层钢筋验收</td><td>教学实验楼 4 层机电预留预埋验收</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>教学实验楼主体结构封顶仪式</td><td>图书馆 A6 顶板混凝土浇筑</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>公共教学楼模板拆除</td><td>图书馆外架抗冲钢板网安装</td></tr>
</table>

中建三局（二标段）	
	
体育馆一区、二区首层柱、顶板砼浇筑进行中，台阶、看台模板支设完成，台阶斜梁钢筋绑扎完成 30%	三区顶板模板支设完成 95%，顶板梁钢筋绑扎完成 50%，4#台阶模板支设完成 30%，四区高支模区域架体搭设完成 93%，框架柱钢筋绑扎完成 80%
	
师生活动中心裙房 A 钢梁焊接完成 60%，基础回填土完成；	师生活动中心主楼五层墙柱墙柱钢筋绑扎完成 50%
	
指挥部木结构满焊完成 99%，幕墙材料进场下料，竖铝龙骨，满焊完成 98%，二次结构砌筑完成 100%，墙面抹灰完成 10%，轻钢龙骨隔断封板完成 31%，木望板安装完成 4%	1#B 段五层顶板浇筑完成。A 段 6 层竖向钢筋绑扎完成 100%，模板及满堂架完成 100%

	
2#6 层竖向钢筋 100%	3#四层顶板浇筑完成
	
4#五层竖向钢筋完成 100%	5#楼 6 层悬挑架施工
	
食堂二段二层顶板浇筑完成，备料。食堂一段二层顶板完成 100%，梁钢筋完成 100%，下铁钢筋 50%	
