中国民航大学宁河校区 11 月 05 日工程日报

一、施工概要

1	图书馆	**本日施工内容:**二次结构施工；钢结构屋面钢梁吊装； 抹灰施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；地库顶板防水；现场文明施工清理
		总体完成情况:图书馆二次结构砌筑施工完成 98%；抹灰完成 87%；钢结构安装完成 97%；机电管线安装 77%；幕墙安装完成 52%；地库顶板防水完成 50%；
2	机场学院教学实验楼	**本日施工内容:**抹灰施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理；地面贴砖；
		总体完成情况: 机电管线安装 81%；幕墙安装完成 55%；地面贴砖施工完成 30%；
3	公共教学楼	**本日施工内容:** 抹灰施工；幕墙施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理；地面贴砖；
		总体完成情况: 机电管线安装完成 81%； 幕墙安装完成 42%；钢连廊施工完成 95%； 地面贴砖完成 40%
4	飞行乘务大楼及模拟舱楼	**本日施工内容**:幕墙龙骨施工；门窗副框施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理；模拟舱钢结构施工；模拟舱砌筑；
		总体完成情况: 机电管线安装完成 77%；幕墙采光顶安装完成 97%；混凝土地面施工完成 100%;副框安装完成 91%；模拟舱钢结构施工完成 100%；模拟舱砌筑完成 25%；
5	体育馆	**本日施工内容：**首层墙体砌筑，反坎、构造柱、系梁支模，二层系梁构造柱拆模，三层窗台压顶支模，钢结构桁架拼装焊接。机电安装综合支架、风管、桥架安装。攀岩走廊施工，幕墙埋件安装，金属屋面支座材料进场，墙体拉毛挂网.
		整体完成情况：二次结构施工完成 80%，粗装修完成 15%；钢结构完成 99%；机电安装完成 35%，攀岩走廊施工 80%；
6	师生活动中心	**本日施工内容：**主楼楼内地面基层清理，外墙保温，施工裙房电缆沟抽水。机电安装样板间变更点配管。
		整体完成情况：主体结构完成 99%；二次结构完成 100%；主楼粗装修完成 90%；机电安装完成 76%
7	学生食堂	**本日施工内容：**食堂抹灰，能源站地面细石混凝土完成，幕墙安装副框，复查窗口尺寸完成。机电安装综合支架、风管、消防管加工，桥架、风管安装；食堂走廊找平层施工。
		整体完成情况：能源站二次结构完成 95%，初装修完成 50%，屋面完成 30%;学生食堂二次结构完成 100%,粗装修完成 70%，屋面工程完成 20%，外幕墙完成 20%，机电安装完成 46%。
8	1#学生宿舍	**本日施工内容：**1#楼 A 段外墙保温施工；机电安装消防穿电线，卫生间风阀安装，风管保温；B 段外墙保温施工。室内电梯轿厢安装；2-4 层墙面腻子施工；2 层地面贴砖

		整体完成情况：粗装修完成 90%，精装修完成 15%，屋面工程完成 90%；外墙保温完成 29%；机电安装完成 61％。窗户工程完成 50%；电梯工程完成 80%；	
9	2#学生宿舍	**本日施工内容：**3-4 层墙体腻子施工,2 层地面贴砖,裙房屋面防水施工。机电安装消防穿线，连廊桥架安装，风管安装。外墙保温施工；室内电梯轿厢安装；	
		整体完成情况：粗装修完成 91%；精装修完成 10%，屋面工程完成 100%；外墙保温完成 42%；机电安装完成 61％；窗户工程完成 50%；电梯工程完成 80%；	
10	3#学生宿舍	**本日施工内容**：3 层地面防潮层施工；外墙保温施工；机电安装风管安装，出户管连接桥架，室内穿电线。地面基层清理，屋面防水施工、抹灰施工。	
		整体完成情况：二次结构完成 98%；粗装修完成 75%，精装修完成 5%；屋面工程完成 55%；机电安装完成 53％；外保温工程完成 8%；窗户工程完成 10%；	
11	4#学生宿舍	**本日施工内容**：6 层防潮层施工，屋面防水施工；外墙保温施工；机电安装消防管安装。屋面防水施工；3 层地暖管铺设；	
		整体完成情况：粗装修完成 75%，精装修完成 8%；屋面工程完成 60%；机电安装完成 55％；外保温工程完成 8%；窗户工程完成 10%；	
12	5#学生宿舍	**本日施工内容**：外墙保温施工；机电安装水管施工，消防箱安装。室内电梯导轨放线、安装；9 层铺设地暖管；屋面防水施工；7-9 层主框安装；	
		整体完成情况：粗装修完成 80%，精装修完成 10%；屋面工程完成 50%；机电安装完成 57％；窗户工程完成 30%；外保温工程完成 9%；	
13	35Kv 变电站	设备基础施工	
14	垃圾站	未施工	
15	弱电专项施工（江森自控）	宿舍楼	**本日施工内容：**现场敷管作业
			总体完成情况： 2#宿舍楼 1 层敷管作业，总体完成 95%。3#宿舍楼 1 层敷管作业，总体完成 92%。食堂 1、2 层划线作业，总体完成 10%。图书馆 B1 开槽作业，总体完成 3%.飞乘楼 3 层开槽作业，总体完成 15%。
16	能源专项施工（恒益建安）	能源站	**本日施工内容：**能源站内排水

			整体完成情况：能源站内排水 100%
		中深层地源热井	**本日施工内容：**中深层地源热井钻井经校方研究通过延伸 200 米，第二口井位从新选址待上会批准
			整体完成情况：中深层地源热井钻井延伸 200 米已经完成；井深 2210 米；第二口井位从新选址待上会批准
		浅层地源热井	**本日施工内容：**浅层地源热井钻井；浅层钻机已经进场 5 台电力负荷不足
			整体完成情况：浅层地源热井钻井完成 4 口，累计完成 51 口；浅层钻机已经进场 5 台电力负荷不足无法开钻
17	中铁五局	项目部	**本日施工：** 1.师生活动中心东侧场地清淤平整；图书馆东侧开槽作业
			整体完成情况：图书馆东侧开槽作业完成 10%
18	人员情况	八局今日劳动力人数 557 人。三局今日劳动力人数 522 人。中铁五局今日劳动力人数 28 人，江森自控今日劳动人数 34 人，恒益建安今日劳动人 36 人。	

二、监理日报

一标段：

1.现场巡视。检查图书馆钢结构屋面钢梁吊装、钢结构焊接及焊缝质量；检查抹灰平整度、垂直度，机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场安全文明清理情况，施工正常。

2.现场巡视。检查实验楼抹灰施工；地面贴砖；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理；施工正常。

3.现场巡视。检查公共教学楼抹灰施工；地面贴砖；幕墙施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理；施工正常。

4.现场巡视。检查飞乘大楼幕墙龙骨施工；门窗副框施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理；施工正常。

5.现场巡视。检查模拟舱钢结构施工；模拟舱砌筑完成情况，施工正常。

二标段：

1. 对体育馆钢构件焊接质量巡视检查，对体育馆机电安装的支吊架安装质量进行现场巡查，对体育馆攀岩走廊杆件焊接进行巡检，检查高空作业人员安全带佩戴情况，未发现安全隐患，对体育馆航天云钢构件吊装进行巡检，对体育馆二次结构墙体砌筑及抹灰进行巡检。检查符合要求。

2. 监理部对师生活动中心机电安装的水、电及风管安装施工巡视检查、外墙保温进行巡视检查，符合设计及规划要求。

3. 监理部对学生食堂机电安装的水、电及风管安装施工巡视检查，食堂屋顶找平层施工巡视检查，督促现场工人高处作业做好安全防护措施。

4. 对 5 号楼窗框安装 4 层刮腻子，2 号楼地砖铺设，1 层刮腻子，所以宿舍楼外墙保温施工进行巡检。水电风管安装施工进行巡检。

室外、能源及弱电：

1. 能源：能源站内排水；中深层地源热井钻井经校方研究通过延伸 200 米，第二口井位从新选址待上会批准；浅层地源热井钻井；浅层钻机已经进场 5 台电力负荷不足，无法开钻。
2. 弱电：现场敷管作业，施工正常。
3. 室外：对对师生活动中心东侧场地清淤平整；图书馆东侧开槽作业进行巡检。

三、监理明日工作安排

标段划分	单体名称	监理人员	施工内容	监理工作时间、内容及路线	备注
一标段 刘刚 （15162265570）	图书馆	刘刚 （18082566239）	钢结构施工、二次结构施工	对图书馆施工进行巡视检查	
		张春博 （13027722180）		对图书馆施工进行巡视检查，旁站砼浇筑施工	
		刘浩 （13400385767）		对图书馆施工进行巡视检查，旁站砼浇筑施工	
	教学组团	任海博 （18082566239）	二次结构施工	对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查，旁站砼浇筑。	
		马瑞峰 （15614235758）		对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查。	
	所有单体安装工程	滕洪亮 （13234049175） 张春博 （13027722180）	给排水及消防工程、暖通工程、机电安装工程施工	对现场施工巡视检查	
二标段 林利民 （18640512507）	体育馆	丁建泽 （18845226778） 杨宸 （13364468744） 党泽南 （13630253982）	钢结构施工、二次结构施工	对现场施工进行巡视检查，钢构件焊接巡检	
	师生活动中心		地暖管施工	对现场施工巡视检查	

	4#、5#学生宿舍	吕非凡（17532527058） 马一博（17692498058）	地暖管施工、抹灰施工	对学生宿舍地暖施工，墙体抹灰施工进行巡视检查	
	1#、2#、3#学生宿舍、食堂	董鑫鑫（1803233772） 乔天航(18547607857) 丁建泽（18845226778）	抹灰施工、防潮层施工、外墙保温施工	对学生宿舍、学生食堂屋面砌筑施工，墙体抹灰施工进行巡视检查	
	垃圾房		未施工	未施工	
	35kv 变电站		设备基础施工	对现场施工巡视检查	
	所有单体安装工程	滕洪亮（13234049175） 乔天航(18547607857)	给排水及消防工程、暖通工程、机电安装工程施工	对现场施工巡视检查	
室外	一标段	刘刚（18082566239） 任海博（18082566239） 刘浩（13400385767）	室外管网施工	对管网现场施工巡视检查	

	二标段	林利民（18640512507） 滕洪亮（13234049175） 乔天航(18547607857)	室外管网施工	对管网现场施工巡视检查	
弱电	一标段	刘刚（18082566239）	现场敷管作业	对现场施工巡视检查	
	二标段	滕洪亮（13234049175）	现场敷管作业	对现场施工巡视检查	
能源	二标段	滕洪亮（13234049175） 乔天航(18547607857)	中深层井钻井施工、浅层井施工	对现场施工巡视检查，旁站中深层钻井施工	

三、监理明日工作安排

标段划分	单体名称	监理人员	施工内容	监理工作时间、内容及路线	备注
一标段 刘刚 （15162265570）	图书馆	刘刚（18082566239）	钢结构施工、二次结构施工	对图书馆施工进行巡视检查	
		张春博（13027722180）		对图书馆施工进行巡视检查，旁站砼浇筑施工	
		刘浩（13400385767）		对图书馆施工进行巡视检查，旁站砼浇筑施工	

	教学组团	任海博（18082566239）	二次结构施工	对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查，旁站砼浇筑。	
		马瑞峰（15614235758）		对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查。	
	所有单体安装工程	滕洪亮（13234049175） 张春博（13027722180）	给排水及消防工程、暖通工程、机电安装工程施工	对现场施工巡视检查	
二标段 林利民 （18640512507）	体育馆	丁建泽（18845226778） 杨宸（13364468744） 党泽南（13630253982）	钢结构施工、二次结构施工	对现场施工进行巡视检查，钢构件焊接巡检	
	师生活动中心		地暖管施工	对现场施工巡视检查	
	4#、5#学生宿舍	吕非凡（17532527058） 马一博（17692498058）	地暖管施工、抹灰施工	对学生宿舍地暖施工，墙体抹灰施工进行巡视检查	
	1#、2#、3#学生宿舍、食堂	董鑫鑫（1803233772） 乔天航(18547607857) 丁建泽	抹灰施工、防潮层施工、外墙保温施工	对学生宿舍、学生食堂屋面砌筑施工，墙体抹灰施工进行巡视检查	
	垃圾房		未施工	未施工	

	35kv 变电站		设备基础施工	对现场施工巡视检查	
	所有单体安装工程	滕洪亮（13234049175） 乔天航(18547607857)	给排水及消防工程、暖通工程、机电安装工程施工	对现场施工巡视检查	
室外	一标段	刘刚（18082566239） 任海博（18082566239） 刘浩（13400385767）	室外管网施工	对管网现场施工巡视检查	
	二标段	林利民（18640512507） 滕洪亮（13234049175） 乔天航(18547607857)	室外管网施工	对管网现场施工巡视检查	
弱电	一标段	刘刚（18082566239）	现场敷管作业	对现场施工巡视检查	
	二标段	滕洪亮（13234049175）	现场敷管作业	对现场施工巡视检查	

能源	二标段	滕洪亮 （13234049175） 乔天航 (18547607857)	中深层井钻井施工、浅层井施工	对现场施工巡视检查，旁站中深层钻井施工	

四、施工单位日报

一标段施工日报

	中国建筑　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告								表格编号	
									CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101	
项目名称	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：186	2021 年 11 月 5 日								√	
作业计划编号		天气	非常晴朗☐ 晴朗☑ 多云☐ 雨☐ 雪☐ 霾☐							
施工部位	图书馆 机场学院教学实验楼 公共教学楼 飞行乘务大楼及模拟舱楼	温度	≤0 度☐ 0 度～10 度☐ 10 度～21 度☑ 21 度～30 度☐ ≥30 度☐							
		风力	静风☑ 中等☐ 大风☐ 台风☐							
		湿度	干燥☑ 中等☐ 湿润 ☐							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建八局	40	40	现场管理、方案编制
肥城环宇	2	6	机电安装
北京慧欣	2	28	机电安装
中联盛	1	9	弱电
天津科顺	1	20	防水施工
东方诚	4	72	钢结构施工
福建聚利	5	70	幕墙安装
广坤腾阳	1	8	机电
鼎天幕墙	1	17	幕墙安装
天宇信达（二构）	5	179	二次结构施工
天津俊凯	2	13	机电通风
宏坤煜业	3	19	机电通风
恒福消防	1	6	机电消防
堡泰消防	1	16	机电消防
天河伟业	7	42	精装
八局装饰	2	5	精装
贵州中科	3	7	精装
合计	69	557	

	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告	表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
货用施工升降机	SC120/120	良好	6
物料提升机	AC/200	良好	1
叉车	1 台	良好	2
洒水车	1 辆	良好	1
雾炮车	2 台	良好	2
钢筋切断机	40 型	良好	1
钢筋弯曲机	50 型	良好	1
钢筋调直机	50 型	良好	2
钢筋箍筋弯曲机	25 型	良好	3
挖机	60 型	良好	1
挖机	200 型	良好	1

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

时间	姓名	单位	工作目的	备注

五、进度完成情况	图书馆	本日施工内容:二次结构施工；钢结构屋面钢梁吊装； 抹灰施工；机电安装给排水管道； 通风管道； 空调水管道； 地库顶板防水； 现场文明施工清理
		总体完成情况:图书馆二次结构砌筑施工完成 98%；抹灰完成 87%；钢结构安装完成 97%；机电管线安装 77%；幕墙安装完成 52%；地库顶板防水完成 50%；
	机场学院教学实验楼	本日施工内容:抹灰施工； 机电安装给排水管道； 通风管道； 空调水管道； 现场文明施工清理； 地面贴砖；
		总体完成情况： 机电管线安装 81%； 幕墙安装完成 55%； 地面贴砖施工完成 30%；
	公共教学	本日施工内容： 抹灰施工；幕墙施工；机电安装给排水管道；通风管道；空

	中国建筑　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告		表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
	楼	调水管道；现场文明施工清理；地面贴砖；	
		总体完成情况：机电管线安装完成 81%；幕墙安装完成 42%；钢连廊施工完成 95%；地面贴砖完成 40%	
	飞行乘务大楼及模拟舱楼	本日施工内容:幕墙龙骨施工；门窗副框施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理；模拟舱钢结构施工；模拟舱砌筑；	
		总体完成情况：机电管线安装完成 77%；幕墙采光顶安装完成 97%；混凝土地面施工完成 100%;副框安装完成 91%；模拟舱钢结构施工完成 100%；模拟舱砌筑完成 25%；	
六、业主监理指令			
七、安全管理情况	日常三间巡逻检查，裸土苫盖维护，现场排水，安全隐患排查以及整改		
八、技术质量管理	对防水清理、架体搭设、二次结构、幕墙安装、钢结构施工进行全过程质量监管，日常机械监测。		
九、过程关键文件			
十、本日重大事项	排烟机房拆改、三层连廊墙改防火窗及车库顶板风井改位置，全咨、校方及全审现场确认变更签证		
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：** 1、图书馆十字柱超薄型进口涂料由于体量太小，厂家不配合报价及施工，后期无法验收； 2、组团除首层幕墙外，2-4 层窗由于与原招标图纸存在差异，需要重新认质认价； 3、一标段施工整体泛光照明部分，目前幕墙即将进行外檐铝板安装，请协调尽快进场，以免后期影响施工: 4、教学组团区专业教室的效果图需要协调设计院抓紧出图，以进行后续的瓷砖封样工作； 5、现场涉及变更及结构拆改请业主尽快确认缩短流程以免影响施工进度； 6、工作联系单　关于教学组团外檐门窗调整的建议 请业主尽快回复； 7、工程联系函 关于图书馆照明灯具图纸及品牌明确事宜 请甲方尽快回复； 8、图书馆屋面钢结构防火涂料做法需要确认超薄型还是薄型。补充：如改为薄型，人工抹平同样增加成本。 9、工作联系单 关于甲方平行发包单位施工问题事宜 请尽快回复 10、钢结构图书馆金属屋面防火涂料需最终确认		
抄送	1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□； 5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□		

现场作业影像



图书馆钢结构屋面



图书馆架体搭设



模拟舱地面钢筋绑扎




模拟舱配电间砌筑





教学楼屋面巡查	模拟舱楼承板钢筋

现场航拍图 10.31

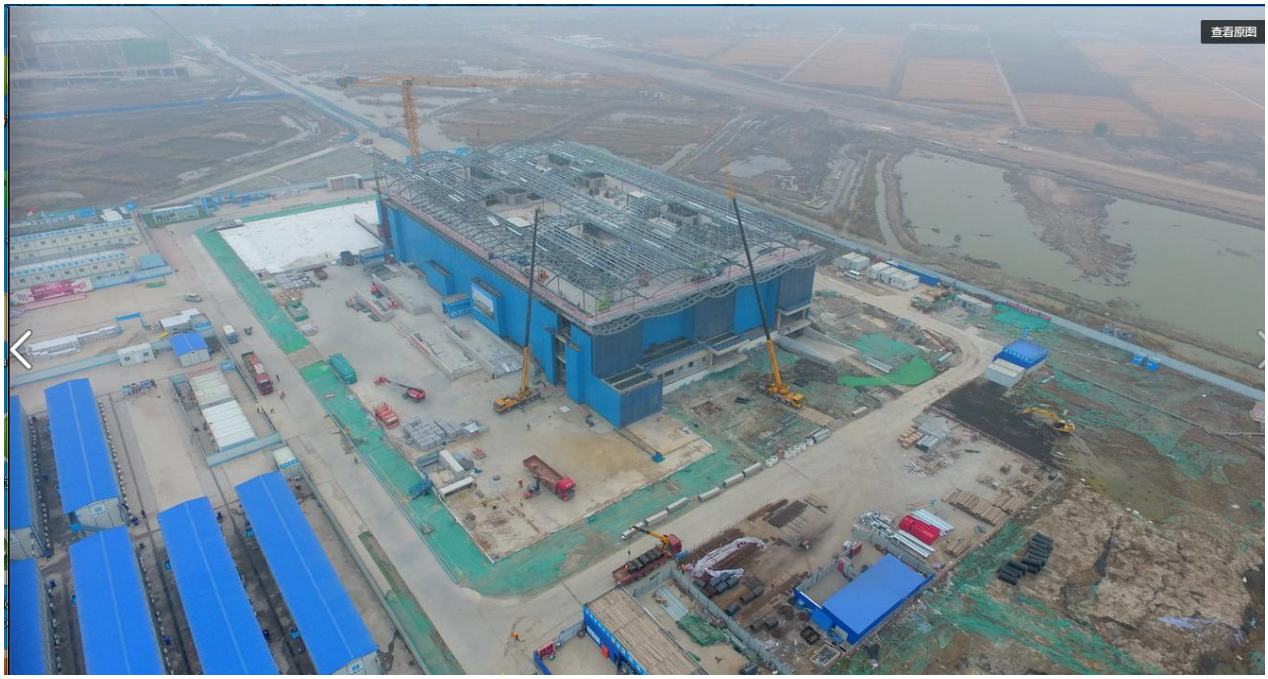






图书馆	实验楼



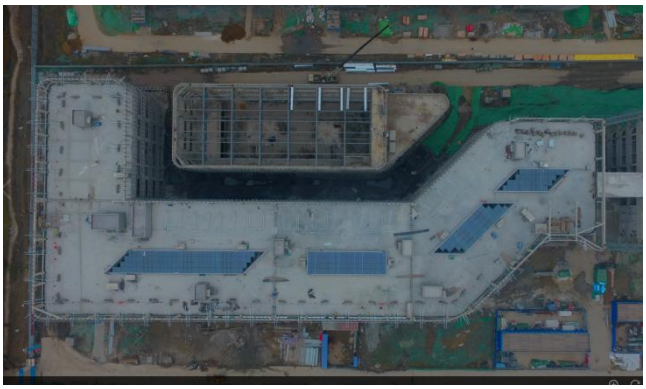

公共教学楼	飞行乘务大楼

二标段

	中国建筑　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告表								表格编号	
									ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101	
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程二标段									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：002	2021 年 11 月 5 日								√	
作业计划编号		天气	晴朗☐ 多云☐ 雨☐ 阴☑ 雪☐ 冰冻☐雾霾☑							
施工部位	1#-5#宿舍楼；食堂；指挥部；体育馆；师生活动中心	温度	≤0 度 ☐ 0 度～10 度☑ 10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐ ≥30 度 ☐							
		风力	静风☐ 中等☑ 大风 台风							
		湿度	干燥☐ 中等☑ 湿润☐							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	28/15	/	方案编制、现场施工管理
三局智能	2	/	BIM 建模
天津欣蕊	2/0	0/0	体育馆东侧回填
三局二安	8/0	156/20	师生活动中心变更点位开槽、宿舍楼穿线、排水施工，食堂地暖施工、体育馆二次配管风管水管桥架施工
梁平荣安	4/0	24/0	模板支设、拆除、材料堆码，钢筋清理、绑扎；南校门抽水，基槽清理，桩头处理
三局一公司钢构	4/0	18/5	体育馆钢结构屋面桁架拼接焊接、运输，航天云施工、攀岩走廊施工、
长沙广大	8/0	2/0	活动中心钢附框加工、安装、食堂幕墙龙骨局加工
兴华鑫宇	5/0	152/14	二次结构墙体砌筑，构造柱支模、系梁支模，墙面抹灰，地暖基层清理，墙面刮腻子
天津津宝福	5/0	95/15	二次结构墙体砌筑，构造柱支模、系梁支模，墙面抹灰，地暖基层清理，墙面刮腻子，地面浇筑
北京迈易格	5/0	10/0	钢副框安装、主框安装、幕墙图纸

	中国建筑　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告表		表格编号 ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101
			深化
东方雨虹（防水）	1/0	26/4	防潮层施工，屋面防水施工
东方雨虹（保温）	2/0	38/0	外墙保温施工
广日电梯	1/0	6/0	室内电梯安装
施工人员合计	75	528/58	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	1
物料提升机	SC100/100	良好	6
电梯	SC200/200	良好	3
汽车吊	25t	良好	2
挖掘机	330 型	良好	0
	200 型	良好	1
	90 型	良好	1
自卸汽车	20m³	良好	2
吊篮		良好	97

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注

五、施工完成情况	体育馆	**本日施工内容：**首层墙体砌筑，反坎、构造柱、系梁支模，二层系梁构造柱拆模，三层窗台压顶支模，钢结构桁架拼装焊接。机电安装综合支架、风管、桥架安装。攀岩走廊施工，幕墙埋件安装，金属屋面支座材料进场，墙体拉毛挂网.
		整体完成情况:二次结构施工完成 80%,粗装修完成 15%;钢结构完成 99%;机电安装完成 35%，攀岩走廊施工 80%;
	师生活动中心	**本日施工内容：**主楼楼内地面基层清理，裙房电缆沟抽水。机电安装样板间变更点配管。
		整体完成情况：主体结构完成 99%；二次结构完成 100%；主楼粗装修完成 90%；机电安装完成 76%
	学生食堂	**本日施工内容：**食堂抹灰，能源站地面细石混凝土完成，幕墙安装副框，复查窗口尺寸完成。机电安装综合支架、风管、消防管加工，桥架、风

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">中国建筑　项目管理表格</td></tr>
<tr><td>作业面\项目每日情况报告表</td><td>表格编号
ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101</td></tr>
<tr><td rowspan="12"></td><td rowspan="2"></td><td>管安装；食堂走廊找平层施工。</td></tr>
<tr><td>整体完成情况:能源站二次结构完成 95%,初装修完成 50%,屋面完成 30%;学生食堂二次结构完成 100%，粗装修完成 70%，屋面工程完成 20%，外幕墙完成 20%，机电安装完成 46%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1#学生宿舍</td><td>本日施工内容：1#楼 A 段外墙保温施工；机电安装消防穿电线，卫生间风阀安装，风管保温；B 段外墙保温施工。室内电梯轿厢安装；2-4 层墙面腻子施工；2 层地面贴砖</td></tr>
<tr><td>整体完成情况：粗装修完成 90%，精装修完成 15%，屋面工程完成 90%；外墙保温完成 29%；机电安装完成 61%。窗户工程完成 50%；电梯工程完成 80%;</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2#学生宿舍</td><td>本日施工内容：3-4 层墙体腻子施工,2 层地面贴砖,裙房屋面防水施工。机电安装消防穿线，连廊桥架安装，风管安装。外墙保温施工；室内电梯轿厢安装;</td></tr>
<tr><td>整体完成情况：粗装修完成 91%；精装修完成 10%，屋面工程完成 100%；外墙保温完成 42%；机电安装完成 61%；窗户工程完成 50%；电梯工程完成 80%;</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3#学生宿舍</td><td>本日施工内容:3 层地面防潮层施工;外墙保温施工;机电安装风管安装，出户管连接桥架，室内穿电线。地面基层清理，屋面防水施工、抹灰施工。</td></tr>
<tr><td>整体完成情况：二次结构完成 98%；粗装修完成 75%，精装修完成 5%；屋面工程完成 55%；机电安装完成 53%；外保温工程完成 8%；窗户工程完成 10%;</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4#学生宿舍</td><td>本日施工内容：6 层防潮层施工，屋面防水施工；外墙保温施工；机电安装消防管安装。屋面防水施工；3 层地暖管铺设;</td></tr>
<tr><td>整体完成情况：粗装修完成 75%，精装修完成 8%；屋面工程完成 60%；机电安装完成 55%；外保温工程完成 8%；窗户工程完成 10%;</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5#学生宿舍</td><td>本日施工内容：外墙保温施工；机电安装水管施工，消防箱安装。室内电梯导轨放线、安装；9 层铺设地暖管；屋面防水施工；7-9 层主框安装;</td></tr>
<tr><td>整体完成情况：粗装修完成 80%，精装修完成 10%；屋面工程完成 50%；机电安装完成 57%；窗户工程完成 30%；外保温工程完成 9%;</td></tr>
<tr><td>六、业主监理指令</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>七、安全管理情况</td><td colspan="2">1、对生活区进行检查；2、对现场临时用电进行检查；3、对整个施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改；抽水情况进行排查 4、现场疫情防控监察</td></tr>
<tr><td>八、技术质量管理情况</td><td colspan="2">1、对体育馆、食堂及宿舍楼墙体砌筑进行检查；2、对师生活动中心及宿舍楼墙体抹灰进行检查。3、BIM 建模幕墙、钢构、机电安装等</td></tr>
<tr><td>九、施工过程中关键</td><td colspan="2">/</td></tr>
</table>


	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101
问题来往文件记录		
十、本日重大事项	因中铁五局施工挖断电缆，1#、4#楼停工一天；	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：** 1、最终版学生宿舍及食堂设计精装修区域的最终方案及图纸；2、师生活动中心机电调整图纸；3、35KV 变电站施工单位进场，提供深化图纸；4、弱电单位楼内管线预留加快施工，目前宿舍楼已完成抹灰开始油工施工；	
抄送	1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□	

制，项目生产经理亲自填报整个项目部每日情况报告。报告包括的时间为当天上班时间到次日上班时间,提交报告的时间不迟于次日上午的 12 点。


现场施工影像




体育馆首层抹灰，二层、三层墙体砌筑、系梁、圈梁、构造柱支模,，钢结构航天云、V 字柱拼接、焊接工作。

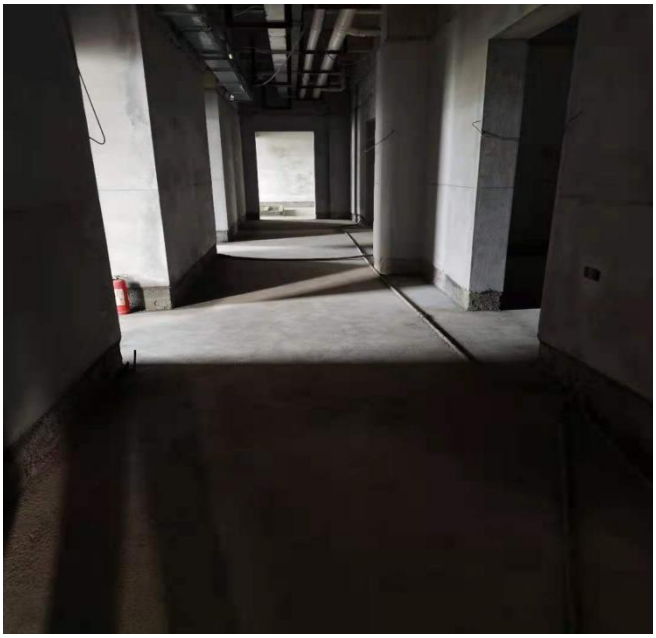

师生活动中心主楼楼内地面地暖打压完成，消防施工。钢附框塞口施工。

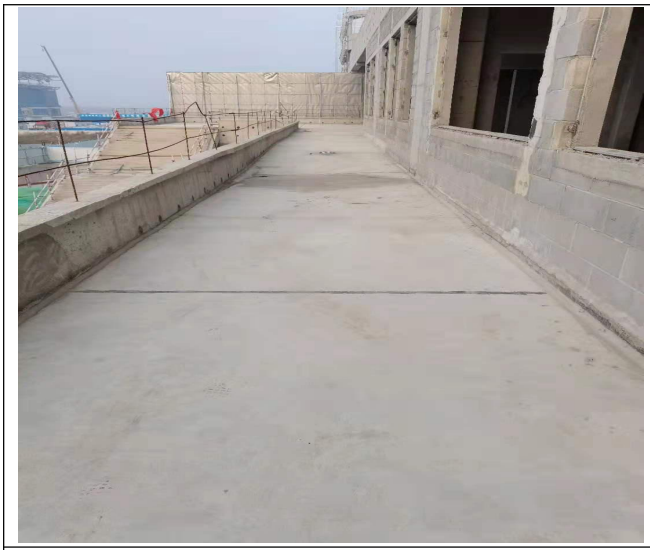	
食堂抹灰收尾施工、能源站抹灰施工，屋面防水施工，清理排水沟，机电加工风管；幕墙埋件安装，屋面清理，屋面找坡找平层施工，女儿墙变更切割，地面清理。	1#楼 A 段外墙保温施工,机电安装采暖管、消防管水平管安装;B 段外墙保温施工;2 层地面贴砖,电梯轿厢安装;
	
2#楼机电安装室内穿电线；外墙保温施工，2 层地面贴砖；室内电梯轿厢安装；3-5 层腻子施工；	3#楼首层、二层腻子施工；屋面防水层施工，十层地面基层清理；卫生间找平；外墙保温施工；
	

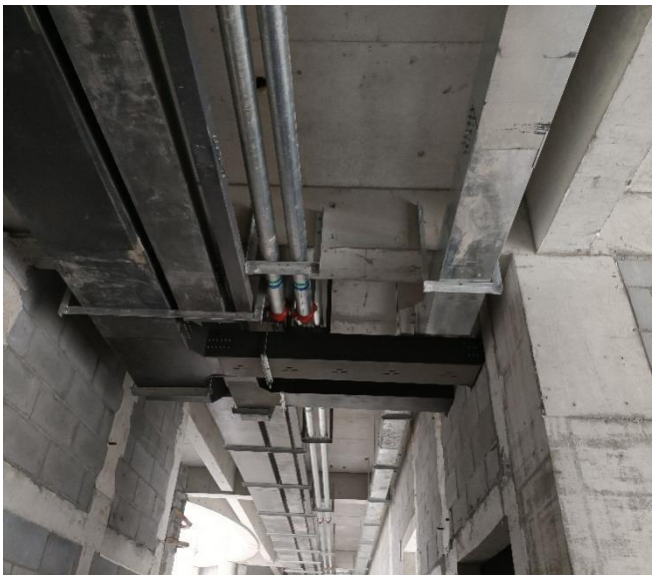4#楼 6 层防潮层施工；屋面防水施工；外墙保温施工；室内电梯导轨、轿厢安装；3 层地暖管铺设；	5#楼室内电梯导轨、轿厢安装；9 层地暖管铺设；外墙保温施工； 7-9 层主框安装；屋面防水施工；
	
食堂机电安装综合支架、风管、消防管加工，开槽及二次配管，风管安装，地暖施工。	体育馆机电安装综合支架、风管、桥架安装。
	
1#楼机电安装消防穿电线，卫生间风阀安装，风管保温。	2#楼机电安装消防穿线，连廊桥架安装。

	
3#楼机电安装出户管连接桥架，风管安装，穿电线。	4#楼机电安装消防管安装。
	
5#楼机电安装水管施工，消防箱安装。	

中铁五局室外项目施工日报

中国中铁	中国中铁　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告表						表格编号			
							ZTWJ-MHDX-SWGC-001			
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程室外施工									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：081	2021 年 11 月 5 日								√	
作业计划编号		天气	非常晴朗☐ 晴朗☐ 多云☑ 雨☐ 雾☑ 雪☐ 冰冻☐							
施工部位	师生活动中心东侧	温度	≤0 度☐ 0 度～10 度☐ 10 度～21 度☑ 21 度～30 度☐ ≥30 度☐							

中国中铁	中国中铁　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001

		风力	静风☑中等☐ 大风☐　台风☐
		湿度	干燥☐　中等☑　湿润☐

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数	作业工人数	主要工作内容
中铁五局	13	15	师生活动中心东侧清淤平整场地，图书馆东侧开槽作业
施工人员合计	13	15	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
挖掘机	210 型	良好	2
挖掘机	200 型	良好	1

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
/					

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				

五、施工完成情况	项目部	本日施工： 1.师生活动中心东侧场地清淤平整；图书馆东侧开槽作业
		整体完成情况：图书馆东侧开槽作业完成 10%
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、对现场机械进行安全检查；2、对施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改；3、施工人员班前喊话。	
八、技术质量管理情况	机械施工全过程质量监管，开槽全过程质量控制。	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	/	

中国中铁	中国中铁　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：** /	
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☑；5、项目生产经理（项目总工）☑；6、项目工程部☑；7、项目资料室☐	

现场施工影像









师生活动中心东侧场地清淤平整；图书馆东侧开槽作业

江森自控智慧校园建设弱电专项施工日报

Johnson Controls	**北京江森自控有限公司　项目管理表格**	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 JCI-CN23/21:1096 BJJSGCB-PM-2021003

项目名称	中国民航大学新校区智慧校园建设弱电专项施工									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：081	2021 年 11 月 5 日								√	
作业计划编号		天气	非常晴朗☐　晴朗☑多云☐　雨☐雪☐霾☐							
施工部位	全校区	温度	≤0 度☐　0 度～10 度☐　10 度～21 度☑ 21 度～30 度☐　≥30 度☐							
		风力	静风☑　中等☐　大风☐　台风☐							
		湿度	干燥☐　中等☑　湿润☐							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
北京江森自控有限公司	5	5	现场管理、专业设计
施工	29	29	弱电施工
合计	34	34	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
/			
/			
/	/	/	

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
/	/	/			

四、来访人员情况

时间	姓名	单位	工作目的	备注

五、进度完成情况	宿舍楼	本日施工内容：现场敷管作业
		总体完成情况： 2#宿舍楼 1 层敷管作业，总体完成 95%。3#宿舍楼 1 层敷管作业，总体完成

Johnson Controls	北京江森自控有限公司　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 JCI-CN23/21:1096 BJJSGCB-PM-2021003
		92%。食堂 1、2 层划线作业，总体完成 10%。图书馆 B1 开槽作业，总体完成 3%.飞乘楼 3 层开槽作业，总体完成 15%。
六、业主监理指令		
七、安全管理情况		
八、技术质量管理		
九、过程关键文件		
十、本日重大事项		
十一、明日施工计划		
十二、工作小结		
抄送	1、建设方代表□；2、工程监理□；3、项目经理□；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室£	

作业影像








天津民航大学
2021.11.05 14:38
施工区域 食堂二层
施工内容 食堂温控开关弹线
天气 晴 0°
地点 天津市·田辛庄互通立交


飞行楼3层，
飞行楼3层东，由南向北2
教室
2021/11/05 07:12


飞行楼3层北，由西向东1
教室
2021/11/05 07:15


飞行楼3层东，由北向南1
教室北门口外走道门楼


飞行楼3层北，由西向东1
教室门口走道
2021/11/05 16:09


飞行楼3层东，由北向南1
教室
2021/11/05 16:15


2021/11/05 10:06

开槽、敷管作业


中国民航大学（三局）
2021.11.05 06:25
施工区域 项目部
施工内容 班前教育
地 点 天津市·中国民航大学新校区
水印相机


06:45
2021-11-05
今日水印
-相机-
真实时间

班前教育


中国民航大学ELV
施工区域：师生活动中心
施工内容：样板间
拍摄时间：2021.11.05 14:44
天 气：轻度雾霾 14°C
地 点：天津市·七里海大道
今日水印
-相机-
真实时间

质量检查

恒益建安能源专项施工日报

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告表						表格编号			
							HYJA-MHDX-NYGC-001			
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程能源专项工程									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：0074	2021 年 11 月 5 日								√	
作业计划编号		天气	非常晴朗☐　晴朗☐ 多云☑　雨☐　　雪☐ 冰冻☐							
施工部位	能源站	温度	≤0 度☐　0 度～10 度☐ 10 度～21 度☐ 21 度～30 度☑　　≥30 度☐							
		风力	静风☐ 中等☐ 大风☐　　台风☐							
		湿度	干燥☐　中等☐　湿润☐							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数	作业工人数	主要工作内容
恒益建安	3	现场安排 10 人	能源站内排水；能源站联通食堂一层开挖
恒益建安	5	现场安排 22 人	中深层地源热井钻井经校方研究通过延伸 200 米，第二口井位从新选址待上会批准
恒益建安	1	现场安排 4 人	浅层地源热井钻井
施工人员合计		36 人	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
石油钻机	ZJ-30	良好	1
浅层钻机		良好	1

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				

五、施工完成情况	能源站	**本日施工内容：**能源站内排水
		整体完成情况：能源站内排水 100%

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 HYJA-MHDX-NYGC-001

施工完成情况	中深层地源热井	**本日施工内容：**中深层地源热井钻井经校方研究通过延伸 200 米，第二口井位从新选址待上会批准
		整体完成情况：中深层地源热井钻井延伸 200 米已经完成；井深 2210 米；第二口井位从新选址待上会批准
	浅层地源热井	**本日施工内容：**浅层地源热井钻井；浅层钻机已经进场 5 台电力负荷不足
		整体完成情况：浅层地源热井钻井完成 4 口，累计完成 51 口；浅层钻机已经进场 5 台电力负荷不足无法开钻
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、对中深层地源热井现场安全操作进行巡视检查。	
八、技术质量管理情况	1、对能源站的临电进行安全专项检查	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	/	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：**	
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☐；5、项目生产经理（项目总工）☐；6、项目工程部☐；7、项目资料室☐	

现场施工影像

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">能源站内排水、浅层地源热井钻井；第二口井位从新选址待上会批准；浅层钻机已经进场 5 台电力负荷不足无法开钻</td></tr>
</table>
