中国民航大学宁河校区 3 月 21 日工程日报

一、施工概要

1	图书馆	**本日施工内容:**机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；卫生间防水施工；四层云顶吊顶施工；地下室数据机房、值班室、UPS 间刷防尘漆；机房墙面塞岩棉，云顶幻彩铝板安装，一层、三层公区转换层施工；
		总体完成情况:机电管线安装 94%；幕墙安装完成 92%；卫生间防水施工完成 70%；幻彩铝板安装 90%；云顶吊顶施工完成 5%；地下室数据机房、值班室、UPS 间刷防尘漆完成 100%；机房墙面塞岩棉 30%。
2	机场学院教学实验楼	**本日施工内容:**机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；正式电梯包口；卫生间给排水管线；包管道及窗帘盒；二次结构收尾抹灰
		总体完成情况: 机电管线安装 95%；幕墙铝板安装完成 100%；内墙一遍腻子完成 100%；玻璃安装完成 95%；开启扇安装 90%；包管道 70%；窗帘盒完成 50%；抹灰收尾完成 10%。
3	公共教学楼	**本日施工内容:**机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；正式电梯包口；卫生间给排水管线；包管道及窗帘盒；二次结构收尾抹灰
		总体完成情况: 机电管线安装 95%；幕墙铝板安装完成 95%；内墙一遍腻子完成 100%；玻璃安装完成 95%；开启扇安装 95%；包管道 70%；窗帘盒完成 60%；抹灰收尾完成 20%。
4	飞行乘务大楼及模拟舱楼	**本日施工内容:** 机电安装给排水管道；空调水管道；开启扇安装；中庭墙面样板；二次结构收尾；机电管线保温；窗帘盒安装；围边吊顶施工；腻子施工；首层贴砖;模拟仓抹灰；结构柱剔凿；防水施工
		总体完成情况: 机电管线安装完成 95%；开启扇安装 96%；中庭墙面样板完成 85%；结构柱剔凿完成 15%；围边吊顶安装完成 60%；二次结构收尾完成 75%;首层贴砖完成 96%;模拟仓抹灰完成 30%；模拟仓防火门框完成 90%；10kv 墙体砌筑 80%,楼梯间架体搭设 10%；屋面找坡打点 70%;卫生间防水完成 60%；
5	体育馆	**本日施工内容:**看台台阶支模、格栅幕墙基础支模；卫生间水管安装，雨水馆安装、风机盘管，消防及通风安装、管道保温；金属屋面屋面底板、保温层安装，异形次檩焊接；幕墙埋板安装，幕墙、PC 板、张拉网龙骨安装
		整体完成情况:粗装修完成 87%；钢结构完成 99%；机电安装完成 75%;金属屋面 40%，幕墙 30%
6	师生活动中心	**本日施工内容:**卫生间找平层施工，风机盘管安装，户内穿线

		整体完成情况：主体结构完成 100%；二次结构完成 100%；主楼粗装修完成 100%，精装修完成 15%；机电安装完成 87%。
7	学生食堂	**本日施工内容**：玻璃幕墙龙骨安装，幕墙龙骨安装、腻子施工，采光天窗安装施工，玻璃栏板埋件施工，后厨区打压施工
		整体完成情况：二次结构完成 100%，粗装修完成 95%，屋面防水完成 100%，外保温完成 30%，机电安装完成 86%。
8	南大门	**本日施工内容**：铺设底板龙骨、加固架体
		整体完成情况：满堂架搭设完成，操作架搭设完成， 铺设底板龙骨。
9	1#学生宿舍	**本日施工内容**：室内二遍腻子施工，首层外墙保温粘贴抹面，走廊地砖铺贴，走廊踢脚及室内踢脚粘贴
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 40%，屋面工程完成 100%；外墙保温完成 81%，机电安装完成 85%；窗户工程完成 85%。
10	2#学生宿舍	**本日施工内容**：有水房间 2-6 层防水闭水施工，灯具、面板安装，室内二遍腻子施工，外立面保温收尾，走廊地砖铺贴
		整体完成情况：粗装修完成 100%；精装修完成 60%，外墙保温完成 95%，二遍腻子完成 90%；机电安装完成 85%；窗户工程完成 85%。
11	3#学生宿舍	**本日施工内容**：空调板找坡层施工，室内地砖、踢脚及走廊地砖铺贴，室内二遍腻子施工，外保温施工，消防侧喷开洞，机电调试
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 30%；屋面工程完成 100%；机电安装完成 80%；外保温工程完成 31%；窗户工程完成 80%。
12	4#学生宿舍	**本日施工内容**：电箱安装，电线穿设，有水房间防水施工，腻子施工，吊顶龙骨安装，外保温施工，阳台灯具安装
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 45%；电梯工程完成 100%；机电安装完成 78%；外保温工程完成 35%；窗户工程完成 70%。
13	5#学生宿舍	**本日施工内容**：电箱安装，电线穿设，有水房间防水施工，腻子施工，吊顶龙骨安装，外保温施工，阳台灯具安装
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 40%；机电安装完成 78%；窗户工程完成 85%；外保温工程完成 40%。
14	35Kv 变电站	未施工
15	垃圾站	未施工

15	弱电专项施工（江森自控）	一、二标段	**本日施工内容：**现场线缆敷设及敷管作业
			总体完成情况： 1、 公共教学楼末端软管安装完成 100% 2、 公共教学楼时钟布管穿线 95% 3、 飞乘楼末端软管安装完成 100% 4、 飞乘楼敷设楼控通讯线缆 90% 5、 飞乘楼敷设智能照明通讯线 90% 6、 飞乘楼敷设时钟管线线 90% 7、 飞乘楼末端点位穿线 90% 8、 飞乘楼敷设 ONU 电源完成 90% 9、 飞乘楼敷设光缆完成 90% 10、 飞乘楼理线 90% 11、 模拟仓监控线管敷设 100% 12、 图书馆二层线管敷设完成 70% 13、 图书馆一层灯控穿线完成 50% 14、 图书馆三层开槽弹线完成 100% 15、 图书馆三层线管敷设完成 90% 16、 图书馆三层线缆敷设完成 80% 17、 图书馆一层灯控穿线完成 90% 18、 图书馆一层线管线缆敷设完成 75% 19、 图书馆四层线管敷设完成 85% 20、 图书馆数据机房门禁线管线缆敷设完成 100% 21、 图书馆地下室污水坑开槽埋管完成 85% 22、 图书馆地下室智能照明线缆敷设完成 40% 23、 图书馆地下室楼控主线线缆敷设完成 60% 24、 图书馆地下室楼楼控 DDC 箱安装完成 40% 25、 教学楼、飞乘楼修复被拆管线 26、 实验楼楼控通讯线完成 85% 27、 1#宿舍楼水表线管线缆追位 80% 28、 1#宿舍楼电表线管线缆追位 80% 29、 1#宿舍楼竖井线缆整理 80% 30、 1#宿舍楼水控接线完成 70% 31、 2#宿舍楼水控接线完成 80% 32、 3#宿舍楼主电源线光纤敷设完成 95%,，弱电间线槽未联通，不能到位 33、 3#宿舍舍楼敷设水控线缆完成 90%，末端点位方案未确定。 34、 3#宿舍楼水表线管线缆追位 90% 35、 3#宿舍楼水控接线完成 80% 36、 3#宿舍楼敷设门禁线缆完成 90% 37、 4#宿舍楼主电源线光纤敷设完成 100% 38、 4#宿舍楼竖井线缆整理 100% 39、 4#宿舍楼水表线管线缆追位 90%

			40、 4#宿舍楼水控接线 100% 41、 5#宿舍楼主电源线光纤敷设完成 95% ，弱电间线槽未联通，不能到位。 42、 5#宿舍楼竖井线缆整理 100% 43、 5#宿舍楼敷设水控线缆 80% 44、 体育馆一层修复线管 100% 45、 体育馆一层时钟线缆敷设完成 90% 46、 体育馆一层电力监控线缆敷设完成 80% 47、 体育馆一层水表线缆敷设完成 80% 48、 食堂一层配管 90% 49、 食堂一层穿线 90% 50、 能源站线缆敷设完成 85% 51、 活动中心墙面开槽配管 95% 52、 活动中心能耗敷设线管 80%、 53、 活动中心能耗敷设线缆 75% 54、 活动中心安防敷设线缆 90% 55、 活动中心温控敷设线缆 80% 56、 活动中心综合布线线缆敷设完成 85% 57、 新老校区互联开始探井 58、 新老校区互联敷设光缆完成 6.5 公里（共计 75 公里） 59、 多媒体教室布管完成 31 间（共计 65 间） 60、 可视化教室布管完成 29 间（共计 71 间）
16	能源专项施工（恒益建安）	能源站	**本日施工内容：**能源站管道、阀门安装；烟囱安装
			整体完成情况：能源站管道、阀门安装 72%；烟囱安装 100%
		中深层地源热井	**本日施工内容：施工完成**
			整体完成情况：
		浅层地源热井	**本日施工内容：**第三系统第三条沟打压合格回填，第六系统第三条沟打压合格回填，第十三系统第二条沟连接完成打压合格回填，第十四系统第二条沟打合格回填，第十六系统第三条沟打压合格回填，第一系统第二条沟开始开连接，第四系统第三条沟开始连接，第十五系统第二条沟开沟完成
			第三系统第三条沟打压合格回填 50%，第六系统第三条沟打压合格回填 50%，第十三系统第二条沟连接完成打压合格回填 50%，第十四系统第二条沟打合格回填 50%，第十六系统第三条沟打压合格回填 50%，第一系统第二条沟开始开连接 30%，第四系统第三条沟开始连接 30%，第十五系统第二条沟开沟完成 100%

17	中铁五局	**宿舍楼区域**	**今日完成情况：**35KV 变电站周围消防管道安装 80m 宿舍楼消防管道安装 60m 热力管道安装完成 120m
		校园道路	**今日完成情况：**/
		公共教学楼及飞行乘务大楼	**今日完成情况：**教学楼南侧中水管完成 94m 给水管完成 76m
		图书馆周边	**今日完成情况：**/
		体育馆及周围	**今日完成情况：**/
		整体总量完成情况	雨水管道安装完成占总量 92%；给水管道安装完成占总量 43.6%（3295m）； 污水管道安装完成占总量 97%；热力管道安装完成占总量 4%（362m）； 中水管道安装完成占总量 52.2%（3300m）；消防管道安装完成占总量 28.9%（4067m）。
18	人员情况	监理总人数 21 人； 八局总人数 780 人，管理人员 97 人，工人 683 人； 三局总人数 971 人，管理人员 96 人，工人 875 人； 中铁五局总人数 37 人，管理人员 8 人，工人 29 人； 江森自控总人数 40 人，管理人员 1 人，工人 39 人； 恒益建安总人数 41 人，管理人员 4 人，工人 37 人；	

二、监理日报

一标段：

1、现场巡视检查图书馆机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；卫生间防水施工；四层云顶吊顶施工；地下室数据机房、值班室、UPS 间刷防尘漆；机房墙面塞岩棉，云顶幻彩铝板安装。

2、现场巡视检查机场学院教学实验楼机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；正式电梯包口；卫生间给排水管线；包管道及窗帘盒。

3、现场巡视检查教学楼机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；正式电梯包口；卫生间给排水管线；包管道及窗帘盒。

现场巡视检查飞行乘务大楼机电安装给排水管道；空调水管道；开启扇安装；中庭墙面样板；机电管线保温；窗帘盒安装；围边吊顶施工；腻子施工；首层贴砖;模拟仓抹灰。

二标段：

1. 对体育馆幕墙龙骨安装进行检查。对二层抹灰施工进行巡检。金属屋面防水施工进行巡检。

2. 对师生活动心室内开槽进行检查。裙房龙骨安装，钢结构焊接进行巡检。对外墙保温施工进行巡检。对太阳能聚热管安装进行巡检、对卫生热水水箱技术安装进行巡检。对风机盘管电线管安装进行巡检。

3. 对南校门模板安装进行巡检。

4. 对 1 号宿舍楼室内二遍腻子施工进行巡检。对宿舍楼外墙保温进行巡检。对 4 号楼给水、中水打压进行验收。

5. 对能源站管道焊接安装进行巡检。

6. 对食堂幕墙龙骨加工进行巡检。

7. 对 35KV 二层框架柱植筋打孔进行巡检。

8. 现场随机抽取工人健康码进行检查。

室外、能源及弱电：

1.能源： 对水平管打压试验进行见证。对室外 500 米主管线位置进行确认。

2. 弱电： 现场线缆敷设及敷管作业。

3.室外： 对现场管道开挖进行巡检，对市政消防管道回填进行验收。对室外管网与市政管网标高进行复测。

标段划分	单体名称	监理人员	监理工作时间、内容及路线	备注
一标段 刘刚 （15162265570）	图书馆	刘刚 （18082566239）	对图书馆施工进行巡视检查	
		张春博 （13027722180）	对图书馆施工进行巡视检查	
		刘浩 （13400385767）	对图书馆施工进行巡视检查	
	教学组团	任海博 （18082566239）	对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查	
		马瑞峰 （15614235758）	对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查。	
	所有单体安装工程	滕洪亮 （13234049175） 张春博 （13027722180）	对现场施工巡视检查	
二标段 林利民 （18640512507）	体育馆	丁建泽 （18845226778） 党泽南 （13630253982）	对现场施工进行巡视检查，钢构件焊接巡检	
	师生活动中心		对现场外墙保温、钢结构拼装施工巡检	

	4#、5#学生宿舍	杨宸（13364468744） 乔天航(18547607857)	对现场外墙保温、室内地砖铺设、开槽施工巡检	
	1#、2#、3#学生宿舍、食堂	乔天航(18547607857) 丁建泽（18845226778） 宋明（15345517113）	对现场外墙保温、室内地砖铺设、开槽施工巡检	
	35kv 变电站		对现场施工巡视检查	
	所有单体安装工程	武文志（18302240117） 马一博（17692498058）	对现场施工巡视检查	
室外	一标段	刘刚（18082566239） 任海博（18082566239） 刘浩（13400385767）	对现场施工巡视检查	

	二标段	滕洪亮（13234049175） 吕非凡（17532527058）	对现场管道及化粪池进行巡检	
弱电	一标段	刘刚（18082566239）	对现场施工巡视检查	
	二标段	武文志（18302240117））	对现场开槽、穿线施工巡检	
能源	二标段	武文志（18302240117） 吕非凡（17532527058）	对现场浅井水平管连接、能源站焊接施工巡检	

四、施工单位日报

一标段施工日报

	中国建筑　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告								表格编号	
									CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101	
项目名称	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：306	2022 年 3 月 21 日				✓					
作业计划编号		天气	非常晴朗☐ 晴朗☐ 多云☑ 雨☐ 雪☐ 霾☐							
施工部位	图书馆 机场学院教学实验楼 公共教学楼 飞行乘务大楼及模拟舱楼	温度	⩽0 度☐ 0 度～10 度☑ 10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐ ⩾30 度☐							
		风力	静风☑ 中等☐ 大风☐ 台风☐							
		湿度	干燥☑ 中等☐ 湿润 ☐							
一、现场人员情况										
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容							
中建八局	40	40	现场管理、方案编制							
后勤保障人员	0	30								
天津唐海	3	30	机电安装							
北京慧欣	3	51	机电安装							
恒福消防	2	19	组团消防							
福建聚利	4	115	幕墙安装							
鼎天幕墙	2	12	幕墙安装							
天宇信达（二构）	4	105	二次结构							
天津俊凯	2	41	机电通风							
宏坤煜业	2	46	机电通风							
堡泰消防	4	36	机电消防							
天河伟业	8	81	精装							
八局装饰	12	73	精装							
虹吸雨水	0	16	机电安装							
江森自控	2	18	机电安装							
三菱电梯	1	10	电梯安装							
天津科顺	1	8	防水							
华夏门业	1	4	防火门							

	中国建筑　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告		表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
昌盛伟业	1	6	图书馆水电保温
贵州中科	1	16	组团保温
军盛鑫	1	7	组团水电保温
华为人防	0	3	人防
远盛保温	1	4	组团保温
华夏民生	1	4	
东方诚	1	5	
合计	97	780	
本日新增	0人，体温正常		

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
货用施工升降机	SC200/200	良好	1
叉车	/	良好	1
洒水车	/	良好	1
雾炮车	/	良好	3
挖机	60型	良好	1
吊车	25吨	良好	0
曲臂高空车	/	良好	6
升降车	/	良好	18
蜘蛛车	/	良好	1

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

	中国建筑　项目管理表格				
	作业面\项目每日情况报告			表格编号	CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101

四、来访人员情况

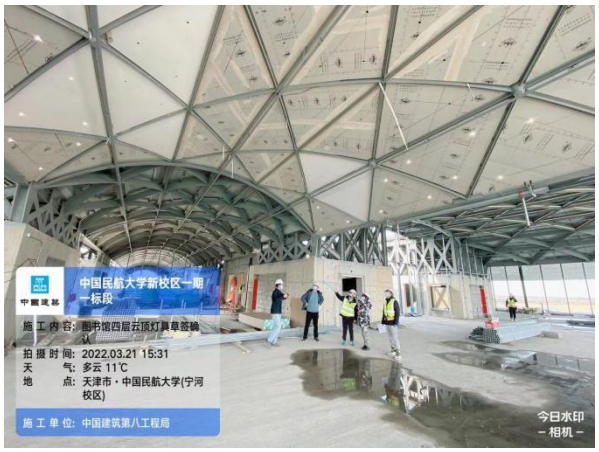
时间	姓名	单位	工作目的	备注

五、进度完成情况	图书馆	本日施工内容:机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；卫生间防水施工；四层云顶吊顶施工；地下室数据机房、值班室、UPS 间刷防尘漆；机房墙面塞岩棉，云顶幻彩铝板安装，一层、三层公区转换层施工;
		总体完成情况:机电管线安装 94%；幕墙安装完成 92%；卫生间防水施工完成 70%；幻彩铝板安装 90%；云顶吊顶施工完成 5%；地下室数据机房、值班室、UPS 间刷防尘漆完成 100%；机房墙面塞岩棉 30%。
	机场学院教学实验楼	本日施工内容:机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；正式电梯包口；卫生间给排水管线；包管道及窗帘盒；二次结构收尾抹灰
		总体完成情况：机电管线安装 95%；幕墙铝板安装完成 100%；内墙一遍腻子完成 100%；玻璃安装完成 95%；开启扇安装 90%；包管道 70%；窗帘盒完成 50%；抹灰收尾完成 10%。
	公共教学楼	本日施工内容:机电安装给排水管道；空调水管道；机电管线打压调试；正式电梯包口；卫生间给排水管线；包管道及窗帘盒；二次结构收尾抹灰
		总体完成情况：机电管线安装 95%；幕墙铝板安装完成 95%；内墙一遍腻子完成 100%；玻璃安装完成 95%；开启扇安装 95%；包管道 70%；窗帘盒完成 60%；抹灰收尾完成 20%。
	飞行乘务大楼及模拟舱楼	本日施工内容：机电安装给排水管道；空调水管道；开启扇安装；中庭墙面样板；二次结构收尾；机电管线保温；窗帘盒安装；围边吊顶施工；腻子施工；首层贴砖;模拟仓抹灰；结构柱剔凿；防水施工
		总体完成情况：机电管线安装完成 95%；开启扇安装 96%；中庭墙面样板完成 85%；结构柱剔凿完成 15%；围边吊顶安装完成 60%；二次结构收尾完成 75%;首层贴砖完成 96%;模拟仓抹灰完成 30%;模拟仓防火门框完成 90%;10kv 墙体砌筑 80%,楼梯间架体搭设 10%;屋面找坡打点 70%;卫生间防水完成 60%;
六、业主监理指令		
七、安全管理情况	日常三间巡逻检查，裸土苫盖维护，现场排水，安全隐患排查以及整改	
八、技术质量管理	对精装修技术问题协调、幕墙及门窗施工进行全过程质量监管，日常机械监测，危险源辨识等。	
九、过程关键文件		
十、本日重大事项		

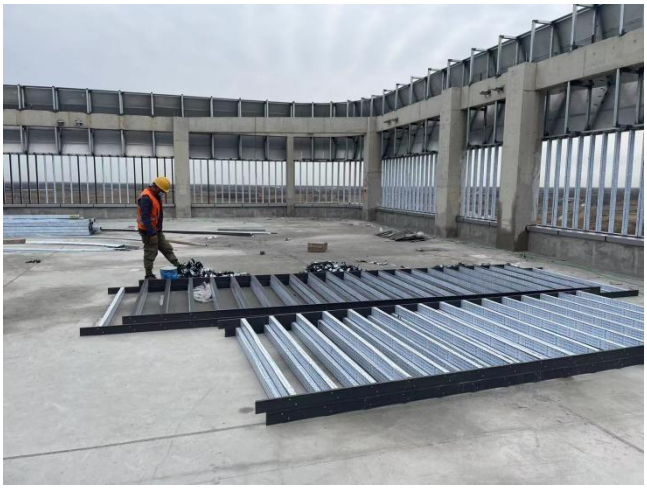
	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告	表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜（3.21）:** 1、图书馆四层光面超薄型防火涂料、幕墙南北门斗立柱、清水混凝土底中面层、弱电二次开槽封堵认质认价已上报，需要校方等领导尽快确认; 2、组团玻璃幕墙埋件及部分拆改签证需要尽快确认，烦请尽快回复; 3、飞行乘务大楼品酒、茶艺、化妆三间教室效果图请抓紧确认; 4、图书馆二层展示空间一、二层研讨室及三层研讨室精装施工图纸及时下发。 5、初步整理清单漏项：1）图书馆楼梯出口玻璃 LT-B-01-03；2）教学组团隔墙与窗户之间封闭; 6、泛光照明效果、图纸及招标控制价需要尽快确认; 7、新风机组前后阀门调整为电动调节阀未定（我方已按原图施工）; 8、风机盘管面板调整为联网型稳控面板，增加 485 接线、网线接口，且增加 6*1.5 通讯线需要明确; 9、图书馆精装修位置机电管线调整（三块大变动调整区域）需要上会确认; 10、目前已确认的认质认价、变更、签证是否可以过程中予以计提，此部分成本较高压力较大。 11、飞乘技能训练室墙体的拆改于 2022.2.28 日全咨公司下发要求组织草签但目前还未实施现场草签 12、图书馆消防箱明改暗变更前后图纸需要尽快确认。 13、弱电预留预埋线管至今未接收，组团弱电单位重复配明管，增加不必要浪费; 14.电井内弱电线追位电箱、末端点位弱电单位需抓紧施工，已影响弱电井吊顶（机电合同界面无此部分） 15、机组前后电动调节阀我方已按原图施工，是否调整弱电控制由弱电单位执行控制 16、隐蔽式喷头及干式下垂碰头认质认价未确认 17、联网型温控面板认价，档次需要确认 18、请校方尽快确定图书馆阅览室家具样式 19、图书馆家具的管线预埋点位图需要抓紧确认下发，目前房间内地面已经开始铺砖，请抓紧解决 20、图书馆二层东侧 14 轴/A～K 轴阅览室及 11 轴/G 轴～K 轴阅览室因桥架消防管道密集无法拆改，请全咨范围协调各方变更弧形铝板弧度事宜; 21、图书馆二层西侧 7 轴～8 轴/B 轴～E 轴展示空间具体吊顶标高做多少需尽快明确;	

	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告	表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
抄送	1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□； 5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□	

现场作业影像





图书馆云顶施工	模拟仓屋面找坡施工
	
图书馆拆改确认	屋面钢格栅施工
	
图书馆拆改确认	乘务楼卫生间施工
现场航拍图 3.10	

<table>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆</td><td>实验楼</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>公共教学楼</td><td>飞行乘务大楼及模拟仓</td></tr>
</table>

二标段

	中国建筑　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告表		表格编号							
			ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101							
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程二标段									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：002	2022 年 3 月 21 日				✓					
作业计划编号		天气	晴朗☑ 多云☐ 雨☐ 阴☐ 雪☐ 冰冻☐ 雾霾☐							
施工部位	1#-5#宿舍楼；食堂；体育馆；师生活动中心；南大门	温度	⩽0 度☑ 0 度～10 度☑ 10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐ ⩾30 度 ☐							
		风力	静风☑ 中等☐ 大风☐ 台风☐							
		湿度	干燥☑ 中等☐ 湿润☐							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	30/14	30/15	方案编制、现场施工管理
三局智能	2/0	2/0	BIM 建模
三局二安	10/4	300/22	宿舍楼穿线、配电箱安装，食堂首层通风管道、风阀、桥架安装,体育馆二次配管，风管、水管、桥架施工
三局一公司钢构	2/0	5/0	体育馆钢结构马道施工
长沙广大	4/0	35/0	图纸深化
兴华鑫宇	4/0	68/5	粗装修收尾、精装修施工
天津津宝福	1/0	85/2	粗装修收尾、精装修施工
北京迈易格	2/0	17/0	主框、玻璃安装、幕墙施工
东方雨虹（保温）	2/0	97/0	外保温施工
广日电梯	1/0	5/0	室内电梯调试、验收
山东川众	3/0	48/0	体育馆屋面施工
建工幕墙	5/0	70/0	幕墙、门窗施工
匠人清水	3/0	16/3	南大门施工
山东启航	1/0	7/0	师生活动中心弧形梁施工
承德一赢	1/0	9/0	栏杆复尺、加工
梁平荣安	1/0	3/0	主体结构收尾
东方雨虹（防水）	1/0	14/0	防水施工
天津汉物业	2/0	10/0	现场物业管理
精诚伟业	3/0	7/2	现场安保管理

	中国建筑　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号	
		ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101	

施工人员合计	78/18	828/47	/
健康监测情况	体温正常	体温正常	在场人员总计 828 人，防疫资料齐全

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
物料提升机	SC100/100	良好	3
电梯	室内电梯	良好	6
汽车吊	50t	良好	0
挖掘机	200	良好	0
吊篮	/	良好	97

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
/	/	/	合格	合格	/

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/	/	/	/	/

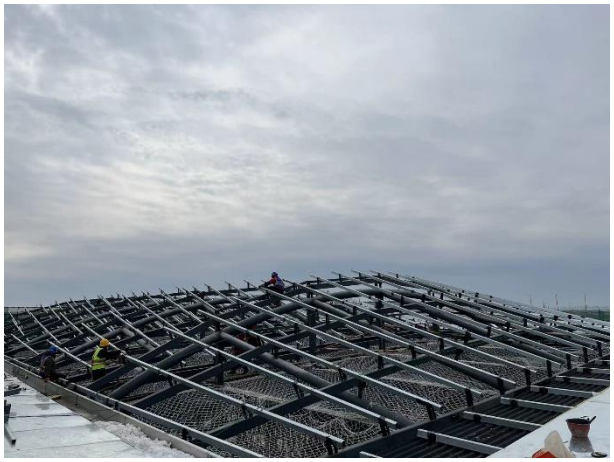
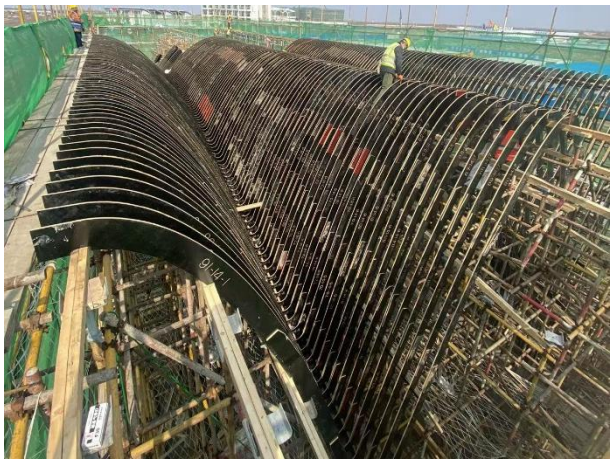
五、施工完成情况	体育馆	**本日施工内容**：看台台阶支模、格栅幕墙基础支模；卫生间水管安装，雨水馆安装、风机盘管，消防及通风安装、管道保温；金属屋面屋面底板、保温层安装，异形次檩焊接；幕墙埋板安装，幕墙、PC 板、张拉网龙骨安装
		整体完成情况：粗装修完成 87%；钢结构完成 99%；机电安装完成 75%；金属屋面 40%，幕墙 30%
	师生活动中心	**本日施工内容**：卫生间找平层施工，风机盘管安装，户内穿线
		整体完成情况：主体结构完成 100%；二次结构完成 100%；主楼粗装修完成 100%，精装修完成 15%；机电安装完成 87％。
	学生食堂	**本日施工内容**：玻璃幕墙龙骨安装，幕墙龙骨安装、腻子施工，采光天窗安装施工，玻璃栏板埋件施工，后厨区打压施工
		整体完成情况：二次结构完成 100%，粗装修完成 95%，屋面防水完成 100%，外保温完成 30%，机电安装完成 86%。
	南大门	**本日施工内容：**铺设底板龙骨、加固架体
		整体完成情况：满堂架搭设完成，操作架搭设完成，铺设底板龙骨。
	1#学生宿舍	**本日施工内容**：室内二遍腻子施工，首层外墙保温粘贴抹面，走廊地砖铺贴，走廊踢脚及室内踢脚粘贴

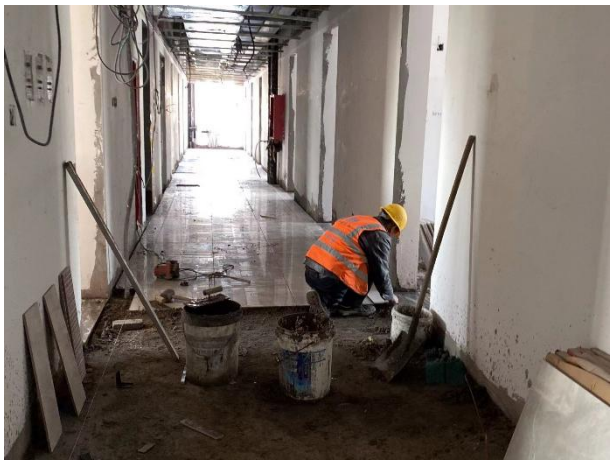
	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 40%，屋面工程完成 100%；外墙保温完成 81%，机电安装完成 85%；窗户工程完成 85%。
	2#学生宿舍	**本日施工内容**：有水房间 2-6 层防水闭水施工，灯具、面板安装，室内二遍腻子施工，外立面保温收尾，走廊地砖铺贴
		整体完成情况：粗装修完成 100%；精装修完成 60%，外墙保温完成 95%，二遍腻子完成 90%；机电安装完成 85%；窗户工程完成 85%。
	3#学生宿舍	**本日施工内容**：空调板找坡层施工，室内地砖、踢脚及走廊地砖铺贴，室内二遍腻子施工，外保温施工，消防侧喷开洞，机电调试
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 30%；屋面工程完成 100%；机电安装完成 80%；外保温工程完成 31%；窗户工程完成 80%。
	4#学生宿舍	**本日施工内容**：电箱安装，电线穿设，有水房间防水施工，腻子施工，吊顶龙骨安装，外保温施工，阳台灯具安装
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 45%；电梯工程完成 100%；机电安装完成 78%；外保温工程完成 35%；窗户工程完成 70%。
	5#学生宿舍	**本日施工内容**：电箱安装，电线穿设，有水房间防水施工，腻子施工，吊顶龙骨安装，外保温施工，阳台灯具安装
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 40%；机电安装完成 78%；窗户工程完成 85%；外保温工程完成 40%。
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、对生活区进行检查；2、对现场临时用电进行检查；3、对整个施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改；4、现场疫情防控监察。	
八、技术质量管理情况	1、对体育馆、食堂、师生活动中心及宿舍楼施工情况进行检查；2、BIM 建模幕墙、钢构、机电安装等。	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	下午中铁五局单位场内自来水管挖断，造成场区停水，影响施工。 因疫情防控需要，应学校要求人员禁止流动，现场外住宿 246 人无法进场施工，局部工作面停工。	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：** **体育馆单体：** 1、中空阳光板幕墙单侧还是双侧请尽快明确。 2、体育馆航天云膜结构由 PTFE 改为 ETFE 是否进行变更请尽快明确。 3、游泳馆折叠门变更为推拉门电子版变更已收到，并完成费用估算上报，请明确是否进行调整。 4、防火隔声门清单漏项，费用估算已上报，请尽快协调明确。	

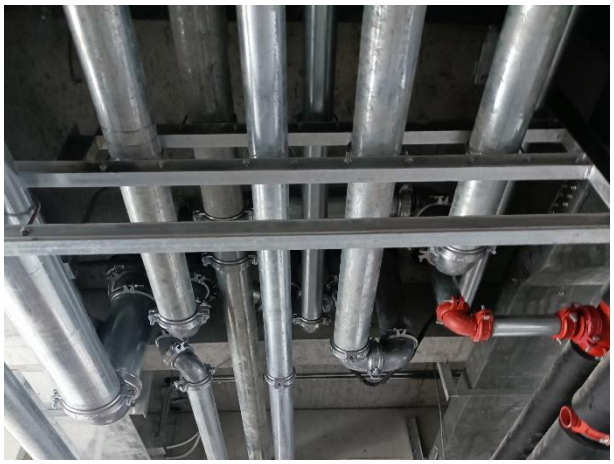
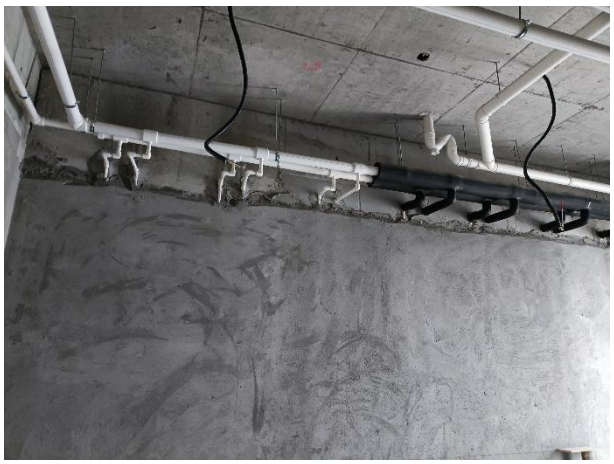
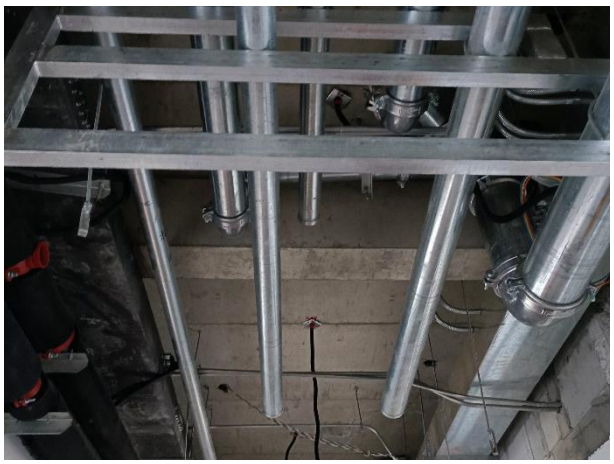
	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101
	师生活动中心： 1、师生活动中心主楼户内点位、裙房点位电子版变更、建筑 90-001、90-002、90-003 电子版变更已收到，且完成费用估算上报，请协调下发纸版图纸。 **学生食堂及学生宿舍：** 1、裙房商业走廊变更请尽快下发。 2、食堂三层精装修全专业图纸请尽快下发。 3、宿舍楼及食堂电梯门增加花纹不锈钢外门套、宿舍楼盥洗室垭口增加不锈钢门套，食堂所有窗台均需设置窗台板。 4、食堂打饭窗口上部墙体改为轻钢龙骨隔墙+耐水石膏板。 5、食堂及能源站屋面面层变更花岗岩，食堂就餐区包柱做法变更，变更尽快下发。 **其他：** 1、南校门主体结构请协调尽快下发纸版变更图纸。 2、为过程结算提前准备，已完工程图纸变更、洽商、会审请尽快下发。 3、35KV 变电站施工单位已进场，请尽快提供土建深化图纸及预留洞口图，请尽快协调相关单位埋件协调进场。 4、我司已开始师生活动中心点位变更自行部分大面积拆改，请协调弱电单位尽快进行师生活动中心其变更点位拆改。 5、体育馆大屏位置最终版变更请尽快下发。 6、室外能源场地移交滞后，大面未施工完成，局部施工完成区域标高不正确，淤泥未清理，压实度不满足要求。导致室外运动场区无法进场施工。 7、室外施工经常挖断水电，造成经常因断水断电断路局部停工。	
抄送	1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□	

项目生产经理亲自填报整个项目部每日情况报告。报告包括的时间为当天上班时间到次日上班时间,提交报告的时间不迟于次日上午的 12 点。

现场施工影像

	
体育馆 看台台阶支模、格栅幕墙基础支模；卫生间水管安装，雨水馆安装、风机盘管，消防及通风安装、管道保温；金属屋面屋面底板、保温层安装，异形次檩焊接；幕墙埋板安装，幕墙、PC 板、张拉网龙骨安装	师生活动中心 卫生间找平层施工，风机盘管安装，户内穿线
	
学生食堂 玻璃幕墙龙骨安装，幕墙龙骨安装、腻子施工，采光天窗安装施工，玻璃栏板埋件施工，后厨区打压施工	南大门 铺设底板龙骨、加固架体

	
1#学生宿舍楼 室内二遍腻子施工，首层外墙保温粘贴抹面，走廊地砖铺贴，走廊踢脚及室内踢脚粘贴	2#学生宿舍楼 有水房间 2-6 层防水闭水施工，灯具、面板安装，室内二遍腻子施工，外立面保温收尾，走廊地砖铺贴
	
3#学生宿舍楼 空调板找坡层施工，室内地砖、踢脚及走廊地砖铺贴，室内二遍腻子施工，外保温施工，消防侧喷开洞，机电调试	4#学生宿舍楼 电箱安装，电线穿设，有水房间防水施工，腻子施工，吊顶龙骨安装，外保温施工，阳台灯具安装
	
5#学生宿舍楼 电箱安装，电线穿设，有水房间防水施工，腻子施	体育馆

工，吊顶龙骨安装，外保温施工，阳台灯具安装	
	
食堂	1#学生宿舍楼
	
2#学生宿舍楼	3#学生宿舍楼
	
4#学生宿舍楼	5#学生宿舍楼

中铁五局室外工程

中国中铁	中国中铁 项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001

项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程室外施工									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：200	2022 年 3 月 21 日				✓					
作业计划编号		天气	非常晴朗☐ 晴朗☐ 多云☑雨☐ 雾☐ 雪☐冰冻☐							
施工部位	宿舍楼，公共教学楼	温度	⩽0 度☐ 0 度～10 度☑10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐ ⩾30 度☐							
		风力	静风☑中等☐ 大风☐ 台风☐							
		湿度	干燥☑ 中等☐ 湿润☐							

一、（1）现场人员情况

单位名称	管理人员数	作业工人数	主要工作内容
中铁五局（雨污水、化粪池）	0	0	雨污水管道安装，检查井安装，井室抽水，场地清扫
中铁五局（机械）	2	6	机械操作
中铁五局(给、中水)	2	6	给水，中水管道安装，管道调运
中铁五局（消防）	2	8	消防管道安装，管道调运
中铁五局（热力）	2	9	热力管道安装，管道调运
中铁五局（道路）	0	0	路基开槽
施工人员合计	8	29	

（2）疫情防控情况

有无新增人员	新增人员排查情况	项目人员体温是否正常	备注
无	/	正常	/

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
铲车	HY950	良好	2
挖掘机	210	良好	4
翻斗车	/	良好	0
吊车	8t	良好	0
/			

三、主要物资（设备）进场情况

中国中铁	中国中铁 项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
/					

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				

五、施工完成情况

宿舍楼区域	**今日完成情况：** 35KV 变电站周围消防管道安装 80m 宿舍楼消防管道安装 60m 热力管道安装完成 120m
校园道路	**今日完成情况：** /
公共教学楼及飞行乘务大楼	**今日完成情况：** 教学楼南侧中水管完成 94m 给水管完成 76m
图书馆周边	**今日完成情况：** /
体育馆及周围	**今日完成情况：** /
整体总量完成情况	雨水管道安装完成占总量 92%；给水管道安装完成占总量 43.6%（3295m）； 污水管道安装完成占总量 97%；热力管道安装完成占总量 4%（362m）； 中水管道安装完成占总量 52.2%（3300m）；消防管道安装完成占总量 28.9%（4067m）。
六、业主监理指令	/
七、安全管理情况	1、对现场机械进行安全检查；2、对施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改； 3、施工人员班前喊话。4、全员参加核酸检测。
八、技术质量管理情况	开槽全过程质量监管。
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/

中国中铁	中国中铁　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001
十、本日重大事项	/	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：　/**	
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☑；5、项目生产经理（项目总工）☑；6、项目工程部☑；7、项目资料室☐	

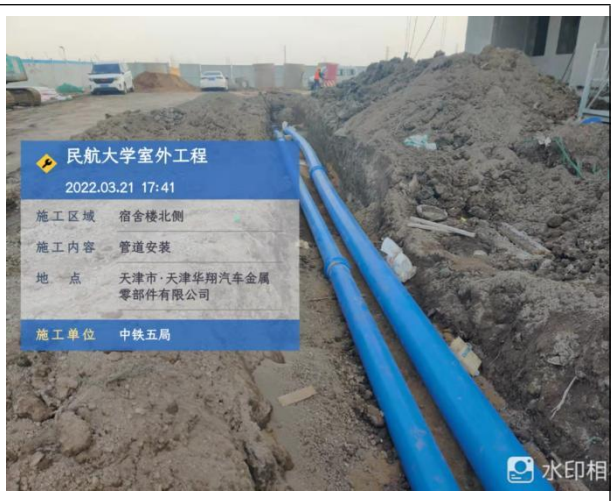
现场施工影像









<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">班组开工安全喊话、中水管道安装、给水管道安装、热力管道安装、消防管道安装、井室抽水、材料调运、管道调运、土方回填</td>
</tr>
</table>

	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 JCI-CN23/21:1096 BJJSGCB-PM-2021003

项目名称	中国民航大学新校区智慧校园建设弱电专项施工									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：198	2022 年 3 月 21 日				✓					
作业计划编号		天气	非常晴朗☐　晴朗☑ 多云☐　雨☐ 雪☐ 霾☐							
施工部位	全校区	温度	⩽0 度☐　0 度～10 度☑　10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐　⩾30 度☐							
		风力	静风☑　中等☐　大风☐　台风☐							
		湿度	干燥☑　中等☐　湿润☐							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
北京江森自控有限公司	1	1	现场管理、专业设计
施工	39	24	弱电施工
新增人员			
合计	40	25	
健康状况（体温）	正常	正常	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
/	/	/	

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

时间	姓名	单位	工作目的	备注

五、进度完成情况	一、二标段	本日施工内容：现场线缆敷设及敷管作业
		总体完成情况：

61、 公共教学楼末端软管安装完成 100%
62、 公共教学楼时钟布管穿线 95%
63、 飞乘楼末端软管安装完成 100%
64、 飞乘楼敷设楼控通讯线缆 90%
65、 飞乘楼敷设智能照明通讯线 90%
66、 飞乘楼敷设时钟管线线 90%
67、 飞乘楼末端点位穿线 90%
68、 飞乘楼敷设 ONU 电源完成 90%
69、 飞乘楼敷设光缆完成 90%
70、 飞乘楼理线 90%
71、 模拟仓监控线管敷设 100%
72、 图书馆二层线管敷设完成 70%
73、 图书馆一层灯控穿线完成 50%
74、 图书馆三层开槽弹线完成 100%
75、 图书馆三层线管敷设完成 90%
76、 图书馆三层线缆敷设完成 80%
77、 图书馆一层灯控穿线完成 90%
78、 图书馆一层线管线缆敷设完成 75%
79、 图书馆四层线管敷设完成 85%
80、 图书馆数据机房门禁线管线缆敷设完成 100%
81、 图书馆地下室污水坑开槽埋管完成 85%
82、 图书馆地下室智能照明线缆敷设完成 40%
83、 图书馆地下室楼控主线线缆敷设完成 60%
84、 图书馆地下室楼楼控 DDC 箱安装完成 40%
85、 教学楼、飞乘楼修复被拆管线
86、 实验楼楼控通讯线完成 85%
87、 1#宿舍楼水表线管线缆追位 80%
88、 1#宿舍楼电表线管线缆追位 80%
89、 1#宿舍楼竖井线缆整理 80%
90、 1#宿舍楼水控接线完成 70%
91、 2#宿舍楼水控接线完成 80%
92、 3#宿舍楼主电源线光纤敷设完成 95%,，弱电间线槽未联通，不能到位
93、 3#宿舍舍楼敷设水控线缆完成 90%，末端点位方案未确定。
94、 3#宿舍楼水表线管线缆追位 90%
95、 3#宿舍楼水控接线完成 80%
96、 3#宿舍楼敷设门禁线缆完成 90%
97、 4#宿舍楼主电源线光纤敷设完成 100%
98、 4#宿舍楼竖井线缆整理 100%

Johnson Controls	北京江森自控有限公司　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 JCI-CN23/21:1096 BJJSGCB-PM-2021003

		99、　4#宿舍楼水表线管线缆追位 90% 100、　4#宿舍楼水控接线 100% 101、　5#宿舍楼主电源线光纤敷设完成 95%，弱电间线槽未联通，不能到位。 102、　5#宿舍楼竖井线缆整理 100% 103、　5#宿舍楼敷设水控线缆 80% 104、　体育馆一层修复线管 100% 105、　体育馆一层时钟线缆敷设完成 90% 106、　体育馆一层电力监控线缆敷设完成 80% 107、　体育馆一层水表线缆敷设完成 80% 108、　食堂一层配管 90% 109、　食堂一层穿线 90% 110、　能源站线缆敷设完成 85% 111、　活动中心墙面开槽配管 95% 112、　活动中心能耗敷设线管 80%、 113、　活动中心能耗敷设线缆 75% 114、　活动中心安防敷设线缆 90% 115、　活动中心温控敷设线缆 80% 116、　活动中心综合布线线缆敷设完成 85% 117、　新老校区互联开始探井 118、　新老校区互联敷设光缆完成 6.5 公里（共计 75 公里） 119、　多媒体教室布管完成 31 间（共计 65 间） 120、　可视化教室布管完成 29 间（共计 71 间）
六、业主监理指令		
七、安全管理情况		
八、技术质量管理		
九、过程关键文件		
十、本日重大事项	三局部分今日工人未进场施工	
十一、明日施工计划		
十二、工作小结		
抄送	1、建设方代表□；2、工程监理□；3、项目经理□；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室£	

作业影像


民航大学互联工程
2022.03.21 09:52
施工区域 津榆副线
施工内容 光缆施工
地点 天津市·天津市宁河区造甲城镇人民政府
建设单位 天津市爱德科技发展有限...
水印相机
民航大学互联工程
2022.03.21 09:52
施工区域 津榆副线
施工内容 光缆施工
地点 天津市·天津市宁河区造甲城镇人民政府
建设单位 天津市爱德科技发展有限...
水印相机
民航大学互联工程
2022.03.21 09:48
施工区域 津榆副线
施工内容 光缆施工
地点 天津市·天津市宁河区造甲城镇人民政府
建设单位 天津市爱德科技发展有限...
水印相机


民航大学宁河校区
2022.03.21 15:42
施工区域 飞乘楼
施工内容 多媒体布管
地点 天津市·云山垂钓园
水印相机
民航大学宁河校区
2022.03.21 14:13
施工区域 飞乘楼
施工内容 多媒体布管
地点 天津市·云山垂钓园
水印相机
民航大学宁河校区
2022.03.21 13:46
施工区域 飞乘楼
施工内容 多媒体布管
地点 天津市·七里海冯台公交站
水印相机


民航大学宁河校区
2022.03.21 13:02
施工区域 飞乘楼
施工内容 多媒体布管
地点 天津市·傅家台
水印相机
民航大学宁河校区
2022.03.21 10:02
施工区域 飞乘楼
施工内容 多媒体布管
地点 天津市·冯台村公交站
水印相机
民航大学宁河校区
2022.03.21 10:57
施工区域 飞乘楼
施工内容 多媒体布管
地点 天津市·云山垂钓园
水印相机


中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段施工
计　　数：3
施工区域：图书馆二层工会活动中心
施工内容：新增点位做管
拍摄时间：2022.03.21 10:40
地　　点：天津市·中国民航大学宁河校区
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段施工
计　　数：2
施工区域：图书馆二层工会活动中心
施工内容：新增点位做管
拍摄时间：2022.03.21 10:39
地　　点：天津市·中国民航大学宁河校区
施工单位：江森自控

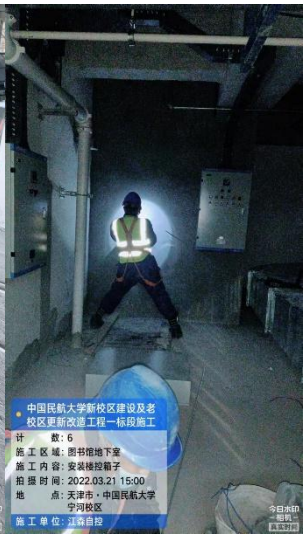

中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段施工
计　　数：4
施工区域：图书馆三层
施工内容：盖盖签
拍摄时间：2022.03.21 14:02
地　　点：天津市·中国民航大学宁河校区
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段施工
施工区域：图书馆地下室
施工内容：安装楼控箱子
拍摄时间：2022.03.21 08:42
地　　点：中国民航大学宁河校区
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段施工
计　　数：9
施工区域：图书馆三层
施工内容：AP做管放线
拍摄时间：2022.03.21 16:25
地　　点：天津市·中国民航大学宁河校区
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段施工
计　　数：8
施工区域：图书馆三层
施工内容：AP做管放线
拍摄时间：2022.03.21 16:24
地　　点：天津市·中国民航大学宁河校区
施工单位：江森自控

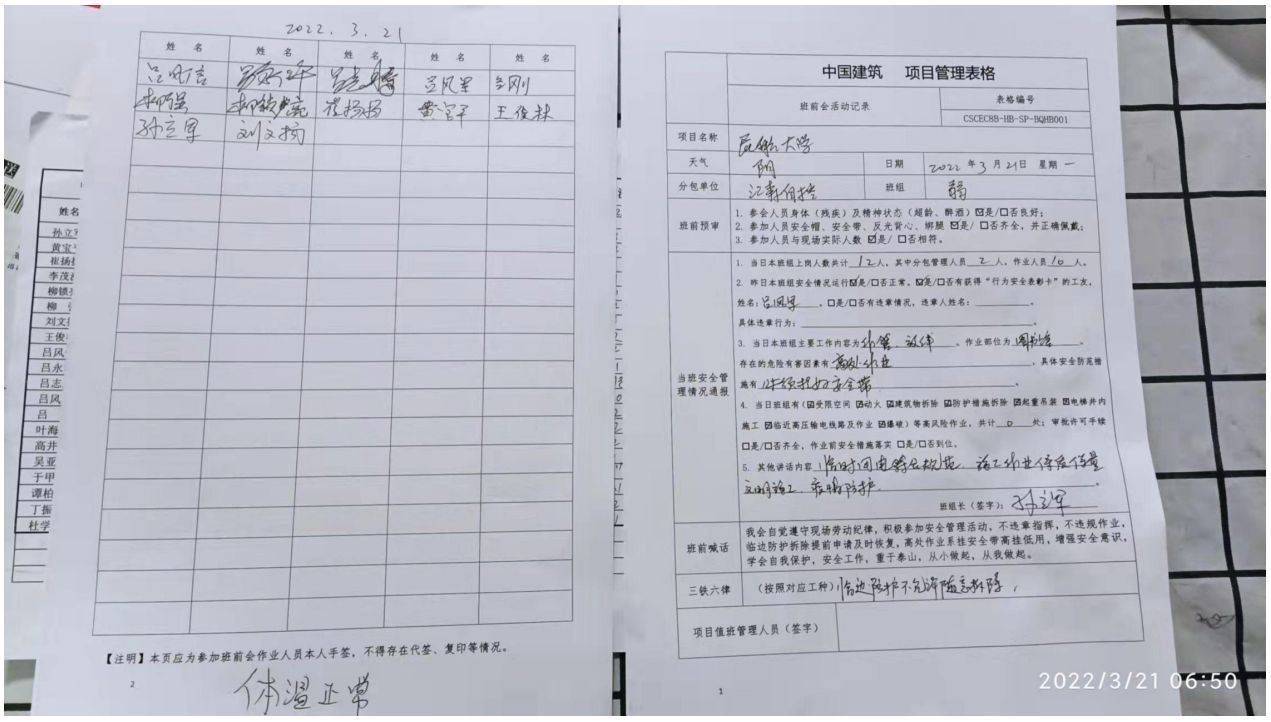

中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段施工
计　　数：5
施工区域：图书馆二层
施工内容：点位穿线
拍摄时间：2022.03.21 14:09
地　　点：天津市·中国民航大学宁河校区
施工单位：江森自控


中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段施工
计　　数：6
施工区域：图书馆地下室
施工内容：安装楼控箱子
拍摄时间：2022.03.21 15:00
地　　点：天津市·中国民航大学宁河校区
施工单位：江森自控

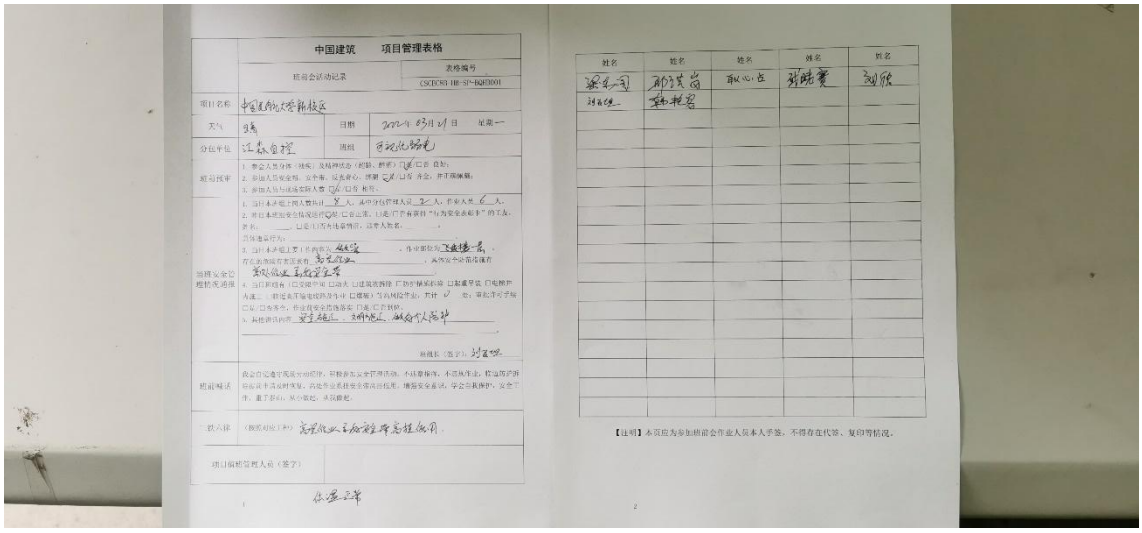

中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段施工
计　　数：7
施工区域：图书馆地下室
施工内容：安装楼控箱子
拍摄时间：2022.03.21 15:03
地　　点：天津市·中国民航大学宁河校区
施工单位：江森自控

施工内容


会议室
2022/3/21 06:45


2022.3.21
【注明】本页应为参加班前会作业人员本人手签，不得存在代签、复印等情况。
休渴正常
中国建筑 项目管理表格
班前会活动记录
CSCEC8B-HB-SP-BQHB001
2022/3/21 06:50





中国建筑　项目管理表格

班前会活动记录

表格编号：CSCEC3 HE-SF-EQP3001

项目名称	中国民航大学新校区
天气	晴
日期	2022年03月21日　星期一
分包单位	江森自控
班组	空调水暖电
班前按序	1. 参会人员身体（状态）及精神状态（好缺、醉否）□是 □否 良好； 2. 参加人员安全帽、安全带、反光背心、劳保鞋 □是 □否 齐全，并正确佩戴； 3. 参加人员与应参加人数 15/15 □有 □无； 1. 当日本班工种人数共计 8 人，其中分包管理人员 2 人，作业人员 6 人。 2. 当日本班组安全技术交底已完成：□是 □否。□是（下有资料"与为安全点标准"的下方，否则，_____）□否（下方注明情况，注明人姓名，_____）。 当日危险作为： 3. 当日本班组人员作业：班组安全_____，作业部位为_____。 存在危险因素及应采取_____，从而安全监督员确存 4. 当日班组有（□空调平台 □动火 □建筑洞预留 □防护棚架拆除 □起重吊装 □电梯井内施工 □密闭空间施工 □临时用电 □高处作业）等风险性作业，共计 0 处，审批许可手续已备 □已备案，作业前安全监督部门 □是 □否到场。 5. 其他讲话内容：安全帽上，3到6点，做好个人防护
班组讲话	我会自觉遵守现场文明施工，积极参加安全管理活动，不违章操作，不违反作业，权边防护拆除后须及时恢复，高处作业系挂安全带应可靠牢固，增强安全意识，学会自我保护，互相关心，重下轻上，从小做起，从现做起。
收入保	（根据对应工种）完成施工任务注意安全
项目部管理人员（签字）	

班组长（签字）：刘宝欣

2022.3.21

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
梁东方	刘宝欣	耿心臣	张晓霞	刘欣
刘宝欣	王勤超			

【注明】本页应为参加班前会作业人员本人手签，不得存在代签、复印等情况。



	中国建筑 项目管理表格			
	班前会活动记录		表格编号	CSCEC8B-HB-SP-BQHB001
项目名称	民航大学			
天气	阴	日期	2022年3月21日	星期一
分包单位	江苏自控	班组	弱电多媒体	
班前预审	1. 参会人员身体（残疾）及精神状态（超龄、醉酒）☑是/□否 良好； 2. 参加人员安全帽、安全带、反光背心、绑腿 ☑是/□否 齐全，并正确佩戴； 3. 参加人员与现场实际人数 ☑是/□否 相符。			
当班安全管理情况通报	1. 当日本班组上岗人数共计 5 人，其中分包管理人员 1 人，作业人员 5 人。 2. 昨日本班组安全情况运行□是/□否正常。□是/□否有获得“行为安全表彰卡”的工友，姓名：_____，□是/□否有违章情况，违章人姓名：_____。 具体违章行为：_____ 3. 当日本班组主要工作内容为 布管 。作业部位为 飞乘楼 。存在的危险有害因素有 高空作业 ，具体安全防范措施有 做好安全带戴好安全帽 。 4. 当日班组有（□受限空间 □动火 □建筑物拆除 □防护措施拆除 □起重吊装 □电梯井内施工 □临近高压输电线路及作业 □爆破）等高风险作业，共计_____处；审批许可手续□是/□否齐全，作业前安全措施落实 □是/□否到位。 5. 其他讲话内容 安全理念 做好感情 防控 。 班组长（签字）：韦华			
班前喊话	我会自觉遵守现场劳动纪律，积极参加安全管理活动，不违章指挥，不违规作业，临边防护拆除提前申请及时恢复，高处作业系挂安全带高挂低用，增强安全意识，学会自我保护，安全工作，重于泰山，从小做起，从我做起。			
三铁六律	（按照对应工种） 高空作业 系好安全带 戴好安全帽			

1

项目值班管理人员（签字）	

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
韦华	蒲斌	王彦军	王硕	张宝虎

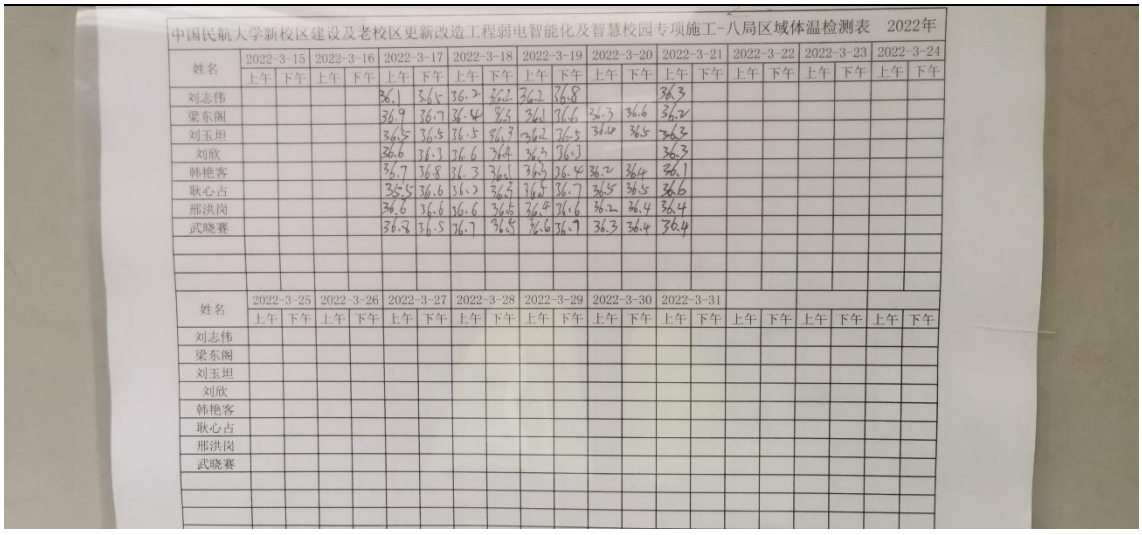
班前教育及安全检查



中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程弱电智能化及智慧校园专项施工-八局区域体温检测表 2022年

姓名	2022/3/10		2022/3/11		2022/3/12		2022/3/13		2022/3/14		2022/3/15		2022/3/16		2022/3/17		2022/3/18		2022/3/19		2022/3/20		2022/3/21	
	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午
孙立军	36.2	36.3	36.2	36.3	36.2	36.3	36.3	36.2	36.3	36.3	36.3	36.2	36.3	36.2	36.4	36.2	36.3	36.2	36.3	36.1	36.3	36.2	36.3	
黄宝平	35.9	36.4	36.5	36.2	36	36.2	35.9	36.2	36.5	36.2	36.2	36.3	36.1	36.3	2	36.3	36.4	36.3	36.4	36.4	35.8	36.2	36.3	
崔扬扬	36	36.3	36	36.1	36.1	36.2	36.2	36.1	36	36.2	36	36.1	36	36.1	36.5	36.1	36	36.2	36	36.3	36	36.1	36	
李茂洲	36.1	36.2	36.2	36.2	36.2	36.1	36.2	36.4	36.1	36.4	36.2	36.1	36.1						36.1	36	36.1	36.2		
柳锁亮	36.2	36.1	36.2	36.3	36.9	36.1	36.3	36.0	36.2	36.2	36.2	36.3	36.2	36.4	36.2	36.1	36.2	36.3	36.1	36.1	36.2	36.2	36.1	
柳 强	36.2	36.2	36.3	36.2	36.2	36.2	36.3	36.1	36.3	36.1	36.3	36.2	36.1	36.3	36.3	36.0	36.3	36	36.2	36.0	36.3	36.3	36.2	
刘文扬	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.2	36.4	36.3	36.3	36.2	36.3	36.3	36.1	36.2	36.2	36.3	36.3	36.1	36.2	36.3		
王俊林	36.3	36.4	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.4	36.1	36.3	36.2	36.2	36.7	36.2	36.2	36.2	36.3	36.3		
吕风信	36	36.2	36.2	36.2	36.5	36.3	36.9	36.4	36.5	36.3	36.9	36.3	36.2	36.1	36.2	36.2	36.2	36.4	36.2	36.4	36.4	36.4	36.1	
吕永华	36.1	36	36.1		36.5	36.2	36.1	36.4	36.2	36.3	36.1	36.2	36.1	36.4	36.1	37.2	36.1	36.2	36.3	36.3	36.2	36.2	36.1	
吕志腾	36.1	36				36.1	36.2	36.3			36.1	36.1	36.1											
吕风军	36.1	36.3	36.1	36.2	36.1	36.2	36.2	36.1	36.2	36.2	36.1	36.2	36.2	36.1	36.1	36.3	36.0	36.2	36.0	36.2	36.1	36.2	36.0	
吕 刚	36.2	36.3	36.2	36.3	36.3	36.3	36.2	36.2	36.3	36.2	36.3	36.2	36.3	36.2	36.2	36.3	36.3	36.0	36.2	36.1	36.2	36.3	36.2	
叶海龙	36.2	36.1	36.2	36.3	36.2	36.2	36.3	36.2	36.3	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.3	36.2	36.2		
高井平	36.2	36.2	36.1	36.4	36.2	36.1	36.2	36.1	36.1	36.2	36.1	36.0	36.2	36.2	36.1	36.2	36.1	36.2	36.1	36.4	36.2	36.3		
吴亚新	36.1	36.3	36.1	36.1	36.2	36.2	36.1	36.0	36	36.1	36.2	36.2	36.1	36.3	36.1	36.2	36.4	36.2	36.1	36.3	36.2	36.2		
于甲刚	36.1	36.1	36.1	36	36.1	36.1	36.2	36.2	36	36.1	36.3	36.4	36.2	36.1	36.2	36.4	36.2	36.1	36.2	36.4	36.2	36.3		
谭柏立	36.3	36.2	36.1	36.2	36.1	36.1	36.2	36.4	36.1	36.1	36.2	36.1	36.1	36.2	36.1	36.3	36.1	36.3	36.1	36.1	36.1	36.2		
丁振军	36.2	36.1	36.2	36.2	36.2	36.2	36.1	36.5	36.2	36.3	36.2	36.2	36.2	36.3	36.2	36.2	36.2	36.4	36.2	36.3	36.2	36.3		
杜学利	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.4	36.2	36.3	36.2	36.1	36.2	36.2	36.2	36.1	36.2	36.3	36.1	36.2	36.2	36.1		

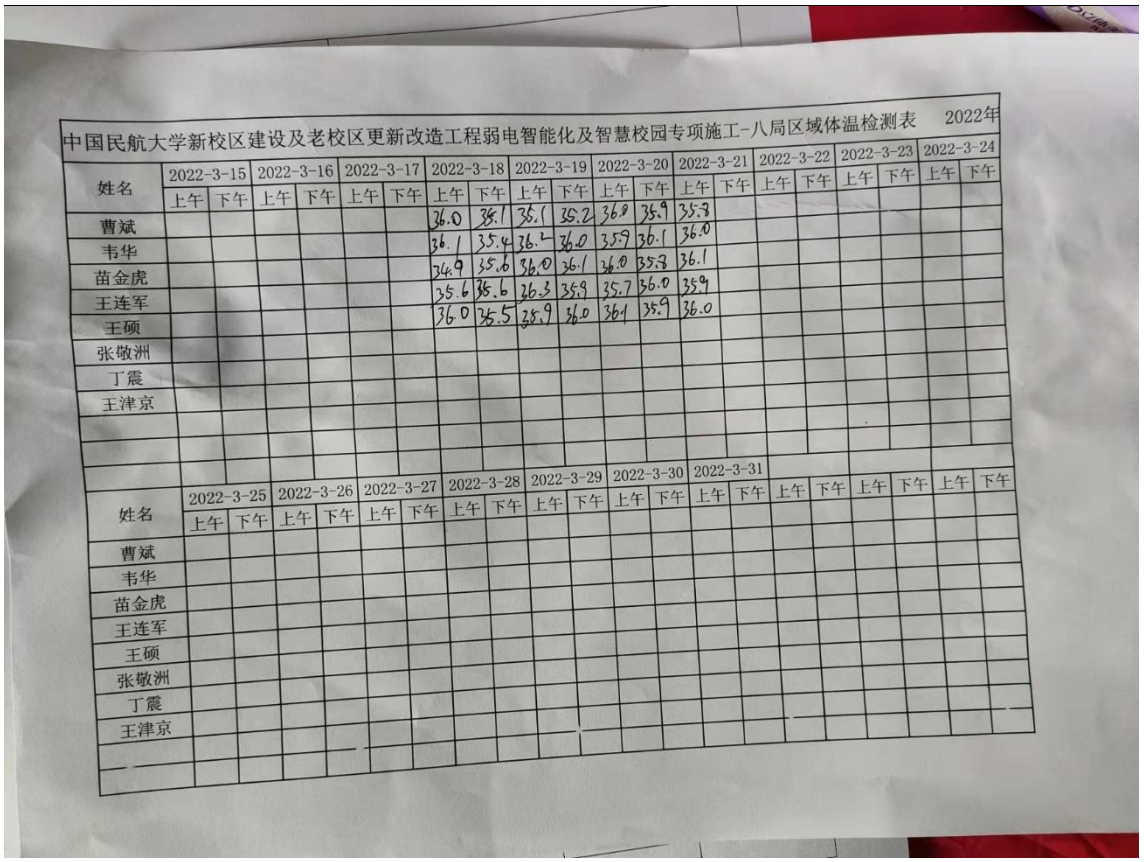
2022/3/21 06:50



中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程弱电智能化及智慧校园专项施工-八局区域体温检测表 2022年

姓名	2022-3-15		2022-3-16		2022-3-17		2022-3-18		2022-3-19		2022-3-20		2022-3-21		2022-3-22		2022-3-23		2022-3-24	
	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午
刘志伟					36.1	36.1	36.2	36.2	36.2	36.8			36.3							
梁东阁					36.9	36.7	36.4	36.3	36.1	36.6	36.3	36.6	36.2							
刘玉坦					36.5	36.5	36.5	36.3	36.2	36.5	36.0	36.5	36.3							
刘欣					36.6	36.3	36.6	36.4	36.3	36.3			36.3							
韩艳客					36.7	36.8	36.3	36.1	36.3	36.4	36.2	36.4	36.1							
耿心占					36.5	36.6	36.3	36.3	36.5	36.7	36.5	36.5	36.6							
那洪岗					36.6	36.6	36.6	36.5	36.5	36.6	36.2	36.4	36.4							
武晓赛					36.3	36.5	36.7	36.5	36.6	36.7	36.3	36.4	36.4							

姓名	2022-3-25		2022-3-26		2022-3-27		2022-3-28		2022-3-29		2022-3-30		2022-3-31							
	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午
刘志伟																				
梁东阁																				
刘玉坦																				
刘欣																				
韩艳客																				
耿心占																				
那洪岗																				
武晓赛																				



中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程弱电智能化及智慧校园专项施工-八局区域体温检测表　2022年

姓名	2022-3-15		2022-3-16		2022-3-17		2022-3-18		2022-3-19		2022-3-20		2022-3-21		2022-3-22		2022-3-23		2022-3-24	
	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午
曹斌							36.0	36.1	35.1	35.2	36.0	35.9	35.8							
韦华							36.1	35.4	36.2	36.0	35.9	36.1	36.0							
苗金虎							34.9	35.6	36.0	36.1	36.0	35.8	36.1							
王连军							35.6	36.6	36.3	35.9	35.7	36.0	35.9							
王硕							36.0	35.5	35.9	36.0	36.1	35.9	36.0							
张敬洲																				
丁震																				
王津京																				

姓名	2022-3-25		2022-3-26		2022-3-27		2022-3-28		2022-3-29		2022-3-30		2022-3-31							
	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午
曹斌																				
韦华																				
苗金虎																				
王连军																				
王硕																				
张敬洲																				
丁震																				
王津京																				

每日体温监测

恒益建安能源专项施工日报

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格								
	作业面\项目每日情况报告 项目每日情况报告表							表格编号	
								HYJA-MHDX-NYGC-001	
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程能源专项工程								
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：00184	2022 年 3 月 21 日				√					
作业计划编号		天气	非常晴朗☑　晴朗☐　多云☐　雨☐　雪☐　冰冻☐							
施工部位	能源站	温度	⩽0 度☐　0 度～10 度☑　10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐　⩾30 度☐							

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司 项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告 项目每日情况报告表	表格编号 HYJA-MHDX-NYGC-001

		风力	静风□ 中等□ 大风□ 台风□
		湿度	干燥□ 中等□ 湿润□

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数	作业工人数	主要工作内容
恒益建安	3	现场安排 15 人	能源站管道、阀门安装；烟囱安装
恒益建安	0	现场安排 0 人	
恒益建安	1	现场安排 22 人	水平连管开挖、接管、回填
施工人员合计	4	37 人	新增人员 0，项目人员体温正常

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
挖掘机	200	良好	5

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				

五、施工完成情况	能源站	**本日施工内容：** 能源站管道、阀门安装；烟囱安装
		整体完成情况： 能源站管道、阀门安装 72%；烟囱安装 100%
施工完成情况	中深层地源热井	**本日施工内容：施工完成**
		整体完成情况：
	浅层地源热井	**本日施工内容：** 第三系统第三条沟打压合格回填，第六系统第三条沟打压合格回填，第十三系统第二条沟连接完成打压合格回填，第十四系统第二条沟打合格回填，第十六系统第三条沟打压合格回填，第一系统第二条沟开始开连接，第四系统第三条沟开始连接，第十五系统第二条沟开沟完成
		第三系统第三条沟打压合格回填 50%，第六系统第三条沟打压合格回填 50%，第十三系统第二条沟连接完成打压合格回填 50%，第十四系统第二条沟打合格回填 50%，第十六系统第三条沟打压合格回填 50%，第一系统

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告 项目每日情况报告表	表格编号 HYJA-MHDX-NYGC-001
		第二条沟开始开连接 30%，第四系统第三条沟开始连接 30%，第十五系统第二条沟开沟完成 100%
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	对高处作业施工进行专项巡视检查	
八、技术质量管理情况	施工进行全过程质量监管，日常机械监测，危险源辨识等。	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	/	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜:**	
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☐；5、项目生产经理（项目总工）☐；6、项目工程部☐；7、项目资料室☐	

现场施工影像

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">能源站管道、阀门安装；烟道安装；第三系统第三条沟打压合格回填，第六系统第三条沟打压合格回填，第十三系统第二条沟连接完成打压合格回填，第十四系统第二条沟打合格回填，第十六系统第三条沟打压合格回填，第一系统第二条沟开始开连接，第四系统第三条沟开始连接，第十五系统第二条沟开沟完成</td></tr>
</table>

35KV 变电站

	中国建筑**项目管理表格**									
	作业面\项目每日情况报告表					表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001				
项目名称及编码	中国民航大学宁河校区 35kV 变电站工程电源线工程									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：0031	2022 年 3 月 21 日				✓					
作业计划编号		天气	非常晴朗☐ 晴朗☑ 多云☐ 雨☐ 雾☐ 雪☐ 冰冻☐							
施工部位	35kv 变电站电源线在外线	温度	⩽0 度☐ 0 度～10 度☑10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐ ⩾30 度☐							

	中国建筑项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号	ZTWJ-MHDX-SWGC-001

		风力	静风☑中等☐ 大风☐ 台风☐
		湿度	干燥☑ 中等☐ 湿润☐

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数	作业工人数	主要工作内容
宁东盛源电力	2	15	挖电缆沟 180 米、下沟槽 3 处、下排管绑钢筋 170 米、浇注包封 140 米、浇注垫层 100 米
宁东盛源电力			
天津中源电力工程监理有限公司	2		
施工人员合计	4	15	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
自卸货车			
挖掘机	75	良好	1
挖掘机	210	良好	1
挖掘机			

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				

五、施工完成情况	项目部	本日施工:
		整体完成情况:
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、对现场机械进行安全检查；2、对施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改；3、施工人员班前喊话。	

	中国建筑**项目管理表格**	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001
八、技术质量管理情况		
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	/	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：** /	
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☑；5、项目生产经理（项目总工）☑；6、项目工程部☑；7、项目资料室☐	

现场施工影像





	SHOT ON REDMI K30 AI QUAD CAMERA
