建设单位：中国民航大学宁河校区

施工单位：中国建筑第八工程有限公司（一标段）

中国建筑第三工程有限公司（二标段）

监理单位：全资

日期：2021 年 4 月 25 日星期日

天气：多云，风力中等

【目录】

一.　工地疫情防护情况

二.　现场人员设备情况

三.　材料物资进场情况

四.　工程进度情况

五.　现场作业影像

一、疫情防控情况

按本项目疫情防控工作方案和应急预案抓好工地常态化疫情防控工作，防疫物资储备充足，无疫情发生。

二、现场人员设备情况

中建八局（一标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建八局	42	9	现场管理、方案编制
天宇信达	5	317	图书馆一次结构
肥城环宇	1	13	机电安装
北京慧欣	2	29	机电安装
永达保信	1	20	文明施工
天津金拓	1	1	降水运行
天津科顺	1	4	防水施工
唐山彬达	7	371	教学组团一次结构
东方城	4	9	钢结构施工
福建聚利	2	3	幕墙安装
鼎立安	2	12	外架搭设
合计	68	788	
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
挖掘机	200 型	良好	2
叉车		良好	2
洒水车		良好	1
雾炮车		良好	2
钢筋切断机	40 型	良好	5
钢筋弯曲机	50 型	良好	5
钢筋调直机	50 型	良好	2
钢筋箍筋弯曲机	25 型	良好	3
自卸吊	9m	良好	1
挖机	60 型	良好	0
十轮		良好	0
吊车	50t	良好	1

中建三局（二标段）

现场人员情况			
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	28/10	/	方案编制、现场施工管理
天津欣蕊	2/0	8/4	2#宿舍楼房芯回填
三局二安	6/0	75/41	师生活动中心、学生食堂、宿舍楼、体育馆水电预留预埋
梁平荣安	20/0	668/334	模板支设、拆除、满堂架搭设，钢筋清理、绑扎；砼浇筑，清理现场
三局一公司钢构	4/0	10/0	师生活动中心钢梁安装，高强螺栓安装，指挥部防火涂料喷涂
北京东方雨虹防水工程有限公司	1/0	0/0	
山东海灏装饰设计有限公司	4/0	51/24	竖铝龙骨，满焊，墙面抹灰，轻钢龙骨隔断封板，木望板安装
现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	1
塔吊	TC6012	良好	2
	TC7013	良好	2
	XGT6513	良好	2
汽车吊	50t	良好	2
挖掘机	330 型	良好	1
	200 型	良好	1
	90 型	良好	1
自卸汽车	20m³	良好	0

三、物资进场情况

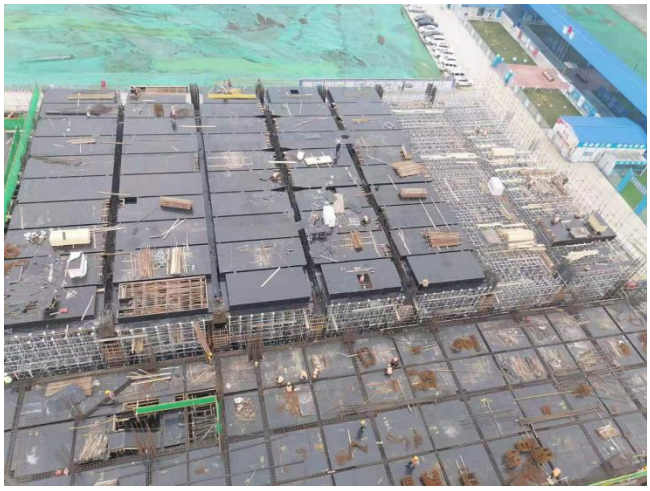
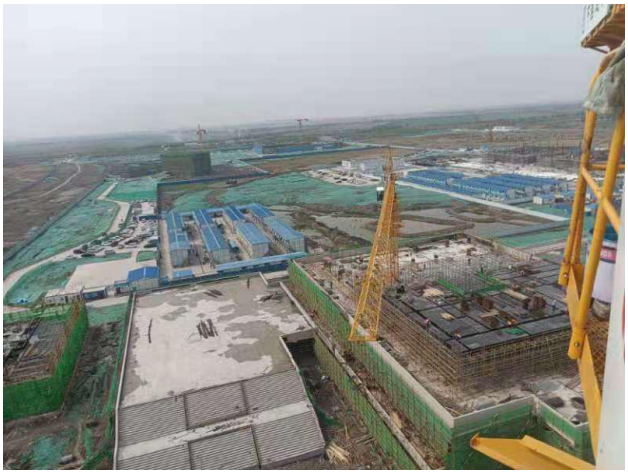
中建八局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
中建三局					
物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
盘扣		38 吨	合格		
钢管		16T	合格		

四、工程进度情况

中建八局 （一标段）	①图书馆 41 口井正常降水，8 口观测井水位正常； A 区地库顶板混凝土浇筑完成，A 区首层顶板支模架体搭设完成 95%，首层顶板支模完成 75%，首层墙柱钢筋绑扎完成 85%，首层钢柱吊装完成 100%，B 区地库顶板混凝土浇筑完成，C 区地库顶板混凝土浇筑完成。外墙修补及清理完成 70%。 ②机场学院教学实验楼屋面架体搭设 95%。 ③公共教学楼 3 层模板完成 90%，钢筋完成 90%。 ④飞行乘务大楼 3 层模板完成 90%，钢筋完成 85%。 ⑤模拟舱 2 层模板完成，钢筋完成，验收完成。
中建三局 （二标段）	1、体育馆一区、二区二层柱钢筋绑扎完成 40%，二层满堂架搭设完成 50%，台阶斜梁钢筋绑扎完成 85%，三区顶板、梁钢筋绑扎完成 85%，四区高支模区域架体搭设完成，框架柱钢筋绑扎完成，模板支设完成 70%； 2、师生活动中心五层顶板、梁钢筋绑扎完成 60%； 3、指挥部幕墙材料进场下料，竖铝龙骨，满焊完成，屋面天沟龙骨安装完成 40%，墙面抹灰完成，轻钢龙骨隔断封板完成 80%，木望板安装完成 70%，二层地采暖完成 70%。 4、1#B 段六层顶板梁钢筋完成 80%。A 段六层顶板混凝土浇筑完成；2#楼六层顶板下铁钢筋完成 100%；3#楼五层顶板模板完成 100%，二段下铁钢筋绑扎完成 100%，一段梁钢筋绑扎完成 100%；4#楼五层顶板上铁钢筋完成 100%，验收合格，混凝土浇筑；5＃楼七顶板模板完成 90%； 5、食堂二段三层顶板模板完成 100%，竖向钢筋绑扎完成 100%；食堂一段二层顶板浇筑完成，一段三层满堂架搭设完成 30%。 6、35Kv 首层模板支设完成 90%。

五、现场作业影像

<table>
<tr><td colspan="2">中建八局（一标段）</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆首层施工</td><td>图书馆首层施工</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>飞行乘务大楼验收</td><td>三间巡查</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>飞行乘务大楼钢筋绑扎</td><td>飞行乘务大楼钢筋验收</td></tr>
</table>

中建三局（二标段）	
	
体育馆一区、二区二层柱钢筋绑扎完成 40%，二层满堂架搭设完成 50%，台阶斜梁钢筋绑扎完成 85%	三区顶板、梁钢筋绑扎完成 85%，四区高支模区域架体搭设完成，框架柱钢筋绑扎完成，模板支设完成 50%；
	
师生活动中心五层顶板、梁钢筋绑扎完成 60%；	指挥部幕墙材料进场下料，竖铝龙骨，满焊完成，屋面天沟龙骨安装完成 40%，墙面抹灰完成，轻钢龙骨隔断封板完成 80%，木望板安装完成 70%，二层地采暖完成 70%
	
食堂二段三层顶板模板完成 100%，竖向钢筋绑扎完	11#B 段六层顶板梁钢筋完成 80%。A 段六层顶板混凝土

成 100%；食堂一段二层顶板浇筑完成，一段三层满堂架搭设完成 30%	浇筑完成；
	
2#楼六层顶板下铁钢筋完成 100%；	3#楼五层顶板模板完成 100%，二段下铁钢筋绑扎完成 100%，一段梁钢筋绑扎完成 100%；
	
4#楼五层顶板上铁钢筋完成 100%，验收合格，混凝土浇筑	5＃楼七顶板模板完成 90%；
	
35Kv 首层模板支设完成 90%	
