



图书馆 A 区半地下室顶板混凝土浇筑完成，A 区首层顶板支模架体搭设完成 100%，首层顶板支模完成 100%，首层顶板钢筋绑扎完成 100%，首层钢柱吊装完成 100%，A 区首层混凝土浇筑完成 80%。A 区二层架体搭设 60%。B 区地库顶板混凝土浇筑完成，C 区地库顶板混凝土浇筑完成。外墙修补及清理完成 80%，地库外墙防水施工完成 70%，土方回填完成 60%。

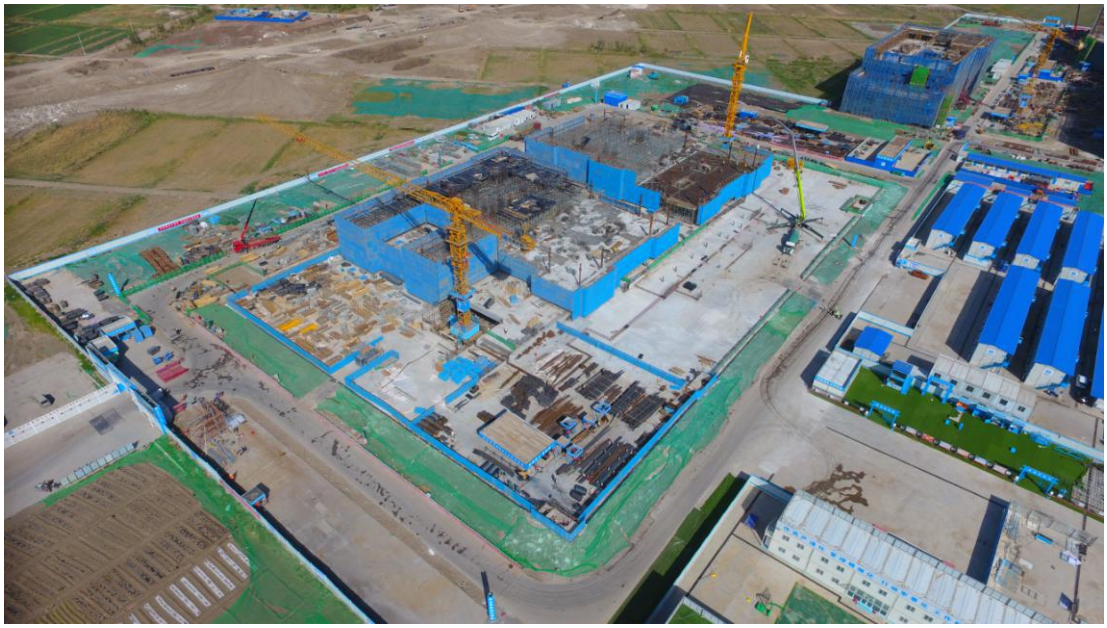

图书馆效果图


教学区组团

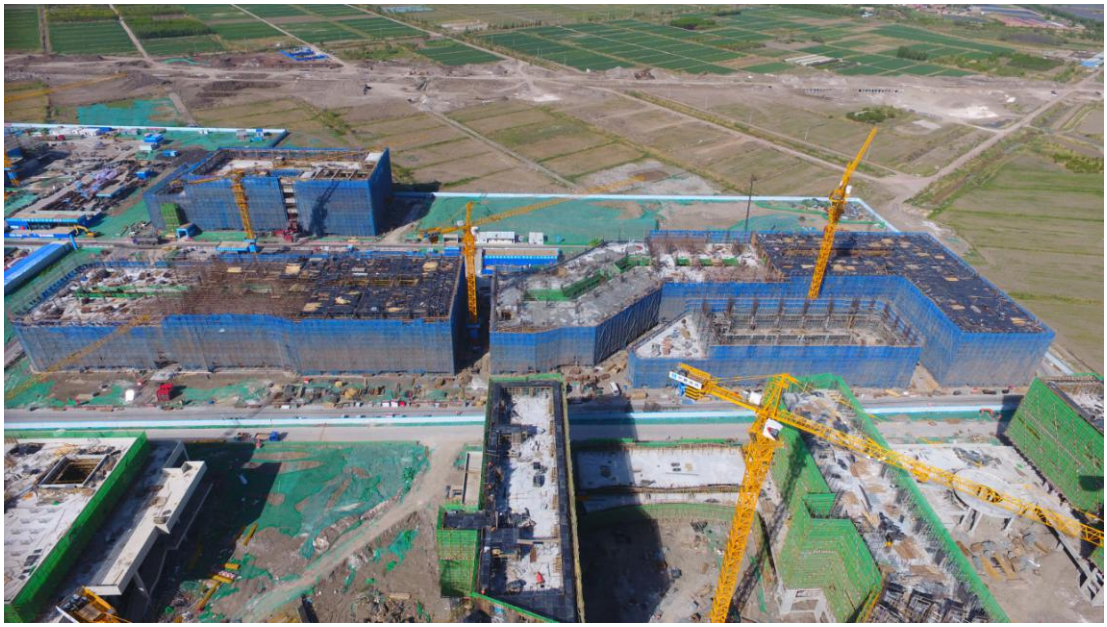

机场学院教学实验楼屋面混凝土养护完成；公共教学楼 4 层架体搭设完成 90，顶板支模完成 30%。飞行乘务大楼 4 层架体搭设完成 95%，顶板支模完成 20%。模拟舱 3 层架体搭设完成 75%。



教学组团效果图

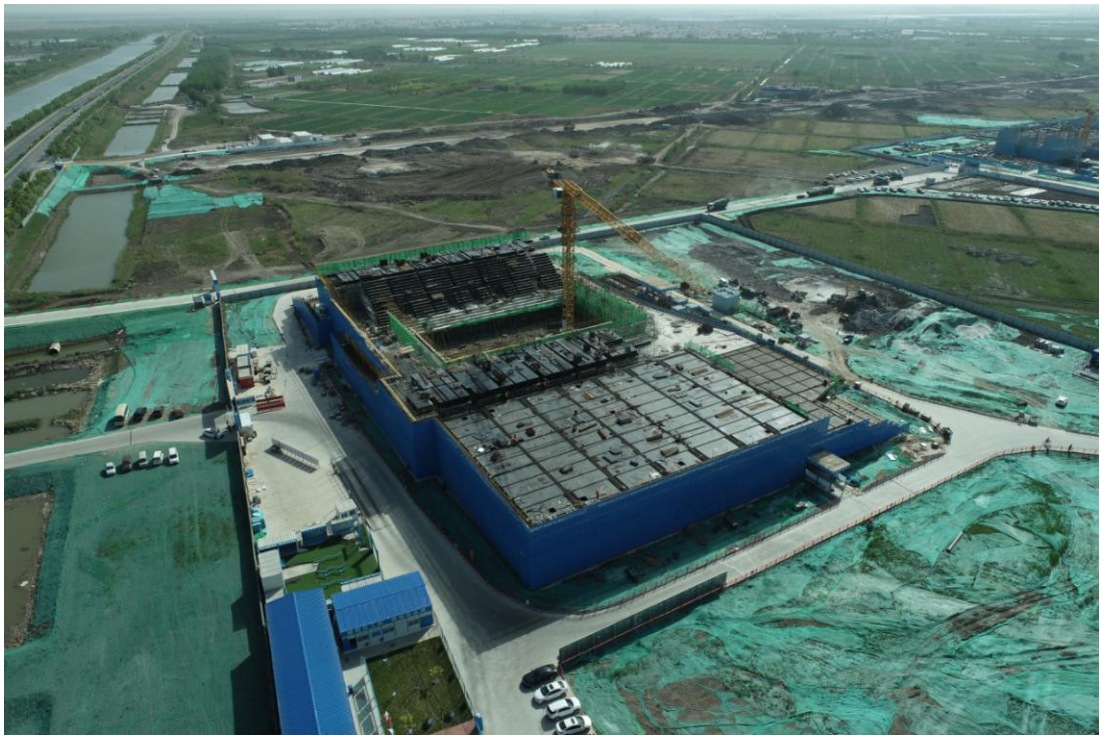

体育馆一区、二区二层柱钢筋绑扎完成 45%，二层满堂架搭设完成，看台及顶板模板支设完成 80%，台阶斜梁、板钢筋绑扎完成 95%，三区四区二层顶板、梁模板支设完成 70%，四区高支模区域顶板梁模板支设完成 94%梁钢筋绑扎完成



体育馆效果图



1#B 段机房层钢筋完成 85%。A 段机房层钢筋绑扎完成 100%，顶板搭设完成；2#机房层钢筋绑扎完成 100%，满堂架及顶板完成 100%；3#7 层竖向钢筋完成 100%，模板及满堂架完成 50%；4#7 层竖向模板完成 80%，满堂架 60%，4#楼零层板层浇筑完成；5#8 层顶板上铁钢筋完成 100%




学生宿舍效果图



食堂二段三层顶板浇筑完成 100%。食堂一段 3 层顶板浇筑完成




学生食堂效果图

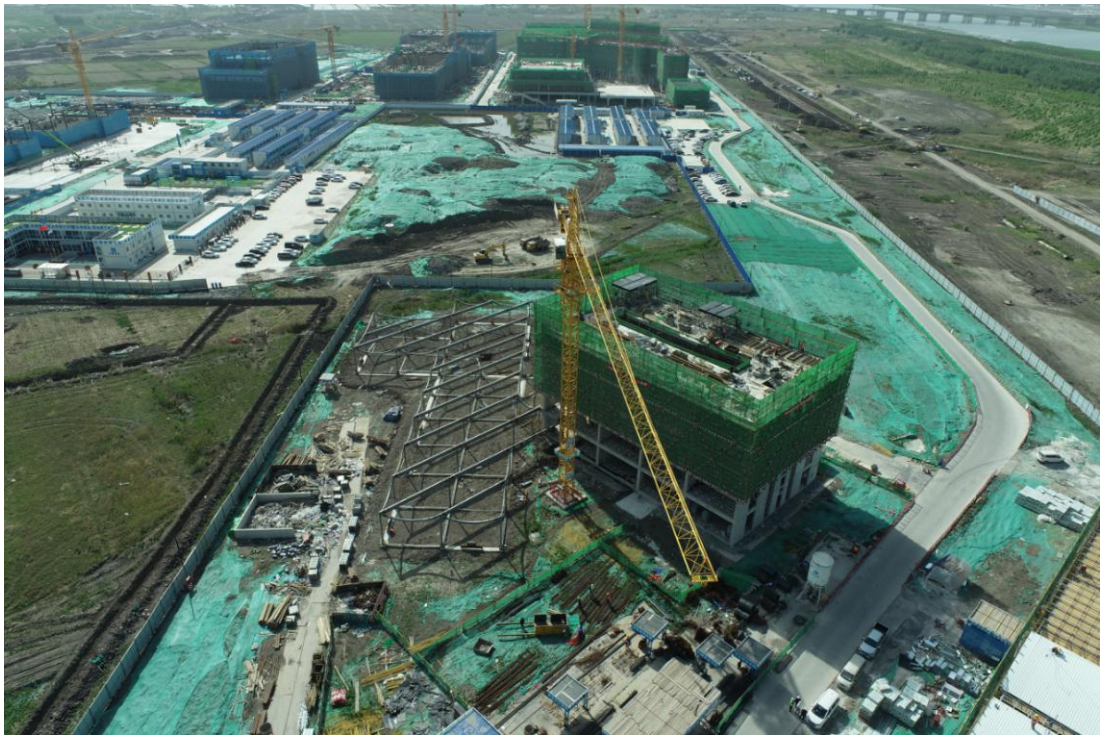

师生活动中心五层顶板设备支墩模板支设完成 60%；首层二次结构放线、植筋、反坎浇筑砼



师生活动中心效果图

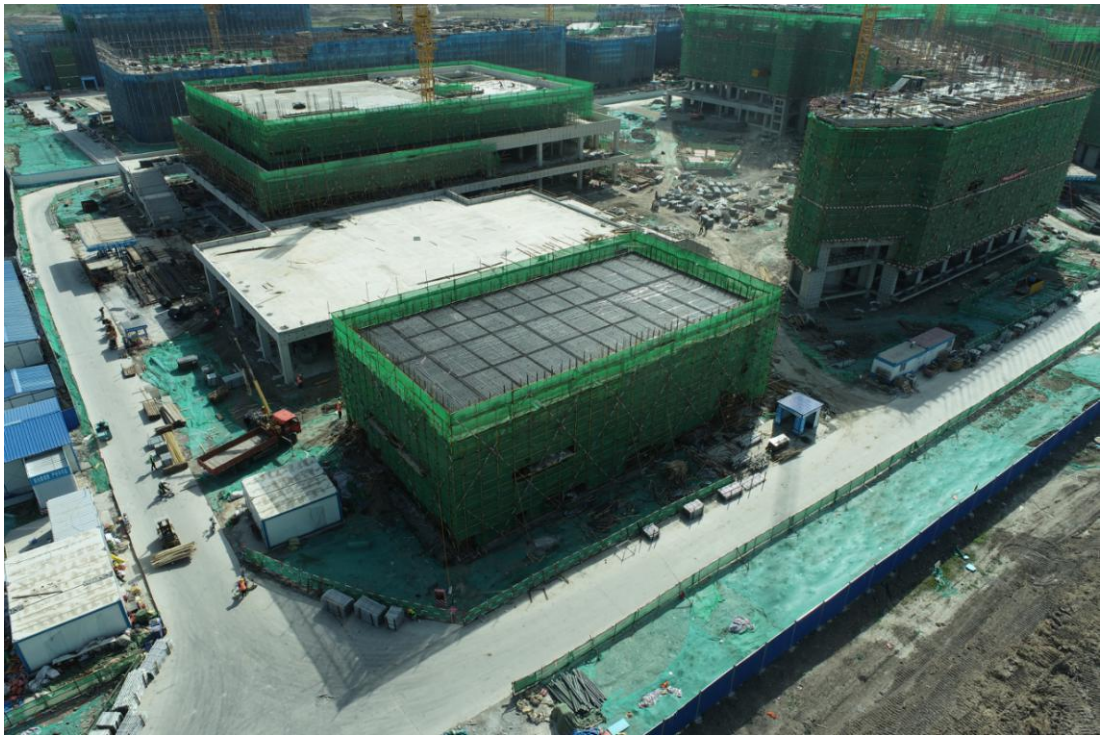

35KV 变电站二层浇筑完成



指挥部屋面天沟龙骨安装满焊完成 95%，轻钢龙骨隔断封石膏板板完成 43%，轻钢龙骨隔墙填岩棉完成 59%，窗帘盒安装完成 80%；一层地采暖地面混凝土完成 60%；金属屋面施工主檩条完成 100%，彩色底板完成 40%，几字檩条安装完成 10%。
