中国民航大学宁河校区 9 月 17 日工程日报

一、施工概要

1	图书馆	**本日施工内容**:二次结构施工；钢结构屋面钢梁吊装； 抹灰施工；钢结构楼承板混凝土浇筑；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理
		总体完成情况:图书馆二次结构施工完成 89%；抹灰完成 10%；钢结构安装完成 98%；机电安装 71%；幕墙安装完成 36%；
2	机场学院教学实验楼	**本日施工内容**:二次结构施工；抹灰施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；防水施工；现场文明施工清理，
		总体完成情况: 二次结构施工完成 100%；抹灰完成 83%；机电安装 71%；幕墙安装完成 75%；屋面防水施工完成 100%
3	公共教学楼	**本日施工内容**: 二次结构施工；抹灰施工；防水施工；幕墙施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；屋面施工；现场文明施工清理
		总体完成情况: 二次结构施工完成 100%，机电安装完成 80%；抹灰完成 87%；防水施工完成 50%；幕墙安装完成 65%；
4	飞行乘务大楼及模拟舱楼	**本日施工内容**:二次结构施工；屋面混凝土找坡层浇筑；幕墙龙骨施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；屋面施工；现场文明施工清理
		总体完成情况：二次结构施工完成 98%；抹灰完成 52%；机电安装完成 70%；幕墙采光顶安装完成 70%；屋面找平层施工完成 100%；模拟舱基础完成 100%；
5	体育馆	**本日施工内容**：首层墙体砌筑，反坎、构造柱、系梁混凝土浇筑，二层系梁构造柱支模，三层架体整改，钢结构桁架拼装、主桁架吊装。机电安墙体切槽配管排堵。
		整体完成情况：二次结构施工完成 58%；钢结构完成 87%；机电安装完成 16%。
6	师生活动中心	**本日施工内容**：主楼楼内地面基层清理，土方回填土、裙房 A 管沟零层板钢筋下料。机电安装受损线管维修，消防进场。
		整体完成情况：主体结构完成 99%；主楼粗装修完成 58%；机电安装完成 44%
7	学生食堂、	**本日施工内容**：食堂抹灰打点完成，能源站设备基础混凝土浇筑完成，幕墙安装副框，复查窗口尺寸完成，机电安装风管加工及安装，划线定位，配管施工。（幕墙、二次结构 18 号复核食堂预埋件问题）
		整体完成情况：食堂二次结构收尾完成，能源站二次结构完成 90%（剩余墙体带设备进场后砌筑）；机电安装完成 28%，放线锅炉房基础、能源站基础养护。
8	1#学生宿舍	**本日施工内容**：1#楼 A 段五层抹灰；B 段六层抹灰；门窗副框安装，屋面轻集料浇筑。电安装 A 段一层支架安装，二层排水安装，三层卫生间开洞。B 段一层样板间穿线装插座开

		关。	
		整体完成情况：二次结构完成 98%；初装修完成 75%；机电安装完成 40%.	
9	2#学生宿舍	**本日施工内容**：五层抹灰，六层抹灰，门窗副框安装，屋面找平层施工；机电安装管井内排水，采暖管安装，加套管。	
		整体完成情况：二次结构完成 98%；初装修完成 70%；机电安装完成 42%	
10	3#学生宿舍	**本日施工内容**：屋面设备基础支设，砼浇筑；三层抹灰，二层、四层拉毛；门窗副框安装；机电安装四层卫生间给水管安装，八层二次配管，九层配管、装箱、稳线盒，楼梯间开槽及二次配管。	
		整体完成情况：二次结构完成 98%；初装修完成 14%；机电安装完成 32%	
11	4#学生宿舍	**本日施工内容**：二层抹灰，六层拉毛；屋面层墙体砌筑，砼浇筑，门窗副框安装，机电安装一层疏通排堵，八层桥架，九层疏通排堵，宿舍及卫生间配管，九层划线定位、开槽及稳线盒。	
		整体完成情况：二次结构完成 98%；初装修完成 50%；机电安装完成 36%	
12	5#学生宿舍	**本日施工内容**：6 层抹灰；门窗副框安装，5#楼机电安装竖井桥架安装，八、九层疏通排堵。	
		整体完成情况：二次结构完成 98%；初装修完成 53%；机电安装完成 38%	
13	35Kv 变电站	未施工	
14	垃圾站	未施工	
15	弱电专项施工（江森自控）	宿舍楼	**本日施工内容**：现场管材敷设
			总体完成情况：1#宿舍 A 楼 2 层管材敷设作业，1#宿舍 2 楼总体完成 17%。
16	能源专项施工（恒益建安）	办公区、能源站	**本日施工内容：**现场查看食堂冷却塔及能源站内基础制作情况食堂冷却塔钢架平台下料制作
			整体完成情况：现场查看冷却塔基础制作情况 100%；食堂冷却塔钢架平台下料制作 100%
		中深层井场	**本日施工内容：**中深层井场钻机进场
			整体完成情况：中深层井场钻机进场 100%
17	中铁五局	项目部	**本日施工内容：**编制水准点复核并引测记录及联系单，技术人员图纸审核。
			整体完成情况：完成水准点复核并引测记录，工

			作联系单提交监理部。
18	人员情况	八局今日劳动力人数 484 人。三局今日劳动力人数 475 人。中铁五局今日劳动力人数 2 人，江森自控今日劳动人数 10 人恒益建安今日劳动人数 6 人。	

二、监理日报

一标段：

1.现场巡视。检查图书馆砌筑，钢结构屋面钢梁吊装；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场安全文明清理情况，施工正常。

2.现场巡视。检查实验楼砌筑，机电安装给排水管道、通风管道、空调水管道、屋面施工,防水施工，现场文明施工清理情况，施工正常。

3.现场巡视。检查公共教学楼砌筑，幕墙施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；屋面施工；现场文明施工清理情况，施工正常。

4.现场巡视。检查飞乘大楼砌筑，幕墙龙骨施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；屋面施工；现场文明施工清理情况，施工正常。

二标段：

1.监理部对体育馆钢结构吊装焊接施工及二次结构砌筑巡视检查。

2.对师生活动中心主楼墙面抹灰工程及水电风管安装施工及地暖施工巡视检查。

3.对学生食堂水电风管安装施工巡视检查，能源站二次结构砌筑巡视检查，符合设计要求。

4.对学生宿舍各单体二次结构施工、墙面抹灰工程、屋面找坡及水电风管安装施工巡视检查。

5.对南校门补桩进行巡检。

6.对匠人清水混凝土公司进行现场考察。

室外、能源及弱电：

1.能源：现场查看食堂冷却塔及能源站内基础制作情况食堂冷却塔钢架平台下料制作，中深层井场设备基础底座养护;发车已经到达天津。

2.弱电：现场扫管。

3.室外：编制水准点复核记录，排水管厂家考察。

三、监理明日工作安排

标段划分	单体名称	监理人员	施工内容	监理工作时间、内容及路线	备注
一标段 刘刚 （15162265570）	图书馆	刘刚 （18082566239）	钢结构施工、二次结构施工	对图书馆施工进行巡视检查	
		张春博 （13027722180）		对图书馆施工进行巡视检查，旁站砼浇筑施工	
		刘浩 （13400385767）		对图书馆施工进行巡视检查，旁站砼浇筑施工	
	教学组团	马瑞峰 （15614235758）	二次结构施工	对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查，旁站砼浇筑。	
		任海博 （18082566239）		对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查。	
		乔天航 (18547607857)		对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查，旁站砼浇筑。	
	所有单体安装工程	滕洪亮 （13234049175） 张春博 （13027722180）	给排水及消防工程、暖通工程、机电安装工程施工	对现场施工巡视检查	

二标段 林利民 （18640512507）	体育馆	李晓峰 （15102669182） 党泽南 （13630253982）	钢结构施工、二次结构施工	对现场施工进行巡视检查	
	指挥部		未施工	对现场施工巡视检查	
	师生活动中心		二次结构施工、抹灰施工	对现场施工巡视检查	
	3#、4#、5#学生宿舍	于烨 （13081821380） 李会彬 （15512769592）	二次结构施工、抹灰施工	对学生宿舍屋面砌筑施工，墙体抹灰施工进行巡视检查	
	1#、2#学生宿舍、食堂	吕非凡 （17532527058） 李宝华 （13673126287） 马一博 （17692498058）	二次结构施工、抹灰施工	对学生宿舍、学生食堂屋面砌筑施工，墙体抹灰施工进行巡视检查	
	垃圾房		未施工	未施工	
	35kv 变电站		未施工	未施工	
	所有单体安装工程	滕洪亮 （13234049175） 李会彬 （15512769592）	给排水及消防工程、暖通工程、机电安装工程施工	对现场施工巡视检查	

室外	一标段	刘刚 （18082566239） 张春博 （13027722180）	未施工	未施工	
	二标段	林利民 （18640512507 于烨 （13081821380）	未施工	未施工	
弱电	一标段	滕洪亮 （13234049175） 刘浩 （13400385767）	未施工	未施工	
	二标段	滕洪亮 （13234049175） 吕非凡 （17532527058）	未施工	未施工	
能源	二标段	滕洪亮 （13234049175） 李会彬 （15512769592）	平整场地	对现场施工巡视检查	

四、施工单位日报

一标段施工日报

	中国建筑　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告表								表格编号	
									CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101	
项目名称	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：144	2021 年 9 月 17 日								√	
作业计划编号		天气	非常晴朗☐　晴朗☐　多云☑　雨☐　雪☐　霾☐							
施工部位	图书馆 机场学院教学实验楼 公共教学楼 飞行乘务大楼及模拟舱楼	温度	≤0 度☐　0 度～10 度☐　10 度～21 度☐ 21 度～30 度☑　≥30 度☐							
		风力	静风☐　中等☑　大风☐　台风☐							
		湿度	干燥☐　中等☐　湿润■							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建八局	40	40	现场管理、方案编制
天宇信达	2	10	图书馆一次结构
肥城环宇	2	18	机电安装
北京慧欣	2	31	机电安装
永达保信	2	20	文明施工
天津金拓	1	1	降水运行
天津科顺	1	4	防水施工
唐山彬达	2	4/2	教学组团一次结构
东方诚	5	36	钢结构施工
福建聚利	6	27	幕墙安装
鼎立安	1	12	外架搭设
天宇信达（二构）	9	205	二次结构施工
天津俊凯	2	22	机电通风
宏坤煜业	3	34/6	机电通风
恒福消防	2	12	机电消防
堡泰消防	2	8	机电消防
合计	82	484	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班

	中国建筑　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告表		表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
货用施工升降机	SC120/120	良好	6
物料提升机	AC/200	良好	1
叉车	1 台	良好	4
洒水车	1 辆	良好	1
雾炮车	2 台	良好	2
钢筋切断机	40 型	良好	5
钢筋弯曲机	50 型	良好	5
钢筋调直机	50 型	良好	2
钢筋箍筋弯曲机	25 型	良好	3
塔吊	XGT7527	良好	2
塔吊	TC7013-10D	良好	3
挖机	60 型	良好	1
挖机	200 型	良好	1

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

时间	姓名	单位	工作目的	备注

五、进度完成情况	图书馆	本日施工内容:二次结构施工；钢结构屋面钢梁吊装； 抹灰施工；钢结构楼承板混凝土浇筑；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理
		总体完成情况:图书馆二次结构施工完成 89%；抹灰完成 10%；钢结构安装完成 98%； 机电安装 71%； 幕墙安装完成 36%；
	机场学院教学实验楼	本日施工内容:二次结构施工；抹灰施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道； 防水施工； 现场文明施工清理，
		总体完成情况: 二次结构施工完成 100%；抹灰完成 83%；机电安装 71%；幕墙安装完成 75%； 屋面防水施工完成 100%

	中国建筑　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告表		表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
	公共教学楼	本日施工内容：二次结构施工；抹灰施工；防水施工；幕墙施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；屋面施工；现场文明施工清理	
		总体完成情况：二次结构施工完成 100%，机电安装完成 80%；抹灰完成 87%；防水施工完成 50%；幕墙安装完成 65%；	
	飞行乘务大楼及模拟舱楼	本日施工内容：二次结构施工；屋面混凝土找坡层浇筑；幕墙龙骨施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；屋面施工；现场文明施工清理	
		总体完成情况：二次结构施工完成 98%；抹灰完成 52%；机电安装完成 70%；幕墙采光顶安装完成 70%；屋面找平层施工完成 100%；模拟舱基础完成 100%；	
六、业主监理指令			
七、安全管理情况	日常三间巡逻检查，裸土苫盖维护，安全隐患排查以及整改		
八、技术质量管理	对降水运行、防水清理、架体搭设、钢筋施工、二次结构、幕墙安装、钢结构施工进行全过程质量监管，日常机械监测。		
九、过程关键文件			
十、本日重大事项			
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：**		
抄送	1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□； 5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□		

现场作业影像



教学楼防水



图书馆大扫除

	
图书馆抹灰	图书馆大扫除
	
电梯井道拆模	教学楼钢连廊安装

现场航拍图 9.7

<table>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆</td><td>飞行乘务大楼及模拟舱</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>公共教学楼</td><td>机场学院教学实验楼</td></tr>
</table>

二标段

	中国建筑　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告表						表格编号			
							ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101			
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程二标段									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：002	2021 年 9 月 17 日							√		
作业计划编号		天气	非常晴朗☐ 晴朗☑ 多云☐ 雨☐ 雪☐ 冰冻☐							
施工部位	1#-5#宿舍楼；食堂；指挥部；体育馆；师生活动中心	温度	≤0 度 0 度～10 度　10 度～21 度☑ 21 度～30 度 ☑ ≥30 度☐							
		风力	静风☐　中等☑ 大风☐　台风☐							
		湿度	干燥☑　中等☐　湿润☐							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建三局	28/10	/	方案编制、现场施工管理
三局智能	2	/	BIM 建模
天津欣蕊	2/0	4/0	体育馆东侧回填
三局二安	9/0	139/18	师生活动中心配管风管水管安装、宿舍楼、食堂二次配管风管水管安装施工
梁平荣安	6/2	16/0	模板支设、拆除、材料堆码，钢筋清理、绑扎；砼浇筑，清理现场
三局一公司钢构	4/0	26/8	体育馆钢结构屋面桁架焊接、吊装
北京东方雨虹防水工程有限公司	1/0	13/0	吊篮安装、防水施工
山东海灏装饰设计有限公司	5/0	12/0	宿舍楼副框加工、安装
长沙广大	4/0	12/0	食堂钢附框加工、安装
兴华鑫宇	5/0	105/14	二次结构墙体砌筑，构造柱砼浇筑，墙面抹灰
天津津宝福	5/0	102/22	二次结构墙体砌筑，构造柱砼浇筑，墙面抹灰
施工人员合计		413/62	

二、现场机械设备情况

	中国建筑　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号	ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101

设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	1
塔吊	XGT7020	良好	1
物料提升机	SC100/100	良好	6
电梯	SC200/200	良好	3
汽车吊	150t	良好	2
挖掘机	330 型	良好	0
	200 型	良好	1
	90 型	良好	1
推土机		良好	1
自卸汽车	20m³	良好	2
吊篮		良好	65

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
加气块		89.6	合格	合格	
挤塑板		62.5	合格	合格	

四、来访人员情况



时间	姓名	职位	工作目的	备注

五、施工完成情况	体育馆	**本日施工内容：**首层墙体砌筑，反坎、构造柱、系梁混凝土浇筑，二层系梁构造柱支模，三层架体整改，钢结构桁架拼装、主桁架吊装。机电安墙体切槽配管排堵。
		整体完成情况：二次结构施工完成 58%；钢结构完成 87%；机电安装完成 16%。
	师生活动中心	**本日施工内容：**主楼楼内地面基层清理，土方回填土、裙房 A 管沟零层板钢筋下料。机电安装受损线管维修，消防进场。
		整体完成情况：主体结构完成 99%；主楼粗装修完成 58%；机电安装完成 44%
	学生食堂	**本日施工内容：**食堂抹灰打点完成，能源站设备基础混凝土浇筑完成，幕墙安装副框，复查窗口尺寸完成，机电安装风管加工及安装，划线定位，配管施工。（幕墙、二次结构 18 号复核食堂预埋件问题）
		整体完成情况：食堂二次结构收尾完成，能源站二次结构完成 90%（剩余墙体带设备进场后砌筑）；机电安装完成 28%，放线锅炉房基础、能源站基础养护。

	中国建筑　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号	ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101
	1#学生宿舍	**本日施工内容**：1#楼 A 段五层抹灰；B 段六层抹灰；门窗副框安装，屋面轻集料浇筑。电安装 A 段一层支架安装，二层排水安装，三层卫生间开洞。B 段一层样板间穿线装插座开关。	
		整体完成情况：二次结构完成 98%；初装修完成 75%；机电安装完成 40%.	
	2#学生宿舍	**本日施工内容**：五层抹灰，六层抹灰，门窗副框安装，屋面找平层施工；机电安装管井内排水，采暖管安装，加套管。	
		整体完成情况：二次结构完成 98%；初装修完成 70%；机电安装完成 42%	
	3#学生宿舍	**本日施工内容**：屋面设备基础支设，砼浇筑；三层抹灰，二层、四层拉毛；门窗副框安装；机电安装四层卫生间给水管安装，八层二次配管，九层配管、装箱、稳线盒，楼梯间开槽及二次配管。	
		整体完成情况：二次结构完成 98%；初装修完成 14%；机电安装完成 32%	
	4#学生宿舍	**本日施工内容**：二层抹灰，六层拉毛；屋面层墙体砌筑，砼浇筑，门窗副框安装，机电安装一层疏通排堵，八层桥架，九层疏通排堵，宿舍及卫生间配管，九层划线定位、开槽及稳线盒。	
		整体完成情况：二次结构完成 98%；初装修完成 50%；机电安装完成 36%	
	5#学生宿舍	**本日施工内容**：6 层抹灰；门窗副框安装，5#楼机电安装竖井桥架安装，八、九层疏通排堵。	
		整体完成情况：二次结构完成 98%；初装修完成 53%；机电安装完成 38%	
六、业主监理指令	/		
七、安全管理情况	1、对生活区进行检查；2、对现场临时用电进行检查；3、对整个施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改；		
八、技术质量管理情况	1、对体育馆、食堂及宿舍楼墙体砌筑进行检查；2、对师生活动中心及宿舍楼墙体抹灰进行检查。		
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/		
十、本日重大事项	1#塔吊拆除		
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：**		
抄送	1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□		

制，项目生产经理亲自填报整个项目部每日情况报告。报告包括的时间为当天上班时间到次日上班时间,提交报告的时间不迟于次日上午的 12 点

现场施工影像

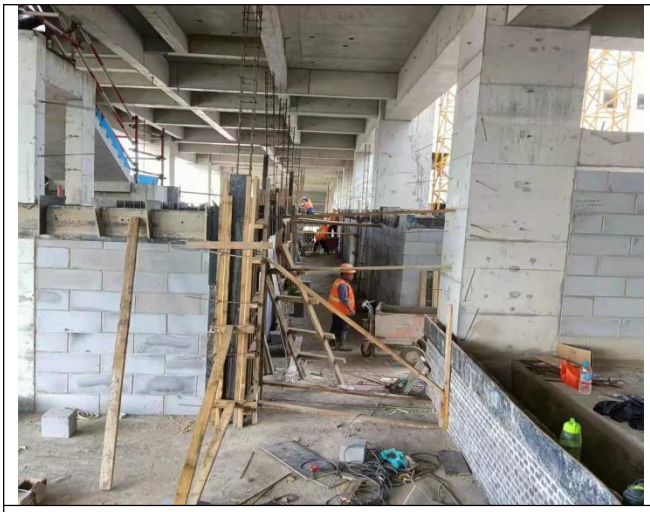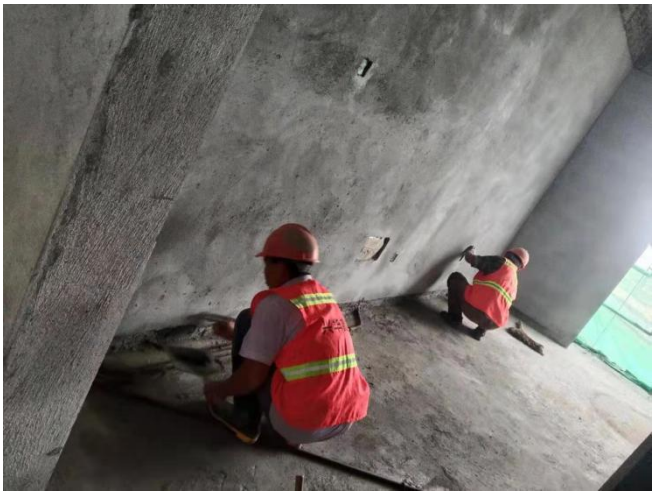	
体育馆首层墙体砌筑，构造柱、系梁浇筑，二层、三层墙体砌筑，变电室墙体模板拆除，钢结构桁架拼装、主桁架吊装焊接	师生活动中心主楼楼内地面基层清理，抹灰收尾，裙房 A 管沟回填
	
食堂抹灰打点完成，能源站设备基础混凝土浇筑完成，锅炉房放线，机电加工风管。	1#楼 A 段五层抹灰；B 段五层抹灰，六层抹灰；门窗副框安装
	
2#楼五层抹灰，门窗副框安装；2 层基层清理	3#楼屋面设备基础，砼浇筑；三层抹灰，二层拉毛；门窗副框安装

	
4#楼六层抹灰；屋面层墙体砌筑，砼浇筑	5#楼 2 层抹灰，6 层拉毛；门窗副框安装
	
体育馆机电安装挖沟，接排水管，配管。	食堂机电安装风管加工及安装，划线定位。
	
1#楼机电安装 A 段一层支架安装，二层排水安装，三层卫生间开洞。B 段一层样板间穿线装插座开关。	2#楼机电安装管井内排水，采暖管安装，加套管。

	
机电安装四层卫生间给水管安装，八层二次配管，九层配管、装箱、稳线盒，楼梯间开槽及二次配管。	4#楼机电安装一层疏通排堵，八层桥架，八层疏通排堵，宿舍及卫生间配管，九层划线定位、开槽及稳线盒。
	
5#楼机电安装竖井桥架安装，八、九层疏通排堵。	

中铁五局室外项目施工日报

中国中铁	中国中铁　项目管理表格								
	作业面\项目每日情况报告表						表格编号		
							ZTWJ-MHDX-SWGC-001		
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程室外施工								
本表顺序号	时　间	星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：033	2021 年 9 月 17 日							√	

中国中铁	中国中铁　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001

作业计划编号		天气	非常晴朗☐ 晴朗☑ 多云☐ 雨☐ 雪☐ 冰冻☐
施工部位	新校区师生活动中心南侧临建设施	温度	≤0 度☐ 0 度～10 度☐ 10 度～21 度☐ 21 度～30 度☑ ≥30 度☐
		风力	静风☑ 中等☐ 大风☐ 台风☐
		湿度	干燥☐ 中等☑ 湿润☐

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数	作业工人数	主要工作内容
中铁五局	5	2	根据现场实际情况编制工作联系单
施工人员合计		2	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
/			

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
/					


四、来访人员情况


时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				


五、施工完成情况	项目部	**本日施工内容：**编制水准点复核并引测记录及联系单，技术人员图纸审核。
		整体完成情况：完成水准点复核并引测记录，工作联系单提交监理部。
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、服从总包单位安全及疫情防控管理。	
八、技术质量管理情况	1、对地上障碍物进行汇总，对排水管生产厂家进行考察。	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	/	


中国中铁	中国中铁　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：** /	
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☑；5、项目生产经理（项目总工）☑；6、项目工程部☐；7、项目资料室☐	

现场施工影像

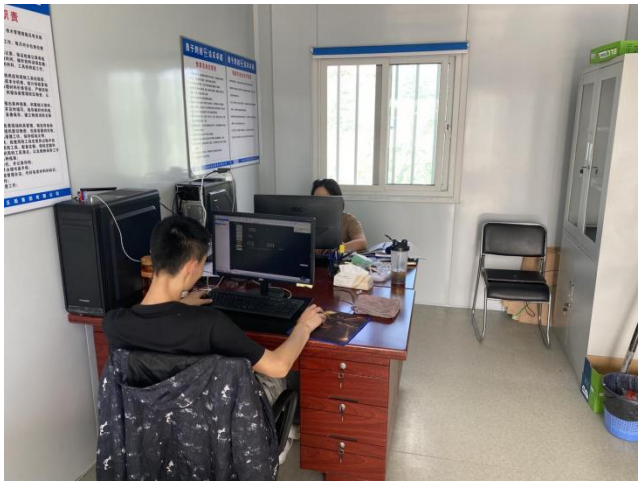

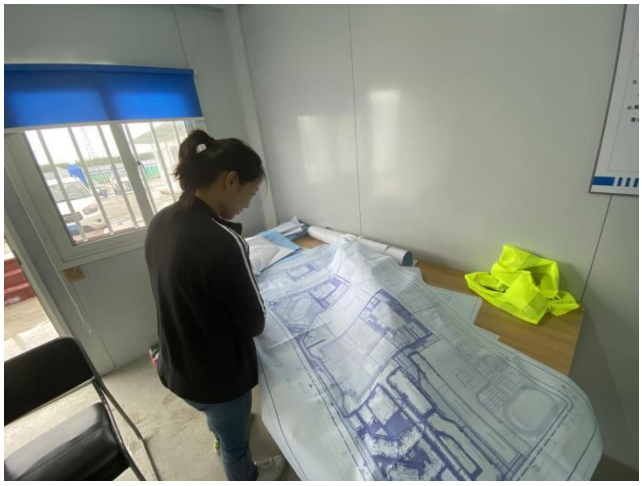

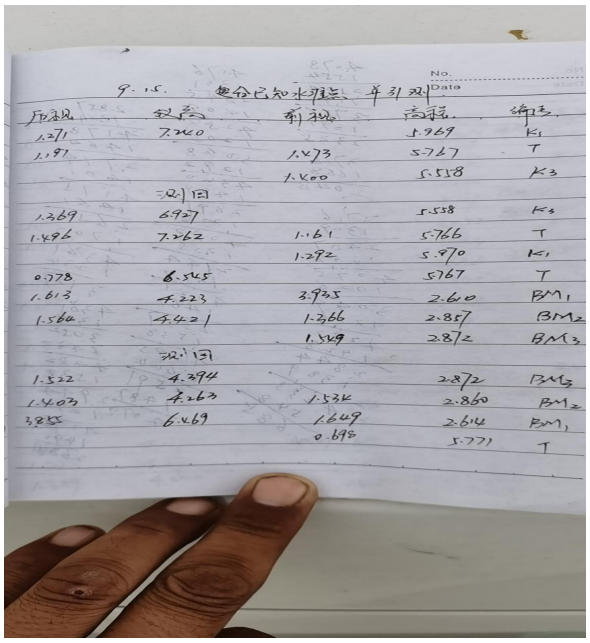

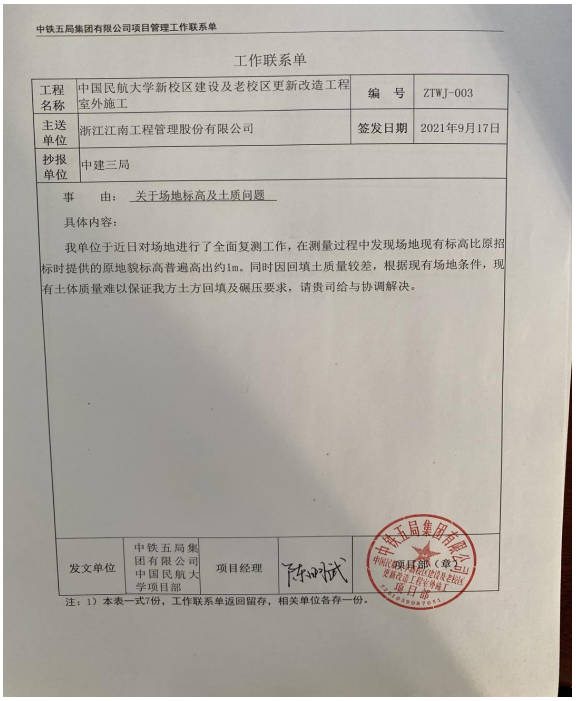

中铁五局集团有限公司项目管理工作联系单

工作联系单

工程名称	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程室外施工	编　号	ZTWJ-003
主送单位	浙江江南工程管理股份有限公司	签发日期	2021年9月17日
抄报单位	中建三局		

事　由：关于场地标高及土质问题

具体内容：

我单位于近日对场地进行了全面复测工作，在测量过程中发现场地现有标高比原招标时提供的原地貌标高普遍高出约1m。同时因回填土质量较差，根据现有场地条件，现有土体质量难以保证我方土方回填及碾压要求，请贵司给与协调解决。

发文单位	中铁五局集团有限公司中国民航大学项目部	项目经理	陈四林	项目部（章）

注：1）本表一式7份，工作联系单返回留存，相关单位各存一份。

编制水准点复核并引测记录及联系单，技术人员图纸审核。

江森自控智慧校园建设弱电专项施工日报

Johnson Controls	北京江森自控有限公司　项目管理表格										
	作业面\项目每日情况报告表									表格编号 JCI-CN23/21:1096 BJJSGCB-PM-2021002	
项目名称	中国民航大学新校区智慧校园建设弱电专项施工										
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六	
NO：032	2021 年 9 月 17 日								√		
作业计划编号		天气	非常晴朗☐　晴朗☐　多云☐　雨☑ 雪☐ 霾☐								
施工部位	全校区	温度	≤0 度☐　0 度～10 度☐　10 度～21 度☐ 21 度～30 度☑　≥30 度☐								
		风力	静风☑　中等☐　大风☐　台风☐								
		湿度	干燥☑　中等☐　湿润☐								

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
北京江森自控有限公司	5	5	现场管理、专业设计
施工	5	5	弱电施工
合计	10	10	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
/			
/			
/	/	/	

三、主要物资（设备）进场情况


物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
/	/	/			

四、来访人员情况

时间	姓名	单位	工作目的	备注

Johnson Controls	北京江森自控有限公司　项目管理表格			
	作业面\项目每日情况报告表		表格编号	JCI-CN23/21:1096 BJJSGCB-PM-2021002
五、进度完成情况	宿舍楼	本日施工内容：现场管材敷设		
		总体完成情况：1#宿舍 A 楼 2 层管材敷设作业，1#宿舍 2 楼总体完成 17%。		
六、业主监理指令				
七、安全管理情况				
八、技术质量管理	新老校区互联方案交流			
九、过程关键文件				
十、本日重大事项				
十一、明日施工计划				
十二、工作小结				
抄送	1、建设方代表□；2、工程监理□；3、项目经理□；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室£			

作业影像

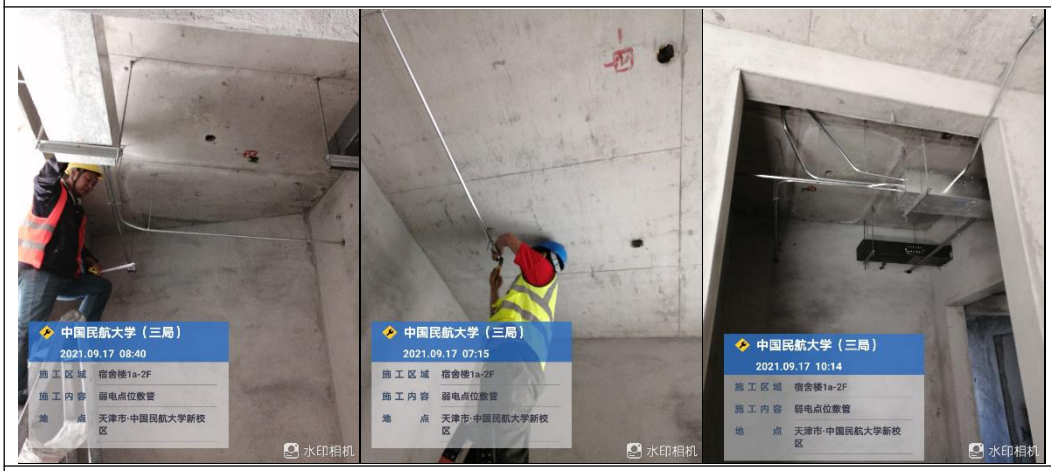

管材敷设



技术交流

恒益建安能源专项施工日报

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格								
	作业面\项目每日情况报告表					表格编号			
						HYJA-MHDX-NYGC-001			
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程能源专项工程								
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：0026	2021 年 9 月 17 日								√	
作业计划编号		天气	非常晴朗☑ 晴朗☐ 多云☐ 雨☑ 雪☐ 冰冻☐							
施工部位	新校区师生活动中心南侧临建设施	温度	≤0 度☐ 0 度～10 度☐ 10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐ ≥30 度☑							
		风力	静风☑ 中等☐ 大风☐ 台风☐							

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号	HYJA-MHDX-NYGC-001

		湿度	干燥☐　中等☑　湿润☐

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数	作业工人数	主要工作内容
恒益建安	1	现场安排 3 人	查看能源站及食堂冷却塔基础制作情况；食堂冷却塔钢架平台下料制作
恒益建安	3	现场安排 3 人	中深层井场钻机进场
施工人员合计		6 人	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
挖掘机	200	良好	1

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				

五、施工完成情况	办公区、能源站	**本日施工内容：**现场查看食堂冷却塔及能源站内基础制作情况食堂冷却塔钢架平台下料制作
		整体完成情况：现场查看冷却塔基础制作情况 100%；食堂冷却塔钢架平台下料制作 100%
	中深层井场	**本日施工内容：**中深层井场钻机进场
		整体完成情况：中深层井场钻机进场 100%
六、业主监理指令	/	

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 HYJA-MHDX-NYGC-001
七、安全管理情况	1、对食堂冷却塔钢架平台临时用电进行检查。	
八、技术质量管理情况	1、中深层井场平整，对作业台班挖掘机司机进行安全教育警示，严禁作业地下标识电缆范围内的区域。	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	/	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：**	
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☐；5、项目生产经理（项目总工）☐；6、项目工程部☐；7、项目资料室☐	

现场施工影像









现场查看食堂冷却塔及能源站内基础制作情况,；食堂冷却塔钢架平台下料制作；中深层井场钻机进场
