中国民航大学宁河校区 2 月 16 日工程日报

一、施工概要

1	图书馆	**本日施工内容:**机电安装给排水管道；空调水管道；
		总体完成情况:机电管线安装 90%；幕墙安装完成 86%；防火门安装完成 91%；电梯安装完成 31%;外架拆除完成 50%；幻彩铝板安装 40%；凸窗玻璃安装完成 55%;
2	机场学院教学实验楼	**本日施工内容:**
		总体完成情况: 机电管线安装 91%；幕墙窗安装完成 100%；幕墙铝板安装完成 100%；内墙腻子完成 100%；主框安装完成 100%；玻璃安装完成 90%；开启扇安装 80%；
3	公共教学楼	**本日施工内容:** 正式电梯包口；卫生间放线；
		总体完成情况: 机电管线安装完成 94%；幕墙窗安装完成 97%；外墙保温完成 90%；外墙防火板安装完成 100%；外墙铝板安装 85%；主框安装完成 100%；玻璃安装完成 95%；开启扇安装 80%；正式电梯包口完成 50%;卫生间放线完成 40%;
4	飞行乘务大楼及模拟舱楼	**本日施工内容:** 正式电梯包口；卫生间放线；室内机电管线包裹；
		总体完成情况: 机电管线安装完成 92%；乘务楼主框安装完成 100%;弧形玻璃安装完成 80%；首层幕墙安装完成 98%；开启扇安装 50%；正式电梯包口完成 30%；卫生间放线完成 80%;室内机电管线包裹完成 10%；
5	体育馆	**本日施工内容:** 金属屋面保温层施工；材料清理及覆盖；
		整体完成情况: 二次结构施工完成，粗装修完成 60%；钢结构完成 99%；机电安装完成 71%;金属屋面 27%，幕墙 15%。
6	师生活动中心	**本日施工内容:** 弧形梁焊接安装；
		整体完成情况: 主体结构完成 100%；二次结构完成 100%；主楼粗装修完成 100%，精装修完成 5%；机电安装完成 83％。
7	学生食堂	**本日施工内容:** 未施工
		整体完成情况: 学生食堂二次结构完成 100%，粗装修完成 95%，屋面防水完成 100%，外保温完成 20%，机电安装完成 78%。
8	1#学生宿舍	**本日施工内容:** 机电安装施工
		整体完成情况: 粗装修完成 100%，精装修完成 25%，屋面工程完成 100%；外墙保温完成 80%；机电安装完成 81％。窗户工程完成 85%；电梯工程完成 100%。
9	2#学生宿舍	**本日施工内容:** 机电安装施工
		整体完成情况: 粗装修完成 100%；精装修完成 55%，外墙保温完成 81%；机电安装完成 80％；窗户工程完成 85%；电梯

		工程完成 100%。	
10	3#学生宿舍	**本日施工内容：**未施工	
		整体完成情况：二次结构完成 100%；粗装修完成 100%，精装修完成 10%；屋面工程完成 100%；机电安装完成 78%；外保温工程完成 30%；窗户工程完成 70%。	
11	4#学生宿舍	**本日施工内容：**机电安装施工	
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 30%；电梯工程完成 100%；机电安装完成 78%；外保温工程完成 20%；窗户工程完成 70%。	
12	5#学生宿舍	**本日施工内容：**未施工	
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 30%；机电安装完成 78%；窗户工程完成 85%；外保温工程完成 20%；电梯工程完成 100%。	
13	35Kv 变电站	未施工	
14	垃圾站	未施工	
15	弱电专项施工（江森自控）	一、二标段	**本日施工内容:**开工前准备工作
			总体完成情况: 1、 楼控现场对点 2、 施工辅料制作 3、 工人复工前安全教育、技术交底 4、 参加安全检查
16	能源专项施工（恒益建安）	能源站	**本日施工内容：**未施工
			整体完成情况：停工中
		中深层地源热井	**本日施工内容：**中深层地源热井拆除钻机完毕，并等待物流拉走
			整体完成情况：中深层地源热井拆除钻 100%，物流拉走 50%
		浅层地源热井	**本日施工内容：**浅层地源地热井
			整体完成情况：浅层地源地热井 13 口，累计完成 1344 口
17	中铁五局	项目部	**本日施工内容:**宿舍楼东侧，图书馆与实验楼之间、食堂东侧
			整体完成情况：宿舍楼东侧雨水管道（d600)安装完成 40m 图书馆与实验楼之间混凝土基础破碎，雨水管道

			（d400）安装完成 24m 食堂东侧化粪池基坑开挖雨水管道完成总量 92%，污水管道完成总量 96%
18	人员情况	监理总人数 12 人； 八局总人数 104 人，管理人员 40 人，工人 64 人； 三局总人数 119 人，管理人员 46 人，工人 73 人； 中铁五局总人数 31 人，管理人员 14 人，工人 17 人； 江森自控总人数 13 人，管理人员 13 人，工人 0 人； 恒益建安总人数 31 人，管理人员 3 人，工人 28 人；	

二、监理日报

一标段：

1. 监理部对图书馆及教学组团部分施工进行巡视检查，未发现异常。
2. 对一标段现场施工进行安全文明周检。

二标段：

1.现场未施工。监理部对各单体进行外立面巡视,未发现异常。

室外、能源及弱电：

1.能源：中深层地源热井拆除钻机完毕，并等待物流拉走，今日完成浅层地源地热井 13 口，累计完成 1344 口。

2.弱电：现场未施工，进行开工前准备工作。

3.室外：宿舍楼东侧雨水管道（d600)安装完成 40m，图书馆与实验楼之间混凝土基础破碎，雨水管道（d400）安装完成 24m，食堂东侧化粪池基坑开挖。

标段划分	单体名称	监理人员	监理工作时间、内容及路线	备注
一标段 刘刚 （15162265570）	图书馆	刘刚 （18082566239）	对图书馆施工进行巡视检查	
		张春博 （13027722180）	对图书馆施工进行巡视检查	
		刘浩 （13400385767）	对图书馆施工进行巡视检查	
	教学组团	任海博 （18082566239）	对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查	
		马瑞峰 （15614235758）	对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查。	
	所有单体安装工程	滕洪亮 （13234049175） 张春博 （13027722180）	对现场施工巡视检查	
二标段 林利民 （18640512507）	体育馆	丁建泽 （18845226778） 杨宸 （13364468744） 党泽南 （13630253982）	对现场施工进行巡视检查，钢构件焊接巡检	
	师生活动中心		对现场施工巡视检查	

	4#、5#学生宿舍	吕非凡（17532527058） 马一博（17692498058）	对现场施工巡视检查	
	1#、2#、3#学生宿舍、食堂	乔天航(18547607857) 丁建泽（18845226778） 宋明（15345517113）	对现场施工巡视检查	
	35kv 变电站		对现场施工巡视检查	
	所有单体安装工程	滕洪亮（13234049175） 乔天航(18547607857)	对现场施工巡视检查	
室外	一标段	刘刚（18082566239） 任海博（18082566239） 刘浩（13400385767）	对现场施工巡视检查	

	二标段	滕洪亮 （13234049175） 乔天航 (18547607857) 李会彬 （15512769592） 吕非凡 （17532527058）	对现场施工巡视检查	
弱电	一标段	刘刚 （18082566239）	对现场施工巡视检查	
	二标段	滕洪亮 （13234049175）	对现场施工巡视检查	
能源	二标段	滕洪亮 （13234049175） 乔天航 (18547607857)	对现场施工巡视检查	
弱电	一标段	刘刚 （18082566239）	对现场施工巡视检查	
	二标段	滕洪亮 （13234049175）	对现场施工巡视检查	

能源	二标段	滕洪亮 （13234049175） 乔天航 (18547607857)	对现场施工巡视检查	

四、施工单位日报

一标段施工日报

	中国建筑　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告									表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
项目名称	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：273	2022 年 2 月 16 日						✓			
作业计划编号		天气	非常晴朗☑ 晴朗☐　多云☐　雨☐　雪☐ 霾☐							
施工部位	图书馆 机场学院教学实验楼 公共教学楼 飞行乘务大楼及模拟舱楼	温度	⩽0 度☑　0 度～10 度☐　10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐　⩾30 度☐							
		风力	静风☐　中等☑　大风☐　台风☐							
		湿度	干燥☑　中等☐　湿润 ☐							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
中建八局	40	40	现场管理、方案编制
天津唐海	0	1	机电安装
北京慧欣	1	5	机电安装
恒福消防	2	0	组团消防
福建聚利	4	8	幕墙安装
鼎天幕墙	2	9	幕墙安装
天宇信达（二构）	0	0	二次结构
天津俊凯	0	0	机电通风
宏坤煜业	1	0	机电通风
堡泰消防	4	2	机电消防
天河伟业	8	22	精装
八局装饰	12	12	精装
虹吸雨水	0	0	机电安装
江森自控	0	0	机电安装
三菱电梯	1	3	电梯安装
天津科顺	1	0	防水
华夏门业	1	1	防火门
昌盛伟业	1	1	图书馆水电保温

	中国建筑　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告		表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
贵州中科	1	0	保温
军盛鑫	0	0	组团水电保温
嘉瑞市政	1	0	人防通风
合计	80	104	
本日新增	0人，体温正常		

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
货用施工升降机	SC200/200	良好	0
物料提升机	SC120/120	良好	0
叉车	2台	良好	0
洒水车	1辆	良好	0
雾炮车	2台	良好	0
挖机	60型	良好	0
吊车	25吨	良好	0
曲臂高空车	/	良好	0
升降车	/	良好	0
物料机	1.3吨	良好	0

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

	中国建筑　项目管理表格				
	作业面\项目每日情况报告			表格编号	CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
时间	姓名	单位	工作目的	备注	
五、进度完成情况	图书馆	本日施工内容:机电安装给排水管道；空调水管道；			
		总体完成情况:机电管线安装 90%;幕墙安装完成 86%;防火门安装完成 91%;电梯安装完成 31%;外架拆除完成 50%；幻彩铝板安装 40%；凸窗玻璃安装完成 55%;			
	机场学院教学实验楼	本日施工内容:			
		总体完成情况：机电管线安装 91%;幕墙窗安装完成 100%;幕墙铝板安装完成 100%；内墙腻子完成 100%；主框安装完成 100%；玻璃安装完成 90%；开启扇安装 80%;			
	公共教学楼	本日施工内容：正式电梯包口；卫生间放线;			
		总体完成情况：机电管线安装完成 94%；幕墙窗安装完成 97%；外墙保温完成 90%;外墙防火板安装完成 100%;外墙铝板安装 85%;主框安装完成 100%;玻璃安装完成 95%；开启扇安装 80%；正式电梯包口完成 50%;卫生间放线完成 40%;			
	飞行乘务大楼及模拟舱楼	本日施工内容：正式电梯包口；卫生间放线；室内机电管线包裹;			
		总体完成情况：机电管线安装完成 92%；乘务楼主框安装完成 100%;弧形玻璃安装完成 80%；首层幕墙安装完成 98%；开启扇安装 50%；正式电梯包口完成 30%；卫生间放线完成 80%;室内机电管线包裹完成 10%;			
六、业主监理指令					
七、安全管理情况	日常三间巡逻检查，裸土苫盖维护，现场排水，安全隐患排查以及整改				
八、技术质量管理	对精装修技术问题协调、幕墙及门窗施工进行全过程质量监管，日常机械监测，危险源辨识等。				
九、过程关键文件					
十、本日重大事项					
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜:** 1、图书馆消防箱需要变更明装改暗装，请确认下发指令; 2、为过程结算提前准备，已完工程图纸变更、洽商、会审请尽快下发。 3、甲指平行总包单位安全协议及押金事宜需业主及管理公司领导推动签订。 4、组团玻璃幕墙埋件及部分拆改签证需要尽快确认 烦请尽快回复。 5、教学楼教室样板间吊顶风口调整变更相关事宜，请联系设计单位下发正式文件。 6、联网型风机盘管面板变更、电动调节风阀变更需要尽快下发，已经影响施工;				

7、教学组团中庭护栏费用已上报，需尽快推进上会确定施工。

8、图书馆地下室会堂、演艺大厅效果图及精装图请及时下发;

9、地下室安防消防中心精装修方案（房间设备平面布置及所要达到得效果）请尽快审批

10、地上二层民航特藏阅览室效果图及精装施工图请尽快下发

11、二、三层研讨室精装施工图及时下发;

12、一层读者服务区电子屏尺寸尽快确认，严重影响铝板加工及排产

13、二层接待室（原特藏阅览室）墙面面层材料确认;

14、需设计协调解决问题:

1、图书馆会堂、演艺大厅、消防安防中心、数据机房、二层阅览室调整复古区域、气体灭火、电磁阀更改;

2、资金缺口极大直接关系人员复工返岗，机电、幕墙、装修单位因缺口较大人员进场及材料进场均受影响 ;

3、弱电二次开槽封堵认质认价已上报，需要校方等领导尽快确认。由于此项影响后续施工且非我方原因造成，同时后期维修隐患及责任划分需要尽快明确（目前封堵无法做到后期不出现隐患）。

4、栏杆玻璃栏板做法确认;

5、市政单位要求把他们的各大项施工轮廓线标注出来，主要影响后期铺装，绿化，围墙区域；回填土和破路埋管得和我们统一协调;

6、产值的确认、变更、做法和已经认质认价的产值确认;

7、灯具、泛光照明的定标定价：300 万灯具定价远低于成本价，建议业主尽快自行招标;

8、封样、设计做法确认、变更的认质认价;

9、新风机组前后阀门调整为电动调节阀未定;

10、图书馆消防箱改暗装未定，现场与铝板位置;

11、风机盘管面板调整为联网型稳控面板，增加 485 接线、网线接口，且增加 7*1.5 通讯线需要明确;

12、图书馆精装修位置机电管线调整（三块大变动调整区域）需要上会确认，洽商纸设计，监理已签字;

13、教学组团天花排布图纸需要确认，风口;

14、气体灭火需要调整上会最终确认;

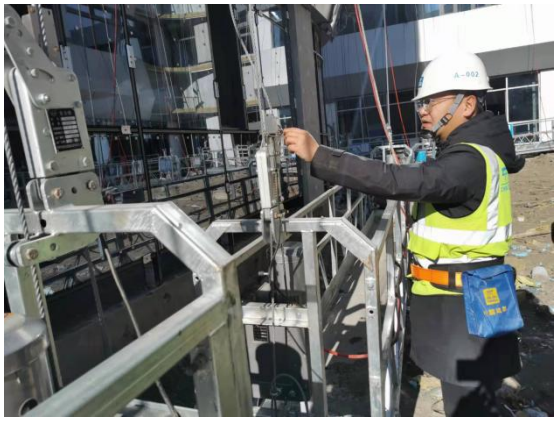
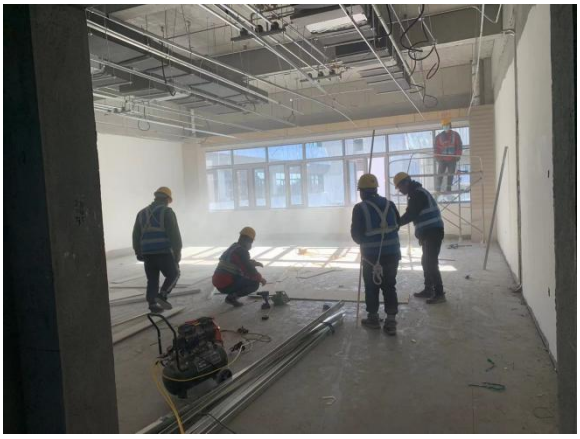
15、水泡专业深化图纸需要尽快确认;

16、图书馆 4 层综合排布，抓紧确认，影响消防疏散指示灯具安装配管。

17、年前洽商变更需要抓紧上会确认，报价草签部分已上报。

	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告	表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
	18、涉及到深化类专业的设计变更需要尽快确认下发，后续报价方能开展。 19、图书馆四层光面超薄型防火涂料需要重新认质认价。	
抄送	1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□； 5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□	

现场作业影像

<table>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆精装施工</td><td>教学楼开启扇安装</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>大型机械检查</td><td>乘务楼精装施工</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>市政管网施工施工</td><td>日常安全巡查</td></tr>
<tr><td colspan="2">现场航拍图 12.28</td></tr>
</table>





图书馆



实验楼





公共教学楼	飞行乘务大楼及模拟仓

二标段

	中国建筑　项目管理表格								
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101							
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程二标段								
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：002	2022 年 2 月 16 日						✓			
作业计划编号		天气	晴朗☑ 多云☐ 雨☐ 阴☐ 雪☐ 冰冻☐ 雾霾☐							
施工部位	1#-5#宿舍楼；食堂；指挥部；体育馆；师生活动中心	温度	⩽0 度 ☑ 0 度～10 度☐ 10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐ ⩾30 度 ☐							
		风力	静风☐ 中等☑ 大风 ☐ 台风☐							
		湿度	干燥☐ 中等☐ 湿润☑							
一、现场人员情况									
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容							
中建三局	29/14	/	方案编制、现场施工管理							
三局智能	2/0	/	BIM 建模							
三局二安	7/2	38/0	宿舍楼穿线、配电箱安装，食堂首层通风管道、风阀、桥架安装,体育馆二次配管，风管、水管、桥架施工							
三局一公司钢构	1/0	0/0	体育馆钢结构马道施工							
长沙广大	1/0	0/0	图纸深化							
兴华鑫宇	0/0	0/0	粗装修收尾							
天津津宝福	0/0	0/0	粗装修收尾							
北京迈易格	1/0	1/0	主框、玻璃安装、幕墙施工							
广日电梯	0/0	0/0	室内电梯安装							
山东川众	2/0	23/0	体育馆屋面施工							
建工幕墙	2/0	11/0	幕墙、门窗							
匠人清水	1/0	0/0	南大门施工							
施工人员合计	46	73/0								
健康监测情况	体温正常	体温正常	在场人员总计 119 人，防疫资料齐全							
二、现场机械设备情况										

	中国建筑　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号	
		ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101	

设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	0
物料提升机	SC100/100	良好	0
电梯	SC200/200	良好	0
汽车吊	25t	良好	0
挖掘机	330 型	良好	0
	200 型	良好	0
	90 型	良好	0
自卸汽车	20m³	良好	0
吊篮		良好	97
保温设备	暖风机、加热炉	良好	0

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
/	/	/	合格	合格	/

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注

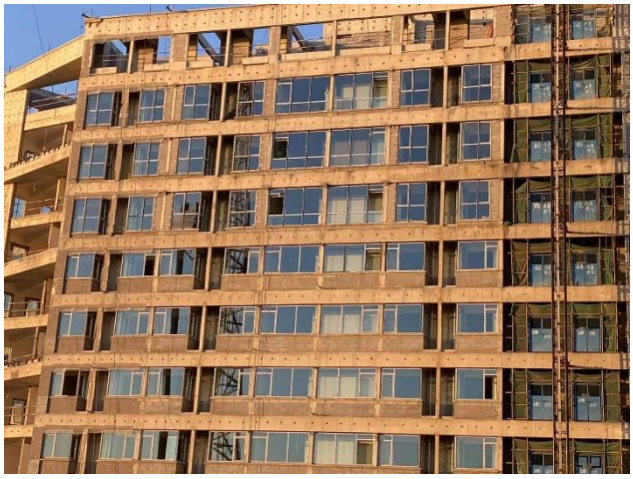
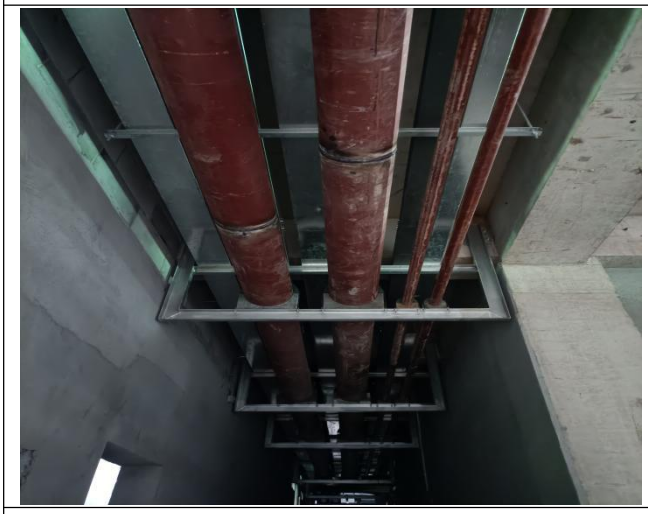
五、施工完成情况	体育馆	**本日施工内容**：金属屋面保温层施工；材料清理及覆盖；
		整体完成情况：二次结构施工完成，粗装修完成 60%；钢结构完成 99%；机电安装完成 71%;金属屋面 27%，幕墙 15%。
	师生活动中心	**本日施工内容**：弧形梁焊接安装；
		整体完成情况：主体结构完成 100%；二次结构完成 100%；主楼粗装修完成 100%，精装修完成 5%；机电安装完成 83％。
	学生食堂	**本日施工内容**：未施工
		整体完成情况：学生食堂二次结构完成 100%，粗装修完成 95%，屋面防水完成 100%，外保温完成 20%，机电安装完成 78%。
	1#学生宿舍	**本日施工内容**：机电安装施工
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 25%，屋面工程完成 100%；外墙保温完成 80%；机电安装完成 81％。窗户工程完成 85%；电梯工程完成 100%。
	2#学生宿舍	**本日施工内容**：机电安装施工
		整体完成情况：粗装修完成 100%；精装修完成 55%，外墙保温完成

	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101
		81%；机电安装完成 80％；窗户工程完成 85%；电梯工程完成 100%。
	3#学生宿舍	**本日施工内容**：未施工
		整体完成情况：二次结构完成 100%；粗装修完成 100%，精装修完成 10%；屋面工程完成 100%；机电安装完成 78％；外保温工程完成 30%；窗户工程完成 70%。
	4#学生宿舍	**本日施工内容**：机电安装施工
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 30%；电梯工程完成 100%；机电安装完成 78％；外保温工程完成 20%；窗户工程完成 70%。
	5#学生宿舍	**本日施工内容**：未施工
		整体完成情况：粗装修完成 100%，精装修完成 30%；机电安装完成 78％；窗户工程完成 85%；外保温工程完成 20%；电梯工程完成 100%。
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、对生活区进行检查；2、对现场临时用电进行检查；3、对整个施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改；4、现场疫情防控监察。	
八、技术质量管理情况	1、对体育馆、食堂、师生活动中心及宿舍楼冬季施工情况进行检查；2、对宿舍楼粗装修销项进行检查。3、BIM 建模幕墙、钢构、机电安装等。	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	下午二标段春节节后安全文明检查。	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：**1、学生宿舍楼钢质门样式确认，已严重影响加工；2、35KV 变电站施工单位进场，提供深化图纸；3、宿舍楼裙房部位是否拆改请尽快明确，严重制约现场。	
抄送	1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□	

制，项目生产经理亲自填报整个项目部每日情况报告。报告包括的时间为当天上班时间到次日上班时间，提交报告的时间不迟于次日上午的 12 点。

现场施工影像

	
体育馆 金属屋面保温层施工；材料清理及覆盖；	师生活动中心 弧形梁焊接安装
	
学生食堂 未施工	1#学生宿舍楼 机电安装施工
	
2#学生宿舍楼 机电安装施工	3#学生宿舍楼 未施工

	
4#学生宿舍楼 机电安装施工	5#学生宿舍楼 未施工
	
体育馆	学生食堂
	

1#学生宿舍楼	2#学生宿舍楼
	
3#学生宿舍楼	4#学生宿舍楼
	
5#学生宿舍楼	

中铁五局室外工程

中国中铁	中国中铁　项目管理表格								
	作业面\项目每日情况报告表		表格编号						
			ZTWJ-MHDX-SWGC-001						
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程室外施工								
本表顺序号	时　间	星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：167	2022 年 2 月 16 日					✓			

中国中铁	中国中铁 项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号	ZTWJ-MHDX-SWGC-001

作业计划编号		天气	非常晴朗□ 晴朗☑ 多云□雨□ 雾□ 雪☑ 冰冻□
施工部位	宿舍楼东侧，图书馆与实验楼之间、食堂东侧	温度	≤0度☑ 0度~10度□10度~21度□ 21度~30度□ ≥30度□
		风力	静风□中等☑ 大风□ 台风□
		湿度	干燥☑ 中等□ 湿润□

一、(1) 现场人员情况

单位名称	管理人员数	作业工人数	主要工作内容
中铁五局	14	17	雨污水管道安装、预制检查井安装，井室及基坑抽水，土方回填
施工人员合计	14	17	

(2) 疫情防控情况

有无新增人员	新增人员排查情况	项目人员体温是否正常	备注
无	/	正常	/

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
铲车	HY950	良好	3
挖掘机	210	良好	6
十轮翻斗车	/	良好	7

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
/					

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				

五、施工完成情况	项目部	**本日施工内容:** 宿舍楼东侧，图书馆与实验楼之间、食堂东侧
		整体完成情况: 宿舍楼东侧雨水管道（d600)安装完成 40m 图书馆与实验楼之间混凝土基础破碎，雨水管道（d400）安装完成 24m

中国中铁	中国中铁　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZTWJ-MHDX-SWGC-001

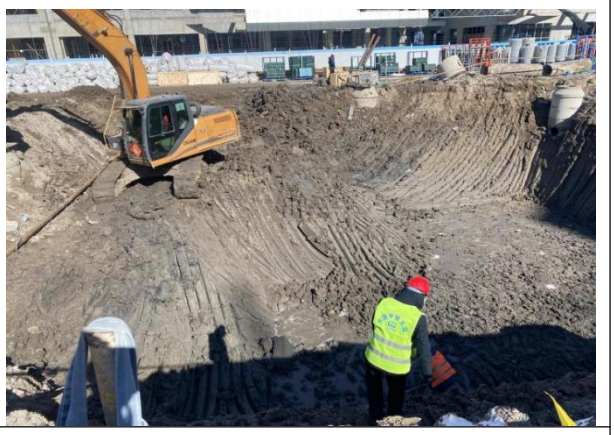
		食堂东侧化粪池基坑开挖 雨水管道完成总量 92%，污水管道完成总量 96%
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、对现场机械进行安全检查；2、对施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改；3、施工人员班前喊话。4、全员参加核酸检测。	
八、技术质量管理情况	开槽全过程质量监管。	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	/	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：** /	
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☑；5、项目生产经理（项目总工）☑；6、项目工程部☑；7、项目资料室☐	

现场施工影像



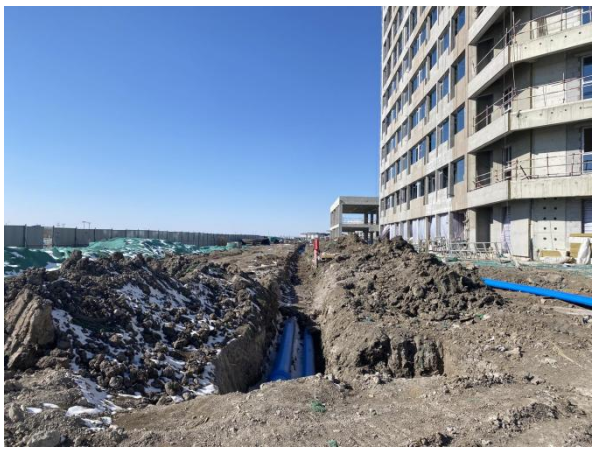



CASE











	
班前安全喊话，开挖沟槽，土方清运，基坑抽水，井室抽水，雨污水管道安装、预制检查井安装	

江森自控智慧校园

Johnson Controls	北京江森自控有限公司　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告表							表格编号 JCI-CN23/21:1096 BJJSGCB-PM-2021003		
项目名称	中国民航大学新校区智慧校园建设弱电专项施工									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO: 163	2022 年 2 月 16 日						✓			
作业计划编号		天气	非常晴朗☐ 晴朗☑阴天☐　雨☐雪☐霾☐							
施工部位	全校区	温度	⩽0 度☑　0 度～10 度☐　10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐　⩾30 度☐							
		风力	静风☑　中等☐　大风☐　台风☐							
		湿度	干燥☐　中等☑　湿润☐							
一、现场人员情况										
单位名称	管理人员数（日/夜）		作业工人数（日/夜）			主要工作内容				
北京江森自控有限公司	5					现场管理、专业设计				
施工	3									
新增人员	5									
合计	13									
健康状况（体温）	正常									

Johnson Controls	北京江森自控有限公司　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 JCI-CN23/21:1096 BJJSGCB-PM-2021003

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
/	/	/	

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

时间	姓名	单位	工作目的	备注

五、进度完成情况	一、二标段	**本日施工内容:** 开工前准备工作 **总体完成情况:** 5、 楼控现场对点 6、 施工辅料制作 7、 工人复工前安全教育、技术交底 8、 参加安全检查
六、业主监理指令		
七、安全管理情况	安全教育	
八、技术质量管理		
九、过程关键文件		
十、本日重大事项		
十一、明日施工计划		
十二、工作小结		
抄送	1、建设方代表□；2、工程监理□；3、项目经理□；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室£	

作业影像


中国民航大学新校区建设及老校区改造项目第一标段
施 工 内 容：监控检查
拍 摄 时 间：2022.02.16 09:20
地　　点：宁河区·中国民航大学(宁河校区)
施 工 单 位：江森自控
今日水印相机
真实时间







恒益建安能源专项施工日报

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司 项目管理表格								
	作业面\项目每日情况报告 项目每日情况报告表		制作完成情况:				表格编号 HYJA-MHDX-NYGC-001		
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程能源专项工程								
本表顺序号	时 间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：00153	2022 年 2 月 16 日						√			
作业计划编号		天气	非常晴朗☑ 晴朗☐ 多云☐ 雨☐ 雪☐ 冰冻☐							
施工部位	能源站	温度	⩽0 度☑ 0 度～10 度☐ 10 度～21 度☐ 21 度～30 度☐ ⩾30 度☐							
		风力	静风☑ 中等☐ 大风☐ 台风☐							
		湿度	干燥☐ 中等☐ 湿润☐							
一、现场人员情况									
单位名称	管理人员数		作业工人数				主要工作内容		

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况汇报告 项目每日情况报告表	整体完成情况:	表格编号 HYJA-MHDX-NYGC-001

恒益建安	0	0	
恒益建安	3	现场安排 14 人	拆除钻机
恒益建安	1	现场安排 14 人	浅层地源热井钻井
施工人员合计	3	28 人	新增人员 0，项目人员体温正常

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
石油钻机	ZJ-30	良好	0
浅层钻机		良好	4

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				

五、施工完成情况	能源站	**本日施工内容:**
		整体完成情况:
施工完成情况	中深层地源热井	**本日施工内容:** 中深层地源热井拆除钻机完毕，并等待物流拉走
		整体完成情况: 中深层地源热井拆除钻 100%，物流拉走 50%
	浅层地源热井	**本日施工内容:** 浅层地源地热井
		整体完成情况: 浅层地源地热井 13 口，累计完成 1344 口
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	对雪天施工的巡视检查	
八、技术质量管理情况	施工进行全过程质量监管，日常机械监测，危险源辨识等。	

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表 项目每日情况报告表	制作生成情况： 表格编号 HYJA-MHDX-NYGC-001
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	/	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：**	
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☐；5、项目生产经理（项目总工）☐；6、项目工程部☐；7、项目资料室☐	

现场施工影像	
	

	
中深层地源热井拆除钻机、浅层地源地热井钻井	
