中国民航大学宁河校区10月30日工程日报

一、施工概要

1	图书馆	**本日施工内容:**二次结构施工；钢结构屋面钢梁吊装； 抹灰施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；地库顶板防水；现场文明施工清理
		总体完成情况:图书馆二次结构砌筑施工完成98%；抹灰完成85%；钢结构安装完成96%；机电管线安装77%；幕墙安装完成52%；地库顶板防水完成50%；
2	机场学院教学实验楼	**本日施工内容:**抹灰施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理；地面贴砖；
		总体完成情况：机电管线安装81%；幕墙安装完成55%；地面贴砖施工完成30%；
3	公共教学楼	**本日施工内容**：抹灰施工；幕墙施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理；混凝土地面施工；地面贴砖；
		总体完成情况：机电管线安装完成81%；幕墙安装完成42%；钢连廊施工完成89%；混凝土地面施工完成100%；地面贴砖完成40%
4	飞行乘务大楼及模拟舱楼	**本日施工内容**:二次结构施工;幕墙龙骨施工;门窗副框施工;机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；屋面施工；混凝土地面施工；现场文明施工清理；模拟舱钢结构施工
		总体完成情况：抹灰完成100%；机电管线安装完成77%；幕墙采光顶安装完成97%;混凝土地面施工完成100%;副框安装完成91%；模拟舱钢结构施工完成85%；
5	体育馆	**本日施工内容**：首层墙体砌筑，反坎、构造柱、系梁支模，二层系梁构造柱拆模，三层窗台压顶支模，钢结构桁架拼装焊接。机电安装综合支架、风管、桥架安装。攀岩走廊施工，幕墙埋件安装，金属屋面支座材料进场，墙体拉毛挂网.
		整体完成情况：二次结构施工完成80%，粗装修完成10%；钢结构完成99%；机电安装完成35%，攀岩走廊施工80%；
6	师生活动中心	**本日施工内容**：主楼楼内地面基层清理，裙房电缆沟抽水。机电安装样板间变更点位开槽。
		整体完成情况：主体结构完成99%；二次结构完成100%；主楼粗装修完成90%；机电安装完成76%
7	学生食堂	**本日施工内容**：食堂抹灰，能源站地面细石混凝土完成，幕墙安装副框，复查窗口尺寸完成。机电安装综合支架、风管、消防管加工，开槽及二次配管，桥架，风管安装，地暖管敷设；食堂走廊找坡施工，幕墙龙骨安装，三层变更女儿墙拆除、清运。
		整体完成情况：能源站二次结构完成95%，初装修完成50%，屋面完成30%;学生食堂二次结构完成100%,粗装修完成70%，屋面工程完成20%，外幕墙完成20%，机电安装完成46%。

8	1#学生宿舍	**本日施工内容**：1#楼 A 段外墙保温施工,屋面铺设保温板；1#楼机电安装消防管安装，样板间风管保温，给水加套管；B 段外墙保温施工，屋面铺设保温板。3-4 层窗户主框安装；室内电梯导轨、轿厢安装；2-3 层墙面腻子施工；	
		整体完成情况：粗装修完成 90%，精装修完成 8%，屋面工程完成 80%；外墙保温完成 29%；机电安装完成 61％。窗户工程完成 38%；电梯工程完成 14%；	
9	2#学生宿舍	**本日施工内容** 3-4 层墙体腻子施工。机电安装消防管、给排水管井道安装，消防穿线。外墙保温施工；室内电梯导轨安装；	
		整体完成情况：粗装修完成 91%；精装修完成 8%，屋面工程完成 100%；外墙保温完成 42%；机电安装完成 61％；窗户工程完成 50%；电梯工程完成 18%；	
10	3#学生宿舍	**本日施工内容**：首层抹灰；外墙保温施工；机电安装公区桥架、支架安装，卫生间排水管安装。地面基层清理，屋面防水施工、抹灰施工。	
		整体完成情况：二次结构完成 98%；粗装修完成 75%，精装修完成 5%；屋面工程完成 55%；机电安装完成 53％；外保温工程完成 6%；窗户工程完成 10%；	
11	4#学生宿舍	**本日施工内容**：三层防潮层施工，地面基层清理；外墙保温施工；机电安装管井水管施工。	
		整体完成情况：粗装修完成 75%，精装修完成 8%；屋面工程完成 60%；机电安装完成 55％；外保温工程完成 8%；窗户工程完成 10%；	
12	5#学生宿舍	**本日施工内容**：外墙保温施工；机电安装立管安装，桥架接头。	
		整体完成情况：粗装修完成 80%，精装修完成 10%；屋面工程完成 50%；机电安装完成 57％；窗户工程完成 10%；外保温工程完成 6%；	
13	35Kv 变电站	设备基础施工	
14	垃圾站	未施工	
15	弱电专项施工（江森自控）	宿舍楼	**本日施工内容**：现场敷管作业
			总体完成情况： 机场实验楼 3 层开槽作业，总体完成 35%。公共教学楼 2 层开槽作业，总体完成 40%。飞乘楼 4 层开槽作业，总体完成 5%。3#宿舍楼敷管作业，总体完成 70%。
16	能源专项施工（恒益建安）	能源站	**本日施工内容**：能源站内排水、能源站内支架放线、能源站支架制作

			整体完成情况：能源站内排水 100%；能源站内支架放线 100%；能源站支架制作 20%
		中深层地源热井	**本日施工内容：**中深层地源热井钻井经校方研究通过延伸 200 米，第二口井位从新选址方案已经上报设计院
			整体完成情况：中深层地源热井钻井经校方研究通过延伸 200 米；井深 2210 米；进尺 45 米；第二口井位从新选址方案已经上报设计院
		浅层地源热井	**本日施工内容：**浅层地源热井钻井；浅层钻机已经进场 5 台
			整体完成情况：浅层地源热井钻井完成 4 口，累计完成 27 口；浅层钻机已经进场 5 台
17	中铁五局	项目部	**本日施工：** 1、体育场西侧安装污水管道 1、学生宿舍楼雨水管道安装
			整体完成情况：体育场西侧安装污水管道完成 10%；学生宿舍楼 2#楼雨水管道完成 80%
18	人员情况	八局今日劳动力人数 557 人。三局今日劳动力人数 522 人。中铁五局今日劳动力人数 28 人，江森自控今日劳动人数 30 人，恒益建安今日劳动人 36 人。	

二、监理日报

一标段：

1.现场巡视。检查图书馆钢结构屋面钢梁吊装、钢结构焊接及焊缝质量；检查抹灰平整度、垂直度，机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场安全文明清理情况，施工正常。

2.现场巡视。检查实验楼抹灰，机电安装给排水管道、通风管道、空调水管道、屋面施工,防水施工，现场文明施工清理情况，施工正常。

3.现场巡视。检查公共教学楼抹灰施工；幕墙施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理；混凝土地面施工；地面贴砖；现场文明施工清理情况，施工正常。

4.现场巡视。检查飞乘大楼幕墙龙骨施工；门窗副框施工；机电安装给排水管道；通风

管道；空调水管道；屋面施工；混凝土地面施工；现场文明施工清理情况，施工正常。

二标段：

1. 对体育馆钢构件焊接质量巡视检查，对体育馆机电安装的支吊架安装质量进行现场巡查，对体育馆攀岩走廊杆件焊接进行巡检，检查高空作业人员安全带佩戴情况，未发现安全隐患，对体育馆航天云钢构件吊装进行巡检，对体育馆钢结构 V 字柱吊装进行旁站，对体育馆二次结构墙体砌筑进行巡检。检查符合要求。

2. 监理部对师生活动中心机电安装的水、电及风管安装施工巡视检查、地暖管铺设、外墙保温进行巡视检查，符合设计及规划要求。

3. 监理部对学生食堂机电安装的水、电及风管安装施工巡视检查，食堂屋顶找平层施工巡视检查，督促现场工人高处作业做好安全防护措施。

4. 2 号楼保温施工 100%、5 号楼屋面找坡完成 100%、三号楼屋面二遍防水完成 100%，三号楼十层防水附加层完成，4 号楼防水基层清理完成 100%、食堂防水附加层完成 100%、1B 二遍防水完成符合设计要求。现在对下道工序施工进行巡检。对学生宿舍各单体首层墙面抹灰工程、水电风管安装施工进行巡检。

室外、能源及弱电：

1. 能源：对能源站内排水、能源站内支架放线进行检查；中深层地源热井钻井下午 6 点开始浇筑；对浅层地源热井钻井进行巡检，已完成 27 口。

2. 弱电：现场敷管作业，施工正常。

3. 室外：对体育场西侧安装污水管道，学生宿舍楼雨水管道安装进行巡检。

三、监理明日工作安排

标段划分	单体名称	监理人员	施工内容	监理工作时间、内容及路线	备注
一标段 刘刚 （15162265570）	图书馆	刘刚（18082566239）	钢结构施工、二次结构施工	对图书馆施工进行巡视检查	
		张春博 （13027722180）		对图书馆施工进行巡视检查，旁站砼浇筑施工	
		刘浩（13400385767）		对图书馆施工进行巡视检查，旁站砼浇筑施工	
	教学组团	任海博 （18082566239）	二次结构施工	对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查，旁站砼浇筑。	
		马瑞峰 （15614235758）		对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查。	
	所有单体安装工程	滕洪亮 （13234049175） 张春博 （13027722180）	给排水及消防工程、暖通工程、机电安装工程施工	对现场施工巡视检查	
二标段 林利民 （18640512507）	体育馆	丁建泽 （18845226778） 杨宸（13364468744） 党泽南 （13630253982）	钢结构施工、二次结构施工	对现场施工进行巡视检查，钢构件焊接巡检	
	师生活动中心		地暖管施工	对现场施工巡视检查	
	4#、5#学生宿舍	吕非凡 （17532527058）马一博（17692498058）	地暖管施工、抹灰施工	对学生宿舍地暖施工，墙体抹灰施工进行巡视检查	
	1#、2#、3#学生宿舍、食堂	董鑫鑫（1803233772） 乔天航(18547607857) 丁建泽 （18845226778）	抹灰施工、防潮层施工、外墙保温施工	对学生宿舍、学生食堂屋面砌筑施工，墙体抹灰施工进行巡视检查	

	垃圾房		未施工	未施工	
	35kv 变电站		设备基础施工	对现场施工巡视检查	
	所有单体安装工程	滕洪亮（13234049175） 乔天航(18547607857)	给排水及消防工程、暖通工程、机电安装工程施工	对现场施工巡视检查	
室外	一标段	刘刚（18082566239） 任海博（18082566239） 刘浩（13400385767）	室外管网施工	对管网现场施工巡视检查	
	二标段	林利民（18640512507） 滕洪亮（13234049175） 乔天航(18547607857)	室外管网施工	对管网现场施工巡视检查	
弱电	一标段	刘刚（18082566239）	现场敷管作业	对现场施工巡视检查	
	二标段	滕洪亮（13234049175）	现场敷管作业	对现场施工巡视检查	
能源	二标段	滕洪亮（13234049175） 乔天航(18547607857)	中深层井钻井施工、浅层井施工	对现场施工巡视检查，旁站中深层钻井施工	

三、监理明日工作安排

标段划分	单体名称	监理人员	施工内容	监理工作时间、内容及路线	备注
一标段 刘刚 （15162265570）	图书馆	刘刚（18082566239）	钢结构施工、二次结构施工	对图书馆施工进行巡视检查	
		张春博（13027722180）		对图书馆施工进行巡视检查，旁站砼浇筑施工	
		刘浩（13400385767）		对图书馆施工进行巡视检查，旁站砼浇筑施工	

	教学组团	任海博（18082566239）	二次结构施工	对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查，旁站砼浇筑。	
		马瑞峰（15614235758）		对机场学院教学实验楼、公共教学楼进行、飞行乘务大楼及模拟舱楼进行巡视检查。	
	所有单体安装工程	滕洪亮（13234049175） 张春博（13027722180）	给排水及消防工程、暖通工程、机电安装工程施工	对现场施工巡视检查	
二标段 林利民 （18640512507）	体育馆	丁建泽（18845226778） 杨宸（13364468744） 党泽南（13630253982）	钢结构施工、二次结构施工	对现场施工进行巡视检查，钢构件焊接巡检	
	师生活动中心		地暖管施工	对现场施工巡视检查	
	4#、5#学生宿舍	吕非凡（17532527058）马一博（17692498058）	地暖管施工、抹灰施工	对学生宿舍地暖施工，墙体抹灰施工进行巡视检查	
	1#、2#、3#学生宿舍、食堂	董鑫鑫（1803233772） 乔天航(18547607857) 丁建泽（18845226778）	抹灰施工、防潮层施工、外墙保温施工	对学生宿舍、学生食堂屋面砌筑施工，墙体抹灰施工进行巡视检查	
	垃圾房		未施工	未施工	
	35kv 变电站		设备基础施工	对现场施工巡视检查	
	所有单体安装工程	滕洪亮（13234049175） 乔天航(18547607857)	给排水及消防工程、暖通工程、机电安装工程施工	对现场施工巡视检查	

室外	一标段	刘刚（18082566239） 任海博（18082566239） 刘浩（13400385767）	室外管网施工	对管网现场施工巡视检查	
	二标段	林利民（18640512507） 滕洪亮（13234049175） 乔天航(18547607857)	室外管网施工	对管网现场施工巡视检查	
弱电	一标段	刘刚（18082566239）	现场敷管作业	对现场施工巡视检查	
	二标段	滕洪亮（13234049175）	现场敷管作业	对现场施工巡视检查	
能源	二标段	滕洪亮（13234049175） 乔天航(18547607857)	中深层井钻井施工、浅层井施工	对现场施工巡视检查，旁站中深层钻井施工	

四、施工单位日报

一标段施工日报

	中国建筑　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告								表格编号	
									CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101	
项目名称	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：180	2021 年 10 月 30 日									√
作业计划编号		天气	非常晴朗☐ 晴朗☑ 多云☐ 雨☐ 雪☐ 霾☐							
施工部位	图书馆 机场学院教学实验楼 公共教学楼 飞行乘务大楼及模拟舱楼	温度	≤0 度☐ 0 度～10 度☐ 10 度～21 度☑ 21 度～30 度☐ ≥30 度☐							
		风力	静风☑ 中等☐ 大风☐ 台风☐							
		湿度	干燥☑ 中等☐ 湿润 ☐							
一、现场人员情况										
单位名称	管理人员数（日/夜）		作业工人数（日/夜）				主要工作内容			
中建八局	40		40				现场管理、方案编制			
肥城环宇	2		6				机电安装			
北京慧欣	2		28				机电安装			

	中国建筑　项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告		表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
中联盛	1	9	弱电
天津科顺	1	20	防水施工
东方诚	4	72	钢结构施工
福建聚利	5	70	幕墙安装
广坤腾阳	1	8	机电
鼎天幕墙	1	17	幕墙安装
天宇信达（二构）	5	179	二次结构施工
天津俊凯	2	13	机电通风
宏坤煜业	3	19	机电通风
恒福消防	1	6	机电消防
堡泰消防	1	16	机电消防
天河伟业	7	42	精装
八局装饰	2	5	精装
贵州中科	3	7	精装
合计	69	557	
二、现场机械设备情况			
设备名称	型号	状态	工作台班
货用施工升降机	SC120/120	良好	6
物料提升机	AC/200	良好	1
叉车	1 台	良好	2
洒水车	1 辆	良好	1
雾炮车	2 台	良好	2
钢筋切断机	40 型	良好	1
钢筋弯曲机	50 型	良好	1
钢筋调直机	50 型	良好	2
钢筋箍筋弯曲机	25 型	良好	3
塔吊	XGT7527	良好	1
塔吊	TC7013-10D	良好	1
挖机	60 型	良好	1
挖机	200 型	良好	1
三、主要物资（设备）进场情况			

物资名称	规格	数量	检验	试验情	备注

	中国建筑　项目管理表格				
	作业面\项目每日情况报告			表格编号	CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
			情况	况	

四、来访人员情况

时间	姓名	单位	工作目的	备注

五、进度完成情况	图书馆	本日施工内容:二次结构施工；钢结构屋面钢梁吊装； 抹灰施工；机电安装给排水管道； 通风管道； 空调水管道； 地库顶板防水； 现场文明施工清理
		总体完成情况:图书馆二次结构砌筑施工完成 98%；抹灰完成 85%；钢结构安装完成 96%；机电管线安装 77%；幕墙安装完成 52%；地库顶板防水完成 50%；
	机场学院教学实验楼	本日施工内容:抹灰施工； 机电安装给排水管道； 通风管道； 空调水管道； 现场文明施工清理； 地面贴砖；
		总体完成情况： 机电管线安装 81%； 幕墙安装完成 55%； 地面贴砖施工完成 30%；
	公共教学楼	本日施工内容： 抹灰施工；幕墙施工；机电安装给排水管道；通风管道；空调水管道；现场文明施工清理；混凝土地面施工； 地面贴砖；
		总体完成情况： 机电管线安装完成 81%； 幕墙安装完成 42%； 钢连廊施工完成 89%； 混凝土地面施工完成 100%； 地面贴砖完成 40%
	飞行乘务大楼及模拟舱楼	本日施工内容:二次结构施工； 幕墙龙骨施工； 门窗副框施工； 机电安装给排水管道； 通风管道； 空调水管道； 屋面施工； 混凝土地面施工； 现场文明施工清理； 模拟舱钢结构施工
		总体完成情况： 抹灰完成 100%；机电管线安装完成 77%；幕墙采光顶安装完成 97%； 混凝土地面施工完成 100%;副框安装完成 91%； 模拟舱钢结构施工完成 85%；
六、业主监理指令		
七、安全管理情况	日常三间巡逻检查，裸土苫盖维护，现场排水，安全隐患排查以及整改	
八、技术质量管理	对防水清理、架体搭设、二次结构、幕墙安装、钢结构施工进行全过程质量监管，日常机械监测。	
九、过程关键文件		
十、本日重大事项	排烟机房拆改、三层连廊墙改防火窗及车库顶板风井改位置，全咨、校方及全审现场确认变更签证	

	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告	表格编号 CSCEC8B-PM-B10401 CSCEC-PM-1101
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：**	
抄送	1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□； 5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□	

现场作业影像



模拟舱回填



钢筋调拨



图书馆回填



图书馆材料倒运

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆钢结构吊装</td><td>模拟舱砌筑</td></tr>
<tr><td colspan="2">现场航拍图 10.22</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>图书馆</td><td>实验楼</td></tr>
</table>

	
公共教学楼	飞行乘务大楼

二标段

	中国建筑　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告表								表格编号	
									ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101	
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程二标段									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：002	2021 年 10 月 30 日									√
作业计划编号		天气	非常晴朗　晴朗☑ 多云☐ 雨☐ 雪☐ 冰冻☐							
施工部位	1#-5#宿舍楼；食堂；指挥部；体育馆；师生活动中心	温度	≤0 度　0 度～10 度　10 度～21 度☑ 21 度～30 度　≥30 度							
		风力	静风☐　中等☑　大风☐　台风							
		湿度	干燥☑　中等☐　湿润☐							
一、现场人员情况										
单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容							
中建三局	28/15	/	方案编制、现场施工管理							
三局智能	2	/	BIM 建模							
天津欣蕊	2/0	0/0	体育馆东侧回填							
三局二安	8/0	151/20	师生活动中心变更点位开槽、宿舍楼穿线、排水施工，地暖施工、食堂二次配管风管水管桥架施工							
梁平荣安	4/0	20/0	模板支设、拆除、材料堆码，钢筋清理、绑扎；南校门抽水，基槽清理，桩头处理							
三局一公司钢构	4/0	18/6	体育馆钢结构屋面桁架拼接焊接、运输，航天云施工、攀岩走廊施工、							
长沙广大	8/0	2/0	活动中心钢附框加工、安装、食堂幕墙龙骨局加工							
兴华鑫宇	5/0	161/13	二次结构墙体砌筑，构造柱支模、系梁支模，墙面抹灰，地暖基层清理，墙面刮腻子							
天津津宝福	5/0	90/11	二次结构墙体砌筑，构造柱支模、系梁支模，墙面抹灰，地暖基层清理，墙面刮腻子，地面浇筑							
北京迈易格	5/0	10/0	钢副框安装、主框安装、幕墙图纸深化							

东方雨虹（防水）	1/0	26/4	防潮层施工，屋面防水施工
东方雨虹（保温）	2/0	38/0	外墙保温施工
广日电梯	1/0	4/0	室内电梯安装
施工人员合计		522/54	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
洒水车	12m³	良好	1
物料提升机	SC100/100	良好	6
电梯	SC200/200	良好	3
汽车吊	25t	良好	2
挖掘机	330 型	良好	0
	200 型	良好	1
	90 型	良好	1
自卸汽车	20m³	良好	2
吊篮		良好	97

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
钢筋网片		12000 ㎡	合格	合格	

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注

五、施工完成情况	体育馆	**本日施工内容：**首层墙体砌筑，反坎、构造柱、系梁支模，二层系梁构造柱拆模，三层窗台压顶支模，钢结构桁架拼装焊接。机电安装综合支架、风管、桥架安装。攀岩走廊施工，幕墙埋件安装，金属屋面支座材料进场，墙体拉毛挂网.
		整体完成情况：二次结构施工完成 80%,粗装修完成 10%;钢结构完成 99%;机电安装完成 35%，攀岩走廊施工 80%;
	师生活动中心	**本日施工内容：**主楼楼内地面基层清理，裙房电缆沟抽水。机电安装样板间变更点位开槽。
		整体完成情况：主体结构完成 99%；二次结构完成 100%；主楼粗装修完成 90%；机电安装完成 76％
	学生食堂	**本日施工内容：**食堂抹灰，能源站地面细石混凝土完成，幕墙安装副框，复查窗口尺寸完成。机电安装综合支架、风管、消防管加工，开槽及二次配管，桥架，风管安装，地暖管敷设；食堂走廊找坡施工，幕墙龙骨

	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101
		安装，三层变更女儿墙拆除、清运。
		整体完成情况:能源站二次结构完成 95%,初装修完成 50%,屋面完成 30%;学生食堂二次结构完成 100%，粗装修完成 70%，屋面工程完成 20%，外幕墙完成 20%，机电安装完成 46%。
	1#学生宿舍	**本日施工内容**：1#楼 A 段外墙保温施工,屋面铺设保温板；1#楼机电安装消防管安装，样板间风管保温，给水加套管；B 段外墙保温施工，屋面铺设保温板。3-4 层窗户主框安装；室内电梯导轨、轿厢安装；2-3 层墙面腻子施工；
		整体完成情况：粗装修完成 90%，精装修完成 8%，屋面工程完成 80%；外墙保温完成 29%；机电安装完成 61%。窗户工程完成 38%；电梯工程完成 14%；
	2#学生宿舍	**本日施工内容** 3-4 层墙体腻子施工。机电安装消防管、给排水管井道安装，消防穿线。外墙保温施工；室内电梯导轨安装；
		整体完成情况：粗装修完成 91%；精装修完成 8%，屋面工程完成 100%；外墙保温完成 42%；机电安装完成 61%；窗户工程完成 50%；电梯工程完成 18%；
	3#学生宿舍	**本日施工内容**：首层抹灰；外墙保温施工；机电安装公区桥架、支架安装，卫生间排水管安装。地面基层清理，屋面防水施工、抹灰施工。
		整体完成情况：二次结构完成 98%；粗装修完成 75%，精装修完成 5%；屋面工程完成 55%；机电安装完成 53%；外保温工程完成 6%；窗户工程完成 10%；
	4#学生宿舍	**本日施工内容**：三层防潮层施工，地面基层清理；外墙保温施工；机电安装管井水管施工。
		整体完成情况：粗装修完成 75%，精装修完成 8%；屋面工程完成 60%；机电安装完成 55%；外保温工程完成 8%；窗户工程完成 10%；
	5#学生宿舍	**本日施工内容**：外墙保温施工；机电安装立管安装，桥架接头。
		整体完成情况：粗装修完成 80%，精装修完成 10%；屋面工程完成 50%；机电安装完成 57%；窗户工程完成 10%；外保温工程完成 6%；
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、对生活区进行检查；2、对现场临时用电进行检查；3、对整个施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改；抽水情况进行排查 4、现场疫情防控监察	
八、技术质量管理情况	1、对体育馆、食堂及宿舍楼墙体砌筑进行检查；2、对师生活动中心及宿舍楼墙体抹灰进行检查。3、BIM 建模幕墙、钢构、机电安装等	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项		

	中国建筑　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 ZJSJ-XMBD-005　CSCEC-PM-1101
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：**	
抄送	1、建设方代表■；2、工程监理■；3、项目经理■；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室□	

制，项目生产经理亲自填报整个项目部每日情况报告。报告包括的时间为当天上班时间到次日上班时间,提交报告的时间不迟于次日上午的 12 点。

现场施工影像





体育馆首层墙体砌筑，构造柱、系梁浇筑，二层、三层墙体砌筑、系梁支模，钢结构桁架拼装、焊接工作

师生活动中心主楼楼内地面地暖打压完成，消防施工。钢附框塞口施工。





食堂抹灰收尾施工、能源站抹灰施工，屋面防水施工，清理排水沟，机电加工风管；幕墙埋件安装，屋面清理，屋面找坡找平层施工，女儿墙变更切割，地面清理。	1#楼 A 段外墙保温施工，屋面保温施工,机电安装采暖管、消防管水平管安装；B 段外墙保温施工，屋面保温施工。室内电梯放线安装；3-4 层窗户主框安装；电梯导轨、轿厢安装；
	
2#楼机电安装室内穿电线；外墙保温施工；室内电梯导轨安装；3-5 层腻子施工；	3#楼首层、十层抹灰；屋面防水层施工，七层地面基层清理；外墙保温施工；
	
4#楼 3 层防潮层施工，7 层地面基层清理；外墙保温施工；	5#楼 3 层腻子施工；6 层地暖管铺设；外墙保温施工；

	
食堂机电安装综合支架、风管、消防管加工，开槽及二次配管，风管安装。	体育馆机电安装综合支架、风管、桥架安装。
	
1#楼机电安装消防管安装，室内穿线，1B2 层淋浴样板间点位整改。	2#楼机电安装消防管、风管安装，消防穿线。
	
3#楼机电安装公区桥架、支架安装，卫生间排水管安装。	4#楼机电安装管井水管、风管安装。

	
5#楼机电安装立管安装，桥架接头。。	

中铁五局室外项目施工日报

中国中铁	中国中铁　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告表							表格编号		
								ZTWJ-MHDX-SWGC-001		
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程室外施工									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：076	2021 年 10 月 30 日									√
作业计划编号		天气	非常晴朗☐ 晴朗☐ 多云☑ 雨☐ 雪☐ 冰冻☐							
施工部位	公共教学楼室外区域体育馆西侧	温度	≤0 度☐ 0 度～10 度☐ 10 度～21 度☑ 21 度～30 度☐ ≥30 度☐							
		风力	静风☑中等☐ 大风☐ 台风☐							
		湿度	干燥☑ 中等☐ 湿润☐							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数	作业工人数	主要工作内容
中铁五局	10	18	2、学生宿舍楼雨水管道安装 2、体育场西侧室外安装污水管道

中国中铁	中国中铁 项目管理表格		
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号	ZTWJ-MHDX-SWGC-001

施工人员合计	10	18	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
挖掘机	W210 型	良好	2
挖掘机	W200 型	良好	1
装载机	HY940	良好	1

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
/					

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				

五、施工完成情况	项目部	本日施工： 1、体育场西侧安装污水管道 3、学生宿舍楼雨水管道安装
		整体完成情况：体育场西侧安装污水管道完成 10%；学生宿舍楼 2#楼雨水管道完成 80%
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、对现场机械进行安全检查；2、对施工现场所有安全隐患进行排查并安排进行整改；3、施工人员班前喊话。	
八、技术质量管理情况	对开槽及管道安装全过程质量监管，机械专人指挥。	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	/	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：** /	
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☑；5、项目生产经理（项目总工）☑；6、项目工程部☑；7、项目资料室☐	

现场施工影像

	
	
学生宿舍楼雨水管道安装，体育场西侧室外安装污水管道。	

江森自控智慧校园建设弱电专项施工日报

Johnson Controls	北京江森自控有限公司　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号

		JCI-CN23/21:1096 BJJSGCB-PM-2021003

项目名称	中国民航大学新校区智慧校园建设弱电专项施工									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：075	2021 年 10 月 30 日									√
作业计划编号		天气	非常晴朗☐　晴朗☑多云☐　雨☐雪☐霾☐							
施工部位	全校区	温度	≤0 度☐　0 度～10 度☐　10 度～21 度☑ 21 度～30 度☐　≥30 度☐							
		风力	静风☑　中等☐　大风☐　台风☐							
		湿度	干燥☐　中等☑　湿润☐							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数（日/夜）	作业工人数（日/夜）	主要工作内容
北京江森自控有限公司	4	4	现场管理、专业设计
施工	26	26	弱电施工
合计	30	30	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
/			
/			
/	/	/	

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注
/	/	/			

四、来访人员情况

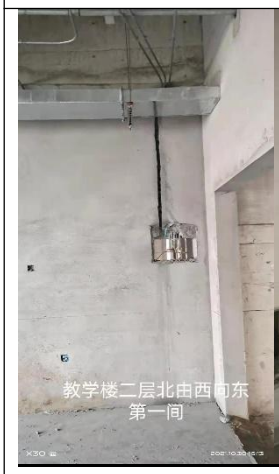
时间	姓名	单位	工作目的	备注

五、进度完成情况	宿舍楼	本日施工内容：现场敷管作业
		总体完成情况： 机场实验楼 3 层开槽作业，总体完成 35%。公共教学楼 2 层开槽作业，总体完成 40%。飞乘楼 4 层开槽作业，总体完成 5%。3#宿舍楼敷管作业，总体完成 70%。

六、业主监理指令	

Johnson Controls	北京江森自控有限公司　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 JCI-CN23/21:1096 BJJSGCB-PM-2021003
七、安全管理情况		
八、技术质量管理		
九、过程关键文件		
十、本日重大事项		
十一、明日施工计划		
十二、工作小结		
抄送	1、建设方代表□；2、工程监理□；3、项目经理□；4、项目商务项目□；5、项目生产经理（项目总工）□；6、项目工程部□；7、项目资料室£	

作业影像


教学楼二层北由西向东
第一间


教学楼二层北卫生间
手报


教学楼二层北由西向东
第一间


打卡记录
16:42
2021.10.30 星期六
水印相机已确保时间不可篡改
水印相机


江森自控
天津民航大学


天津民航大学

开槽、敷管作业

中国民航大学（三局） 2021.10.30 06:20 施工区域 项目部 施工内容 班前教育 地 点 天津市·中国民航大学新校区 水印相机
班前教育及会议

恒益建安能源专项施工日报

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格									
	作业面\项目每日情况报告表						表格编号			
							HYJA-MHDX-NYGC-001			
项目名称及编码	中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程能源专项工程									
本表顺序号	时　间		星期	日	一	二	三	四	五	六
NO：0069	2021 年 10 月 30 日									√
作业计划编号		天气	非常晴朗☑　晴朗☐　多云☐　雨☐　雪☐　冰冻☐							
施工部位	能源站	温度	≤0 度☐　0 度～10 度☐　10 度～21 度☐ 21 度～30 度☑　≥30 度☐							
		风力	静风☐　中等☐　大风☐　台风☐							
		湿度	干燥☐　中等☐　湿润☐							

一、现场人员情况

单位名称	管理人员数	作业工人数	主要工作内容
恒益建安	3	现场安排 10 人	能源站内排水；能源站内支架放线
恒益建安	5	现场安排 22 人	中深层地源热井钻井经校方研究通过延伸 200 米，第二口井位从新选址
恒益建安	1	现场安排 4 人	浅层地源热井钻井
施工人员合计		36 人	

二、现场机械设备情况

设备名称	型号	状态	工作台班
石油钻机	ZJ-30	良好	1
浅层钻机		良好	1

三、主要物资（设备）进场情况

物资名称	规格	数量	检验情况	试验情况	备注

四、来访人员情况

时间	姓名	职位	工作目的	备注
/				

五、施工完成情况	能源站	**本日施工内容：**能源站内排水、能源站内支架放线、能源站支架制作
		整体完成情况：能源站内排水 100%；能源站内支架放线 100%；能源站支

恒益建安	天津恒益建安集团有限公司　项目管理表格	
	作业面\项目每日情况报告表	表格编号 HYJA-MHDX-NYGC-001

		架制作 20%

施工完成情况	中深层地源热井	**本日施工内容：**中深层地源热井钻井经校方研究通过延伸 200 米，第二口井位从新选址方案已经上报设计院
		整体完成情况：中深层地源热井钻井经校方研究通过延伸 200 米；井深 2210 米；进尺 45 米；第二口井位从新选址方案已经上报设计院
	浅层地源热井	**本日施工内容：**浅层地源热井钻井；浅层钻机已经进场 5 台电力负荷不足
		整体完成情况：浅层地源热井钻井完成 4 口，累计完成 27 口；浅层钻机已经进场 5 台电力负荷不足无法开钻
六、业主监理指令	/	
七、安全管理情况	1、对中深层地源热井现场安全操作进行巡视检查。	
八、技术质量管理情况	1、对能源站的临电进行安全专项检查	
九、施工过程中关键问题来往文件记录	/	
十、本日重大事项	/	
十一、工作小结	**急需业主协调解决事宜：**	
抄送	1、建设方代表☑；2、工程监理☑；3、项目经理☑；4、项目商务经理☐；5、项目生产经理（项目总工）☐；6、项目工程部☐；7、项目资料室☐	

现场施工影像

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">能源站内排水、能源站支架放线；中深层地源热井钻井经校方研究通过延伸 200 米，浅层地源热井钻井；第二口井位从新选址；浅层钻机已经进场 5 台</td></tr>
</table>
